

(1) Fecha informe: 05 de mayo del 2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva



Periodo que reporta: Abril 2021

(3) Proyecto: "Contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación de varias intersecciones del proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper, Ruta Nacional No.4." Contratación Directa No. 2018CD-000039-0006000001

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Rafael Mena Carmona
Teléfono / Correo	8701-5578 / jose.mena@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	Copelesca R.L. / GCVP

(6) Descripción: Ubicación de Proyecto: Alajuela (San Carlos, Aguas Zarcas, Kooper) y Heredia (Sarapiquí, La Virgen, Chilamate). Longitud: contempla iluminación en todas las intersecciones en los 25 km de la ruta. Descripción de trabajo a realizar: Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación de varias intersecciones y puentes del proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper, Ruta Nacional No.4. Sección de control: 40540 Localización (Bajos de Chilamate (R.126)-Limite Cantonal Sarapiquí-Rio Cuarto).

(7) PLAZO	Orden de Inicio	21/5/2019	100%
	Plazo contractual (PC)	180 días	
	Eventos compens. (EC)	0 días	
	Plazo por suspensión (PS)	300 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	180 días	
	Última suspensión	2/4/2020	
	Plazo utilizado	180 días	% Avance
	Fecha de Finalización	11/9/2020	

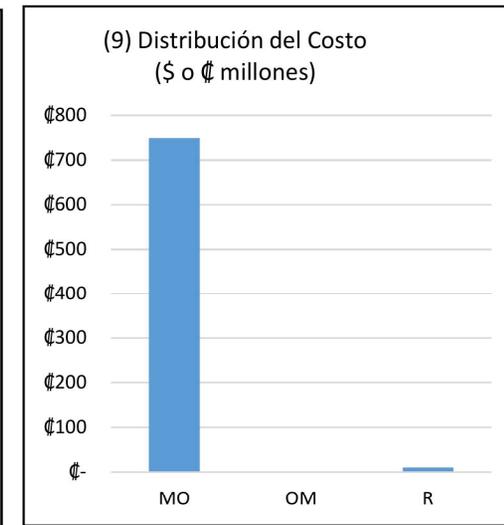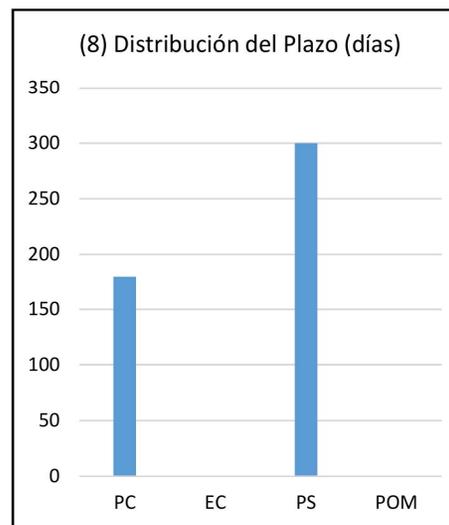

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	₡ 749 152 294,35	94%
	Orden Modificación (OM)	₡ -	
	Reajustes (R)	₡ 9 733 553,67	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 758 885 848,02	% Ejec.
	Financiero Ejec.	₡ 714 663 850,74	
	Pendiente de pago (PP)	₡ -	

(9) Consideraciones relevantes

El procedimiento de donación de activos continúa en proceso. La ingeniería de proyecto realizó el borrador del informe técnico que sirve de soporte para la donación y lo envió a revisión al Encargado de la Unidad de Bienes del Conavi.

Continúa pendiente la presentación por parte del contratista del reajuste correspondiente a las estimaciones de obra No.3 y No.5.

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:
José Rafael Mena Carmona

Gerente:
Pablo Contreras Vásquez



(4) Estado del proyecto: Cierre contractual

(1) Fecha informe: 05 de mayo del 2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva


Periodo que reporta: Abril 2021

(3) Proyecto: "Contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación de varias intersecciones del proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper, Ruta Nacional No.4." Contratación Directa No. 2018CD-000039-0006000001

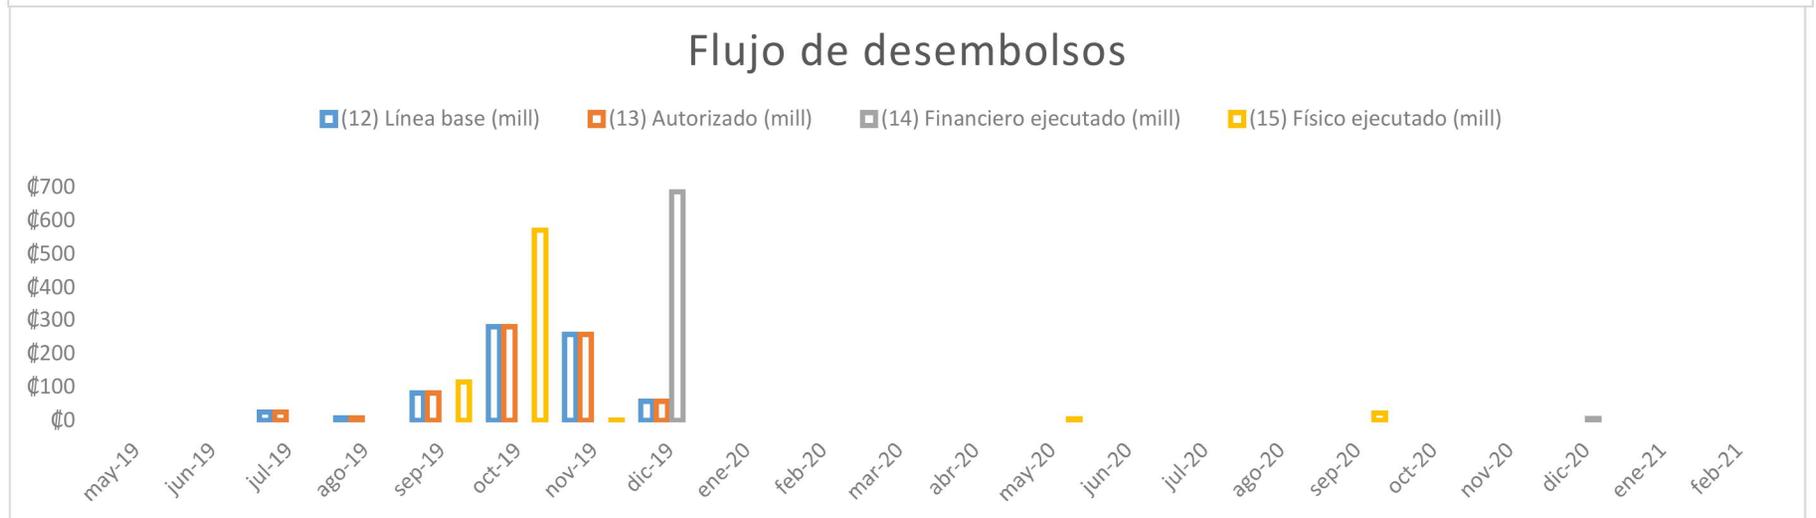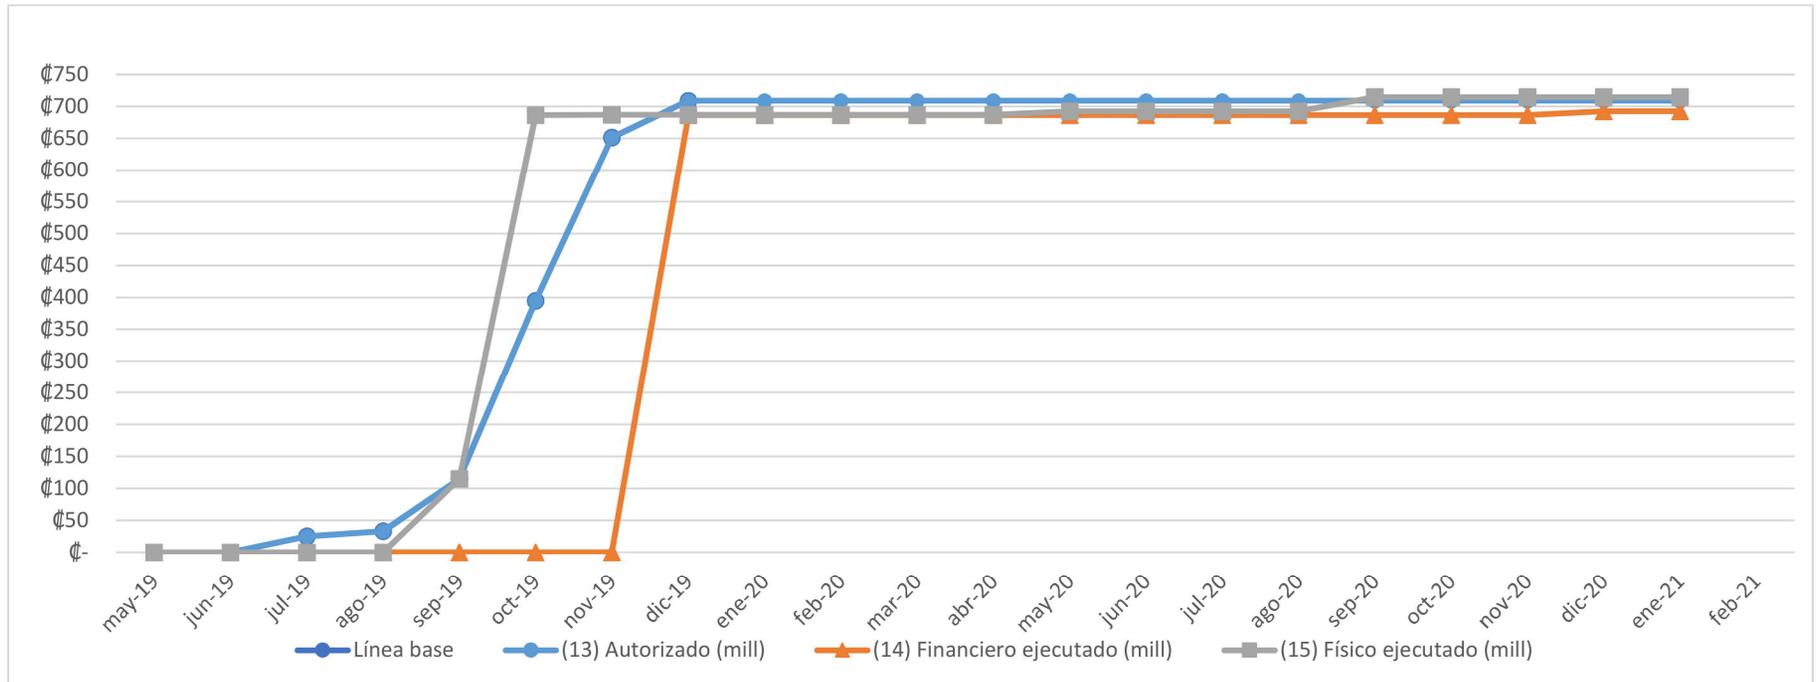

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual

(3) Proyecto: “Contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación de varias intersecciones del proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper, Ruta Nacional No.4.” Contratación Directa No. 2018CD-000039-000600001
Escala de tiempo del proyecto

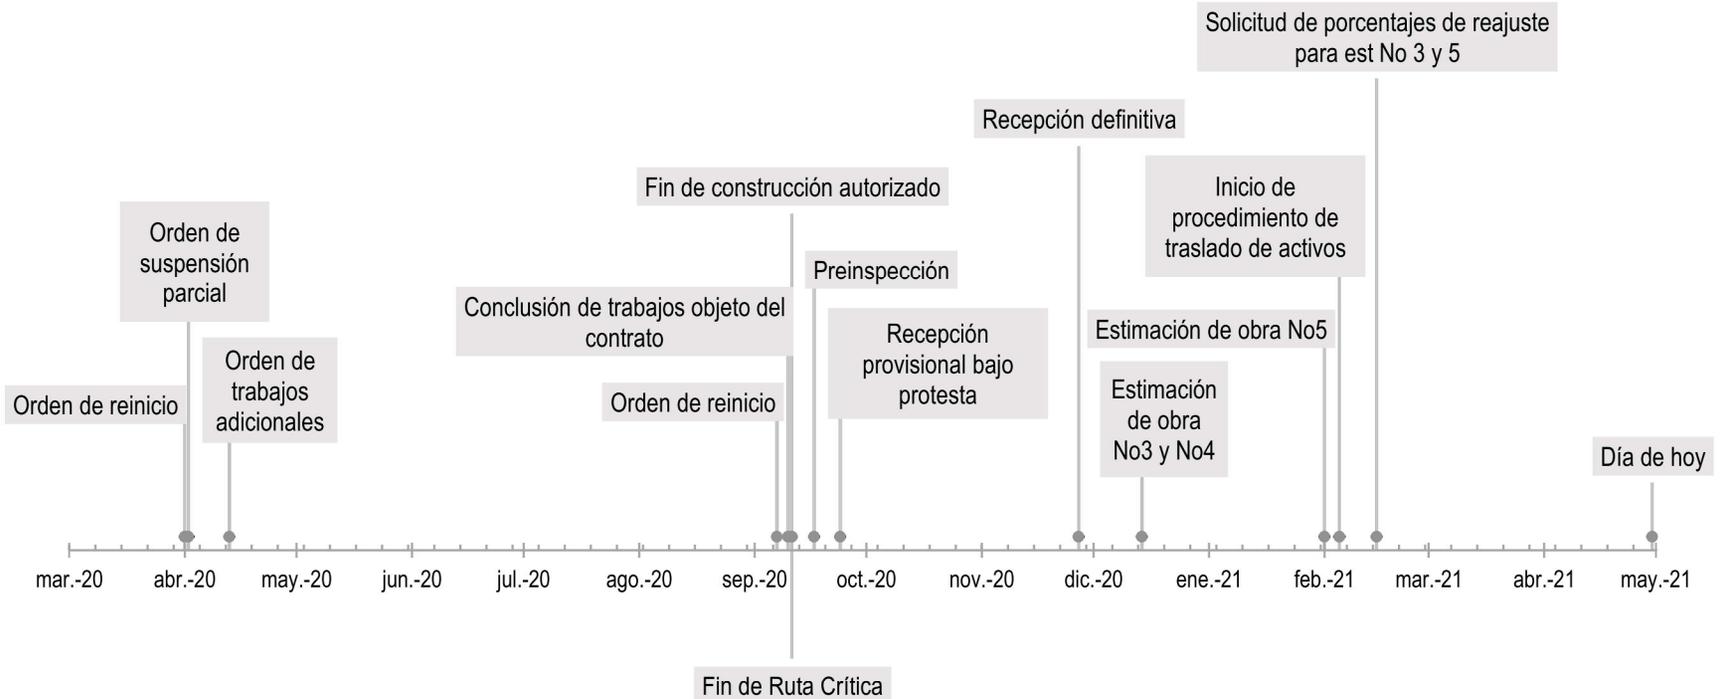

Ruta Crítica del proyecto

(1) Fecha informe: 05 de mayo del 2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Abril 2021

(3) Proyecto: "Contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la iluminación de varias intersecciones del proyecto Bajos de Chilamate – Vuelta Kooper, Ruta Nacional No.4." Contratación Directa No. 2018CD-000039-0006000001

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
Orden de servicio No.1 (Orden de Inicio). 24/05/19	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.2 (Orden de Suspensión). 12/11/19	-	-	-	-	Aprobada
No.3 (Orden de Reinicio). 02/04/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.4 (Orden de Suspensión parcial). 02/04/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.5 (Trabajos adicionales por 110.06). 02/04/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.6 (Orden de reinicio). 07/09/2020	-	-	-	-	Aprobada

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual

(1) Fecha informe: 05 de mayo del 2021

Periodo que reporta: Abril 2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico

Proyecto se encuentra en cierre contractual, y ya se realizó la recepción definitiva. Por lo cual no hay obra para mostrar.

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual
