
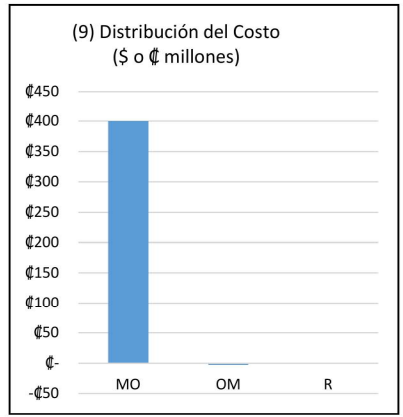


(3) Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-0DI00.

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Rafael Mena Carmona / Ing. Maykel González Lazo
Teléfono / Correo	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr 8913-4621; maykel.gonzalez@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	Puente Prefa Limitada / GCVP

(6) Descripción: Realizar el diseño geométrico, arquitectónico y estructural (incluyendo la elaboración de los planos constructivos) y la construcción de las estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional No.148, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantón: 7 Palmares; Distrito: 1 Palmares. Sección: 21730.
Obras a realizar:
Quebrada Azul: Puente de apoyos rígidos de 13,00m de ancho y 6,00m de largo.
Quebrada Cima: Alcantarilla de cuadro de 5,14m de ancho (longitud en calzada) y 13,00m de largo.
Obras complementarias: Accesos de aproximación de las estructuras mencionadas. La intervención total comprende aproximadamente 0,2 kilómetros.

(7) PLAZO	Orden de Inicio	1/6/2020	99,7%
	Plazo contractual (PC)	250 días	
	Eventos compens. (EC)	121 días	
	Plazo por suspensión (PS)	1119 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	371 días	
	Última suspensión	26/2/2021	
	Plazo utilizado	370 días	% Avance
Fecha de Finalización	-		

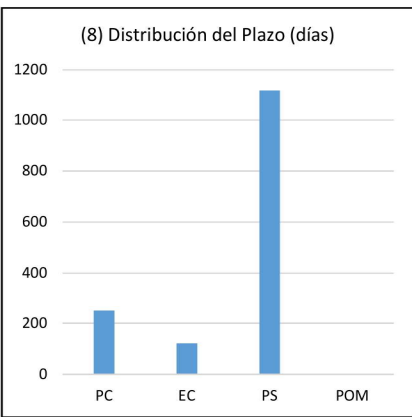

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	₡ 400 054 542,15	53%
	Orden Modificación (OM)	-₡ 2 690 706,33	
	Reajustes (R)	₡ -	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 397 363 835,82	% Ejec.
	Financiero Ejec.	₡ 208 682 078,02	
	Pendiente de pago (PP)	₡ -	

(9) Consideraciones relevantes

Se realizó la orden de modificación No.2, en la cual se realiza un reacomodo de cantidades e inclusión del ítem CR.552.02.B Suministro y colocación de concreto 230 kg/ cm2.

Además se va a realizar la orden de servicio No.34, por medio de la cual se van a ordenar los trabajos de bacheo en la ruta cantonal que sirve como ruta alterna del proyecto, la cual ha sufrido deterioro ocasionado por el aumento del flujo vehicular a causa del cierre de la Ruta Nacional No.148, realizado para la construcción de la obra. Esto con base en la "Reforma del artículo 1 y adición de un artículo 24 bis a La ley 7798, creación del consejo nacional de vialidad, De 30 de abril de 1998, ley para la intervención de rutas cantonales por parte del Consejo nacional de vialidad, Decreto Legislativo No.9953".

Es importante indicar que para efectos de los gráficos de avance financiero, se excluyó lo correspondiente a diseño debido a que el mismo fue cancelado, además de que la Gerencia de Construcción no fue la responsable de esa etapa.

Además, el porcentaje ejecutado no refleja el avance real del proyecto, debido a que no incluye lo ejecutado en el mes de febrero 2021. Esto debido a que se ha realizado conciliación de cantidades.

(10) Elaborado y aprobado por:

 Ingeniero (a) de Proyecto:
 Ing. Maykel González Lazo



 Ingeniero (a) de Supervisor:
 Ing. José Mena Carmona

 Gerente:
 Ing. Pablo Contreras Vásquez

(1) Fecha informe: 05/05/2021
 Periodo que reporta: Abril 2021


(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-ODI00.

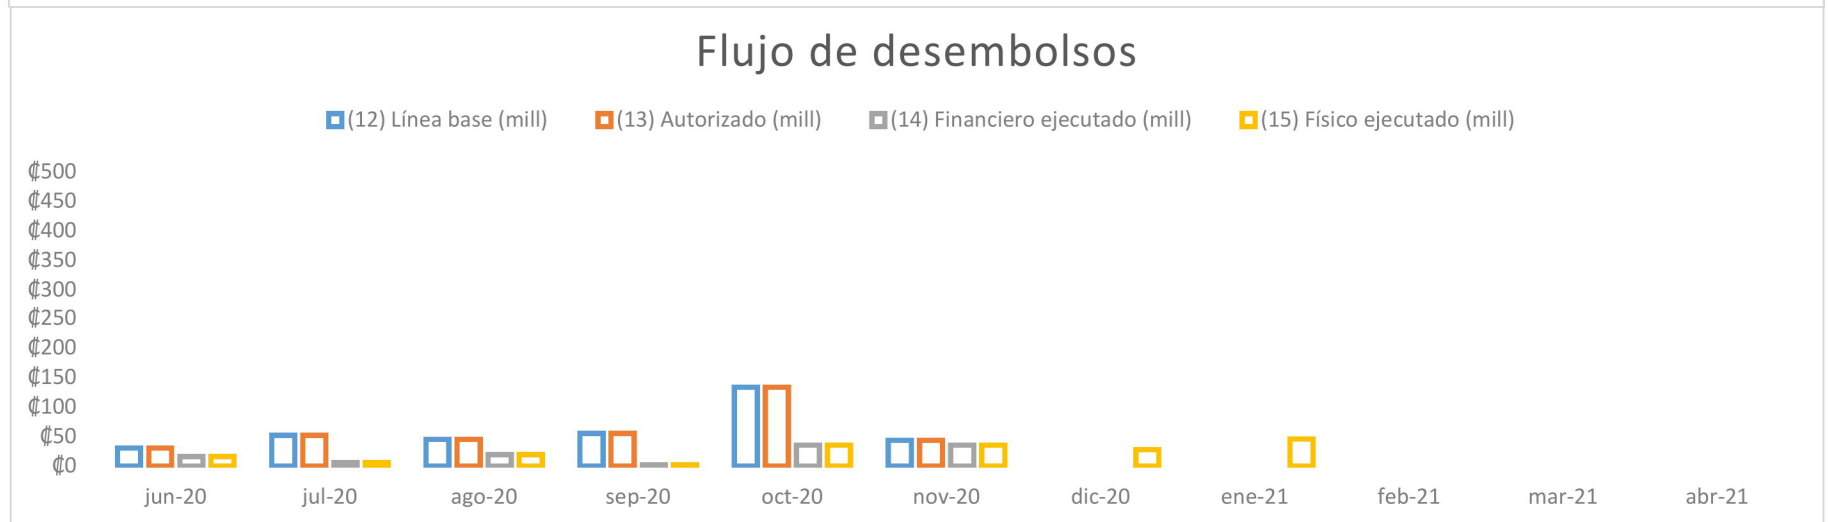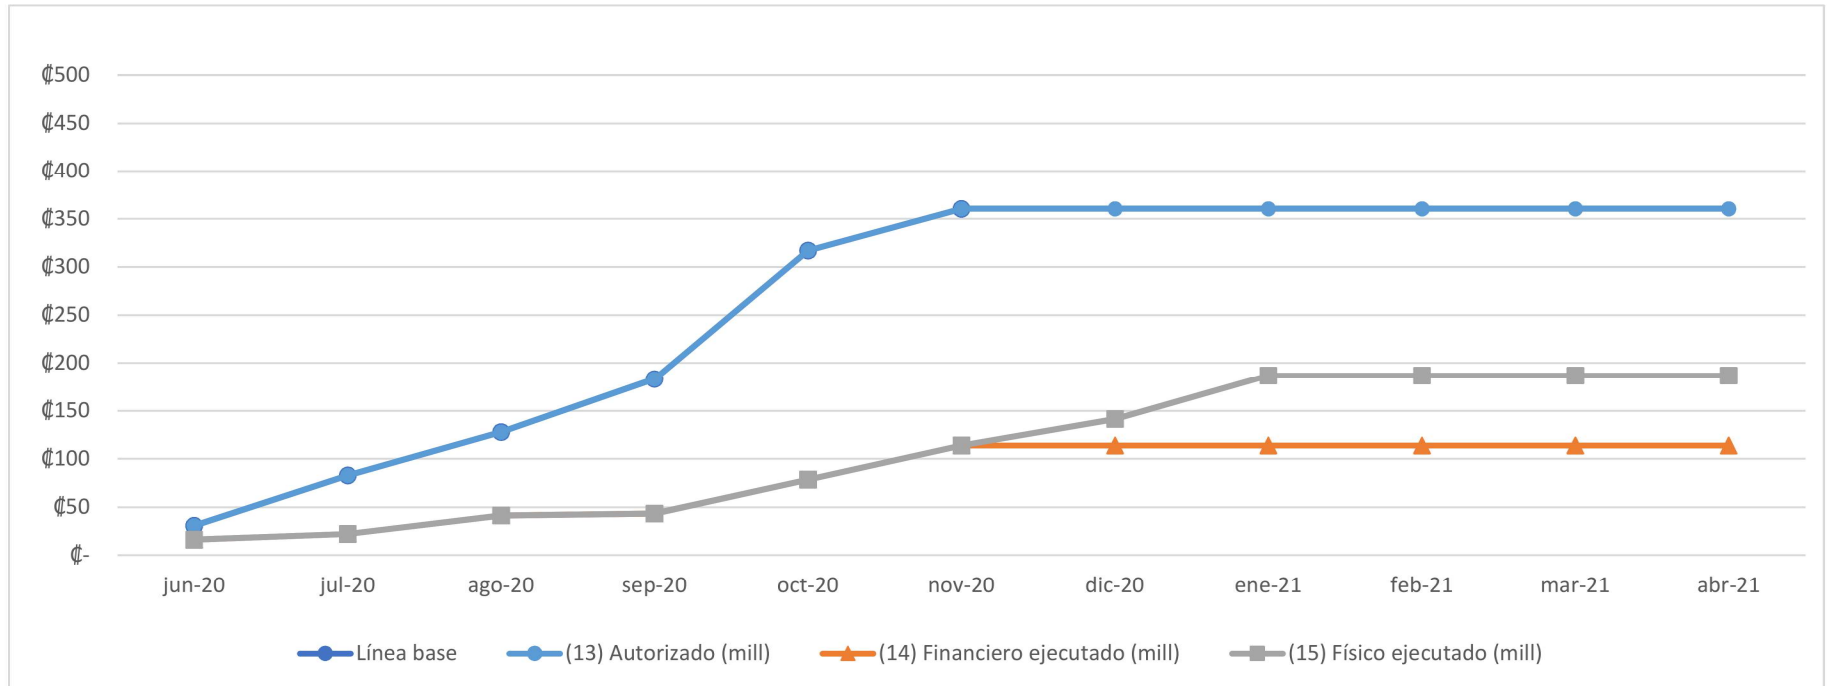

(6) Estado del proyecto: Suspendido

Escala de tiempo del proyecto

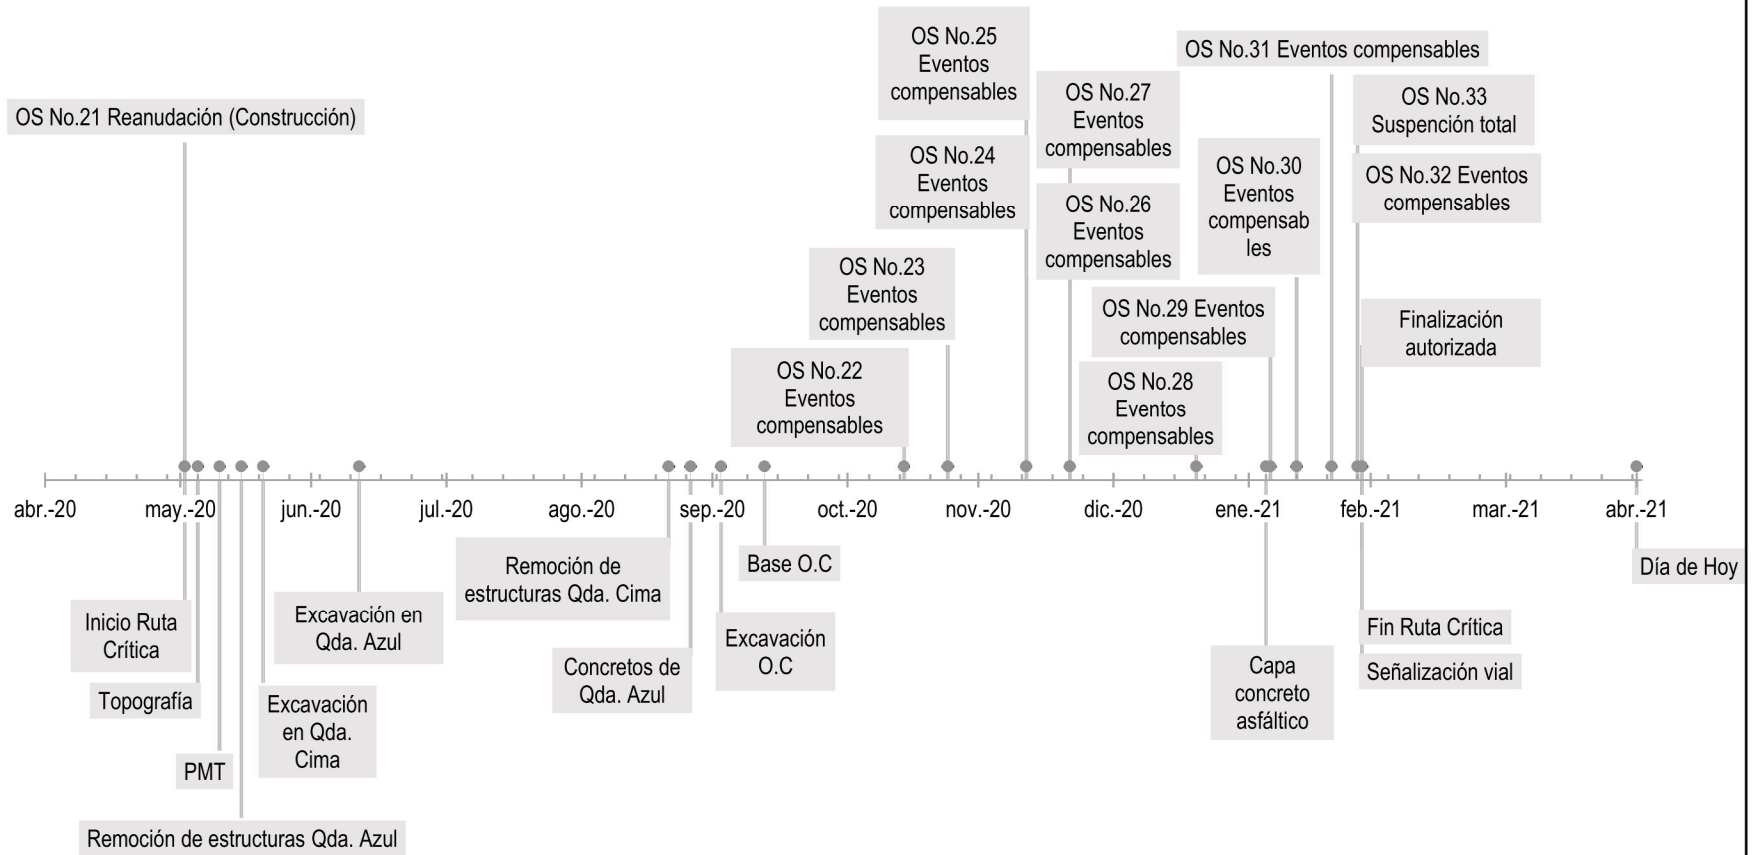

Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 05/05/2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Abril 2021

(3)Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-ODI00.

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
ETAPA II. DISEÑO					
O.S. No.1 (Inicio de labores) 31/03/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.2 (Eventos compensables) 08/05/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.3 (Suspensión total) 08/05/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.4 (Reanudación total) 09/08/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.5 (Suspensión total) 26/09/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.6 (Reanudación total) 09/11/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.7 (Eventos compensables) 22/11/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.8 (Suspensión total) 22/11/2017	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1)Fecha informe: 05/05/2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Abril 2021

O.S. No.9 (Reanudación total) 12/01/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.10 (Suspensión total) 24/01/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.11 (Reanudación total) 20/04/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.12 (Suspensión total) 20/04/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.13 (Reanudación total) 17/08/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.14 (Suspensión total) 27/08/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.15 (Reanudación total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.16 (Suspensión total) 29/01/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.17 (Reanudación total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.18 (Suspensión total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.19 (Reanudación total) 09/08/2019	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 05/05/2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Abril 2021

O.S. No.20 (Suspensión total) 27/08/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.M. No.1 (Disminución de monto) 29/10/2019	-	-	- 2 690 706,33	Adición o eliminación de reglones de pago no presentados en oferta, así como variaciones de cantidades.	Aprobada
ETAPA III.CONSTRUCCIÓN					
O.S. No.21 (Reanudación) 28/05/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.22 (Eventos compensables) 13/11/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.23 (Eventos compensables) 23/11/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.24 (Eventos compensables) 11/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.25 (Eventos compensables) 11/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.26 (Eventos compensables) 21/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.27 (Eventos compensables) 21/12/2020	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 05/05/2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Abril 2021

O.S. No.28 (Eventos compensables) 19/01/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.29 (Eventos compensables) 05/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.30 (Eventos compensables) 11/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.31 (Eventos compensables) 19/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.32 (Eventos compensables) 25/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.33 (Suspensión total) 25/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.M. No.2 (Reacomodo e inclusión de ítem)	-	-	-	Reacomodo de cantidades sin variar objeto, monto ni plazo. Además, incluir el ítem CR.552.02.B Suministro y colocación de concreto 230 kg/ cm2	Pendiente

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 05/05/2021
Periodo que reporta: Abril 2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico

El proyecto se encuentra suspendido, por lo cual no hay avance de obras para mostrar.

(6) Estado del proyecto: Suspendido
