
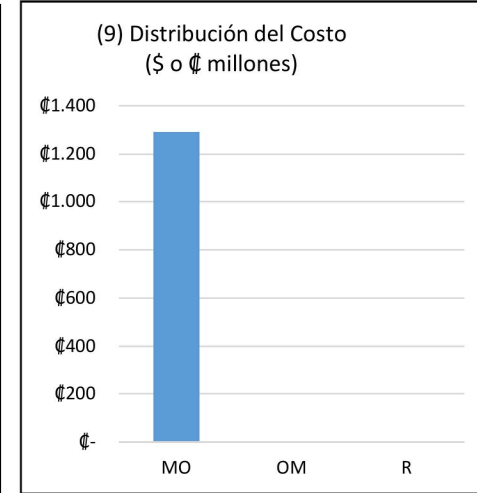


(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara"
Licitación Pública 2018LN-00002-000600001

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Rafael Mena Carmona
Teléfono / Correo	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	Codocsa S.A. / GCVP

(6) Descripción: Ubicación de Proyecto: Guanacaste, Nicoya, Nosara. Longitud: la longitud incluidos los accesos es (Puente Rempujo, Puente Esperanza, Puente Sube y Baja). Descripción de trabajo a realizar: Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo y sus accesos, en la Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara. Sección de control: 50592 Localización: Barco Quebrado (R.934)-Nosara (Cruce centro Población).

(7) PLAZO	Orden de Inicio	13/11/2019	42%
	Plazo contractual (PC)	300 días	
	Eventos compens. (EC)	0 días	
	Plazo por suspensión (PS)	283,00 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	300 días	
	Última suspensión	8/12/2020	% Avance
	Plazo utilizado	125 días	
	Fecha de Finalización	24/12/2020	

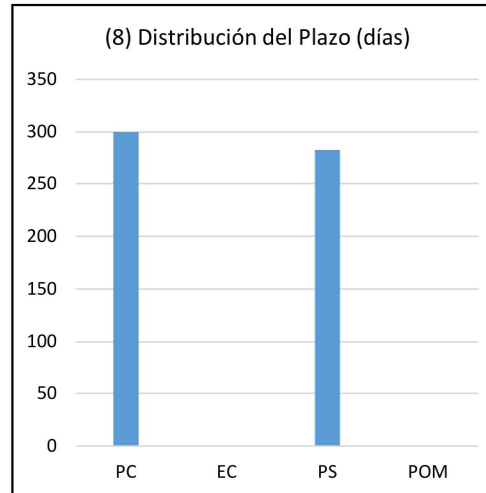

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	₡ 1.291.327.588,91	10%
	Orden Modificación (OM)	₡ -	
	Reajustes (R)	₡ -	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 1.291.327.588,91	% Ejec.
	Financiero Ejec.	₡ 129.797.449,44	
	Pendiente de pago (PP)	₡ -	

(9) Consideraciones relevantes

Continúa pendiente la Certificación de fondos de contenido presupuestario, ya que se está a la espera del análisis de la situación presupuestaria de los diferentes programas del CONAVI. Lo cual fue parte de las razones por las cuales la Contraloría General de la República denegó la autorización para modificar el contrato.

Se realiza aclaraciones y correcciones del informe y orden de modificación, de acuerdo a lo indicado por la Contraloría General de la República, con el fin de presentarlo nuevamente cuando se cuente con el presupuesto requerido.

Los términos de referencia para la contratación de servicios de verificación de calidad requeridas para el proyecto se encuentra en detalles finales, sin embargo, se está valorando por parte de la ingeniería de proyecto, usar la contratación de Conservación Vial.

Continúa la revisión del reclamo administrativo interpuesto por la empresa Codocsa S.A a la Administración el día 19 de Julio del 2020.

El proyecto se encuentra suspendido totalmente a partir del 08 de diciembre mediante la orden de servicio No 6, aprobada mediante oficio GCTR-13-20-1193 (0736) del 04 de diciembre del 2020.

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:
 José Rafael Mena Carmona


Gerente:
 Pablo Contreras Vásquez

(1) Fecha informe: 02 de junio del 2021


(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Mayo 2021

(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara"
Licitación Publica 2018LN-000002-0006000001

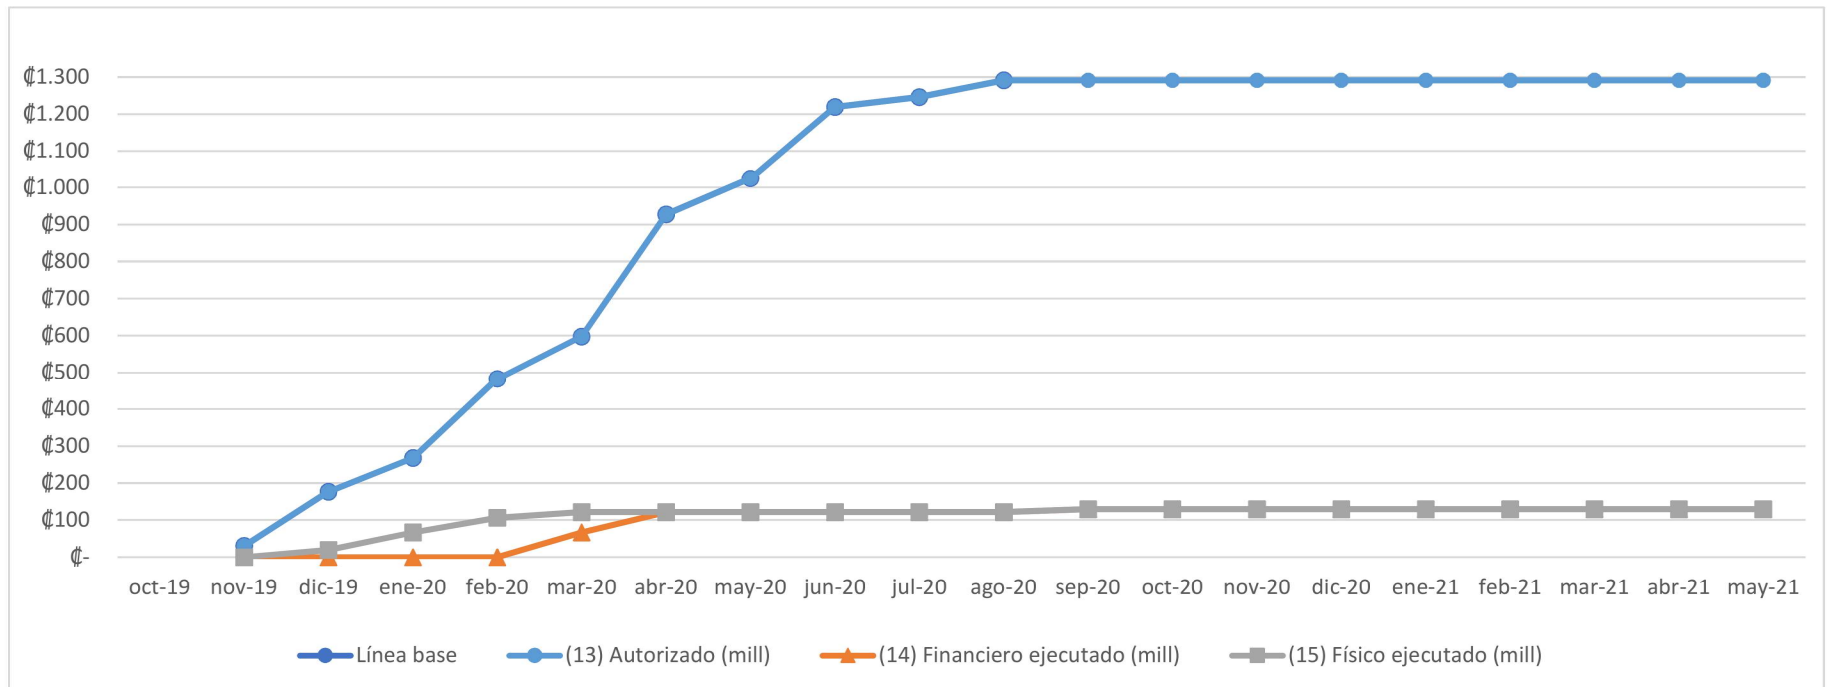


Flujo de desembolsos

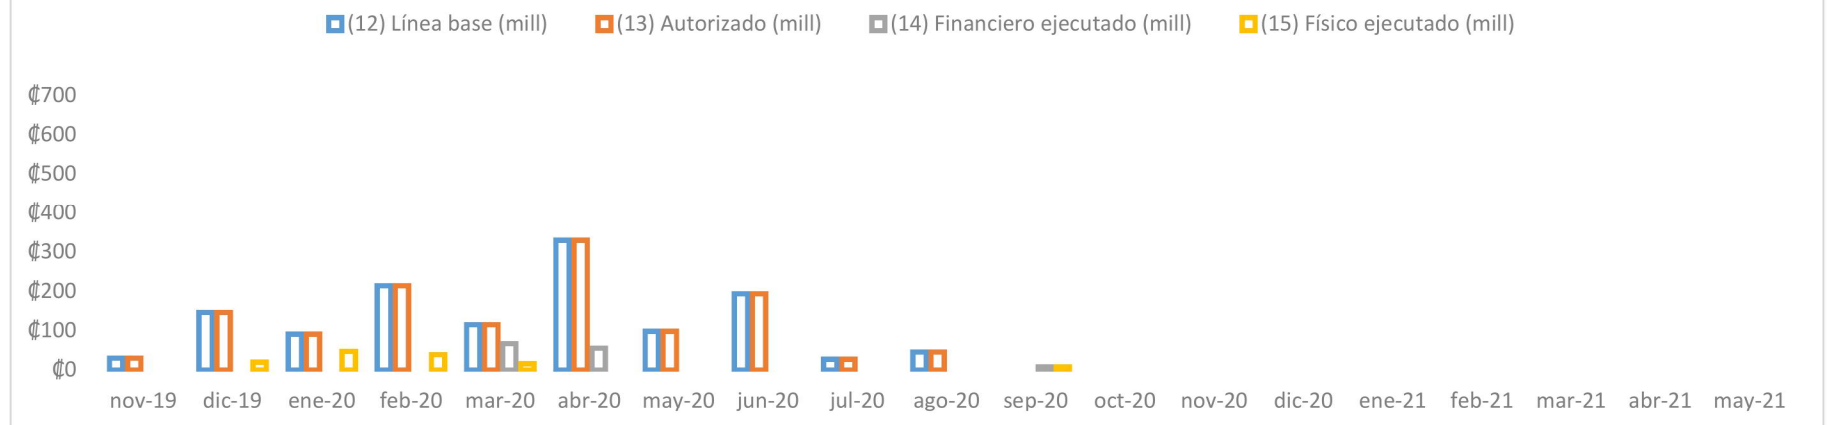

(4) Estado del proyecto: Suspendido

(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara" Licitación Publica 2018LN-000002-0006000001

Escala de tiempo del proyecto

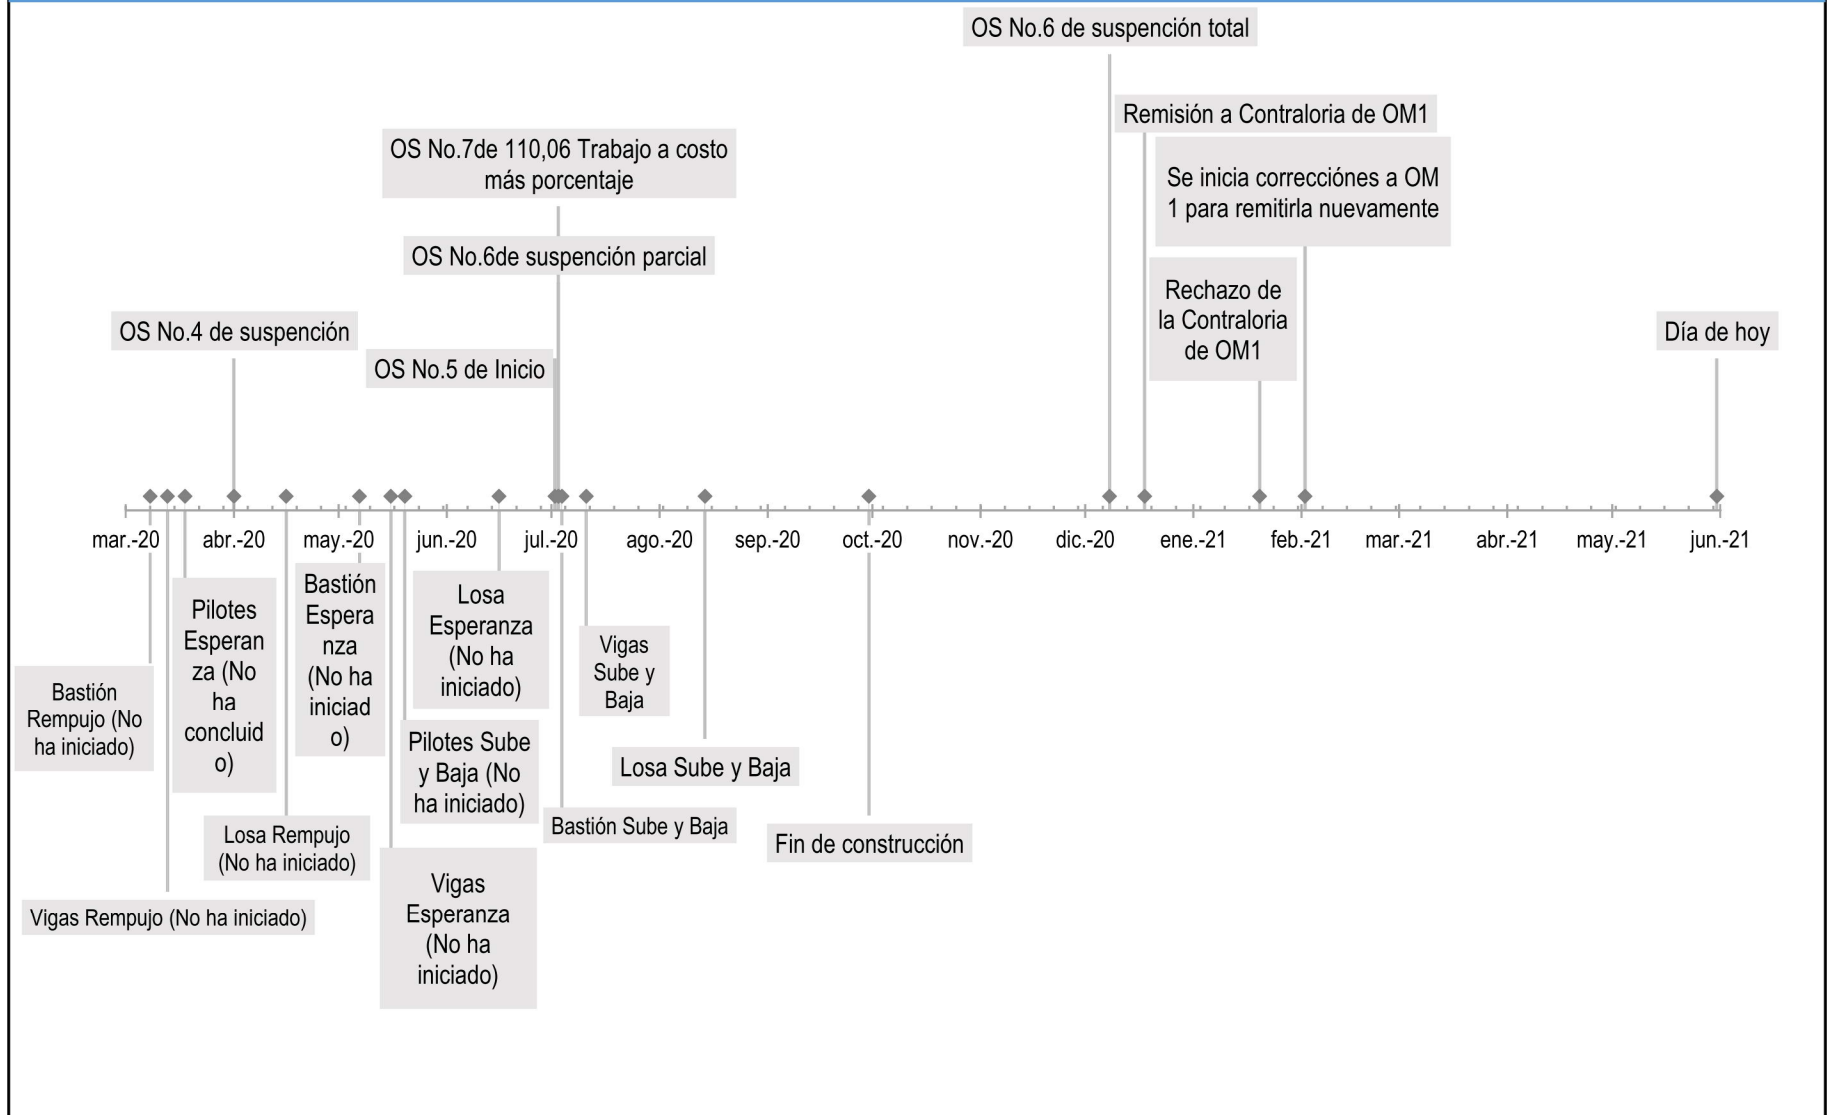

Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 02 de junio del 2021

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Mayo 2021

(3)Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara"
Licitación Publica 2018LN-000002-0006000001

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
Orden de servicio No.1 (Orden de Inicio). 13/11/2019	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.2 (Orden de Suspensión). 20/12/2019	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.3 (Orden de Reinicio) 20/12/2019	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.4 (Orden de Suspensión). 01/04/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.5 (Orden de Reinicio). 01/07/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.6 (Orden de Suspensión parcial). 01/07/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.7 (Orden de trabajos adicionales). 01/07/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.8 (Orden de Suspensión total). 04/12/2020	-	-	-	-	Aprobada

(4) Estado del proyecto: Suspendido.

(1) Fecha informe: 02 de junio del 2021

Periodo que reporta: Mayo 2021

Registro fotográfico

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Este mes no se realizaron trabajos debido a que el proyecto se encuentra suspendido, por lo cual no hay avance de obras para mostrar.

(4) Estado del proyecto: Suspendido
