
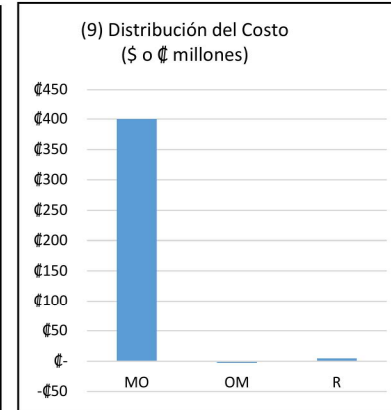


(3) Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-0DI00.

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Rafael Mena Carmona / Ing. Maykel González Lazo
Teléfono / Correo	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr 8913-4621; maykel.gonzalez@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	Puente Prefa Limitada / GCVP

(6) Descripción: Realizar el diseño geométrico, arquitectónico y estructural (incluyendo la elaboración de los planos constructivos) y la construcción de las estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional No.148, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantón: 7 Palmares; Distrito: 1 Palmares. Sección: 21730.
Obras a realizar:
Quebrada Azul: Puente de apoyos rígidos de 13,00m de ancho y 6,00m de largo.
Quebrada Cima: Alcantarilla de cuadro de 5,14m de ancho (longitud en calzada) y 13,00m de largo.
Obras complementarias: Accesos de aproximación de las estructuras mencionadas.
 La intervención total comprende aproximadamente 0,2 kilómetros.

(7) PLAZO	Orden de Inicio	1/6/2020	100,0%
	Plazo contractual (PC)	250 días	
	Eventos compens. (EC)	121 días	
	Plazo por suspensión (PS)	1130 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	371 días	
	Última suspensión	N/A	
	Plazo utilizado	371 días	% Avance
Fecha de Finalización	12/5/2021		

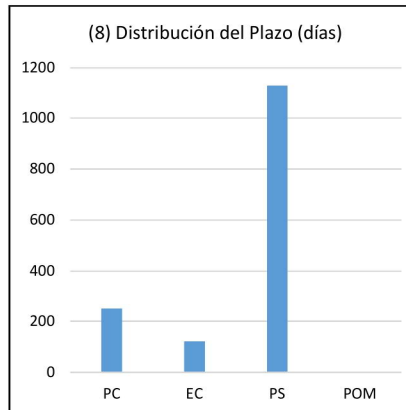

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	¢ 400.054.542,15	85%
	Orden Modificación (OM)	-¢ 2.690.706,33	
	Reajustes (R)	¢ 4.429.487,71	
	Monto total (MO+OM+R)	¢ 401.793.323,53	
	Financiero Ejec.	¢ 342.323.651,65	
Pendiente de pago (PP)	¢ -	% Ejec.	

(9) Consideraciones relevantes

Mediante oficio GCTI-32-22-0060 (1185) de fecha 27 de enero de 2022, se aprobaron los planos as built. Los mismos serán remitidos a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

Según el sistema BO SIFCO el reajuste correspondiente a la estimación del mes de mayo 2021 tiene fecha de acuerdo de pago el 27 de enero de 2021.

Se continúa realizando trabajos varios del cierre del proyecto (actualización de certificación final de calidad), con el fin de continuar con el finiquito.

Es importante indicar que para efectos de los gráficos de avance financiero, se excluyó lo correspondiente a la etapa de diseño, la cual estaba a cargo de la Gerencia de Contrataciones de Vías y Puentes. Además, se excluye en dichos gráficos lo correspondiente a reajustes.

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:
Ing. Maykel González Lazo


Ingeniero (a) de Supervisor:
Ing. José Mena Carmona

Gerente:
Ing. Pablo Contreras Vásquez


(1) Fecha informe: 02/02/2022
 Periodo que reporta: Enero 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-ODI00.

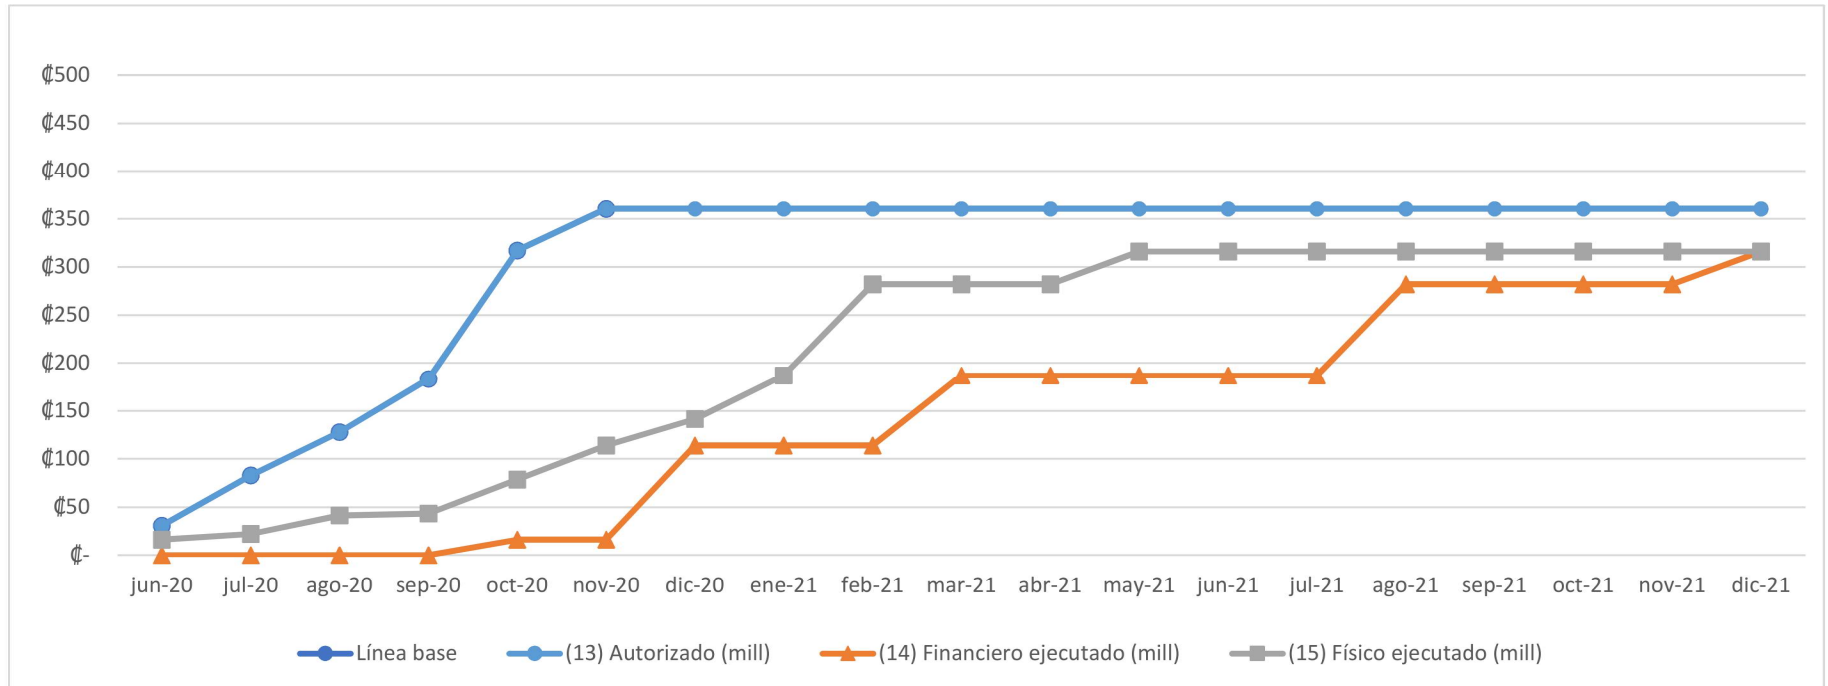


Flujo de desembolsos

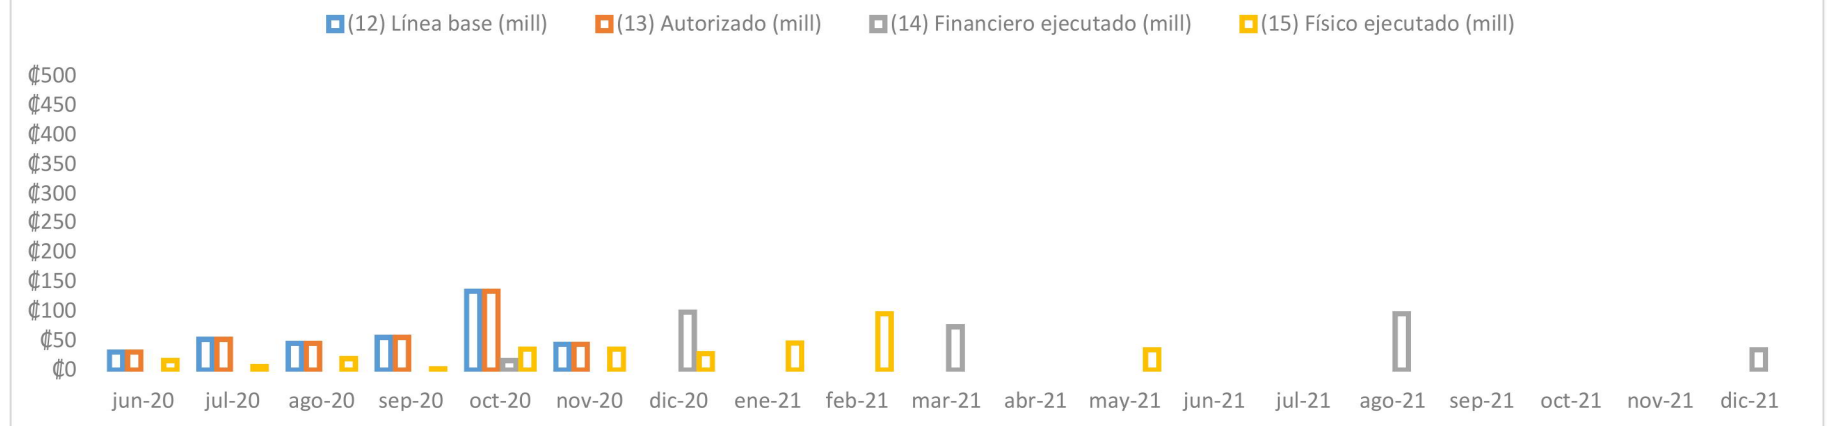

(6) Estado del proyecto: Cierre contractual

Escala de tiempo del proyecto

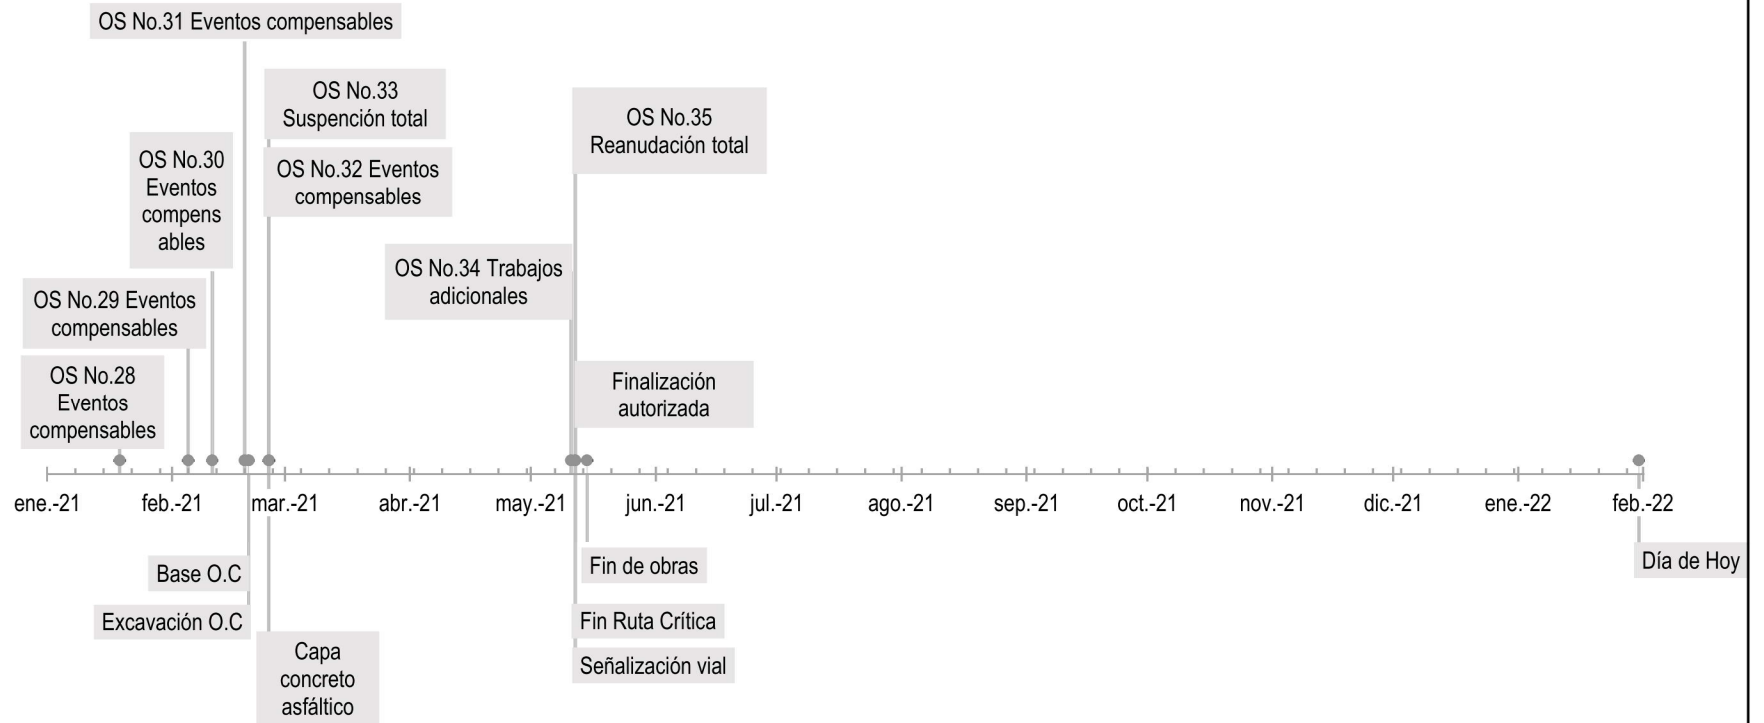

Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 02/02/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Enero 2022

(3)Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
ETAPA II. DISEÑO					
O.S. No.1 (Inicio de labores) 31/03/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.2 (Eventos compensables) 08/05/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.3 (Suspensión total) 08/05/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.4 (Reanudación total) 09/08/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.5 (Suspensión total) 26/09/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.6 (Reanudación total) 09/11/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.7 (Eventos compensables) 22/11/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.8 (Suspensión total) 22/11/2017	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Cierre contractual

(1)Fecha informe: 02/02/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Enero 2022

O.S. No.9 (Reanudación total) 12/01/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.10 (Suspensión total) 24/01/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.11 (Reanudación total) 20/04/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.12 (Suspensión total) 20/04/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.13 (Reanudación total) 17/08/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.14 (Suspensión total) 27/08/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.15 (Reanudación total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.16 (Suspensión total) 29/01/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.17 (Reanudación total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.18 (Suspensión total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.19 (Reanudación total) 09/08/2019	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Cierre contractual

(1) Fecha informe: 02/02/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Enero 2022

O.S. No.20 (Suspensión total) 27/08/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.M. No.1 (Disminución de monto) 29/10/2019	-	-	-¢ 2.690.706,33	Adición o eliminación de reglones de pago no presentados en oferta, así como variaciones de cantidades.	Aprobada
ETAPA III.CONSTRUCCIÓN					
O.S. No.21 (Reanudación) 28/05/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.22 (Eventos compensables) 13/11/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.23 (Eventos compensables) 23/11/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.24 (Eventos compensables) 11/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.25 (Eventos compensables) 11/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.26 (Eventos compensables) 21/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.27 (Eventos compensables) 21/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.28 (Eventos compensables) 19/01/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.29 (Eventos compensables) 05/02/2021	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Cierre contractual

(1) Fecha informe: 02/02/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Enero 2022

O.S. No.30 (Eventos compensables) 11/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.31 (Eventos compensables) 19/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.32 (Eventos compensables) 25/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.33 (Suspensión total) 25/02/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.M. No.2 (Reacomodo e inclusión de ítem) 07/05/2021	-	-	-	Reacomodo de cantidades sin variar objeto, monto ni plazo. Además, incluir el ítem CR.552.02.B Suministro y colocación de concreto 230 kg/ cm2	Aprobada
O.S. No.34 (Trabajos adicionales 110.06 bacheo) 11/05/2021	-	-	-	Bacheo en calle 0 Entre estación 0+633 y 0+770 de ruta alterna	Aprobada
O.S. No.35 (Reanudación) 11/05/2021	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Cierre contractual

(1) Fecha informe: 02/02/2022
Periodo que reporta: Enero 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico

El proyecto se ejecutó en su totalidad en mayo 2021.

(6) Estado del proyecto: Cierre contractual
