
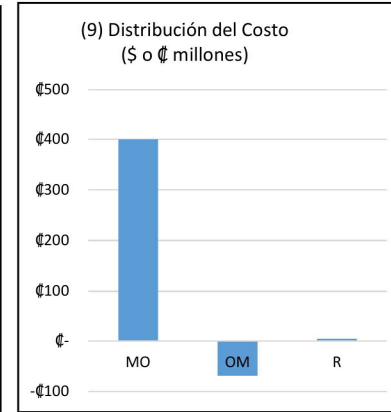


(3) Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-ODI00.

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Rafael Mena Carmona / Ing. Maykel González Lazo
Teléfono / Correo	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr 8913-4621; maykel.gonzalez@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	Puente Prefa Limitada / GCVP

(6) Descripción: Realizar el diseño geométrico, arquitectónico y estructural (incluyendo la elaboración de los planos constructivos) y la construcción de las estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional No.148, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantón: 7 Palmares; Distrito: 1 Palmares. Sección: 21730.
Obras a realizar:
Quebrada Azul: Puente de apoyos rígidos de 13,00m de ancho y 6,00m de largo.
Quebrada Cima: Alcantarilla de cuadro de 5,14m de ancho (longitud en calzada) y 13,00m de largo.
Obras complementarias: Accesos de aproximación de las estructuras mencionadas.
 La intervención total comprende aproximadamente 0,2 kilómetros.

(7) PLAZO	Orden de Inicio	1/6/2020	100,0%
	Plazo contractual (PC)	250 días	
	Eventos compens. (EC)	121 días	
	Plazo por suspensión (PS)	1130 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	371 días	
	Última suspensión	N/A	
	Plazo utilizado	371 días	% Avance
Fecha de Finalización	12/5/2021		

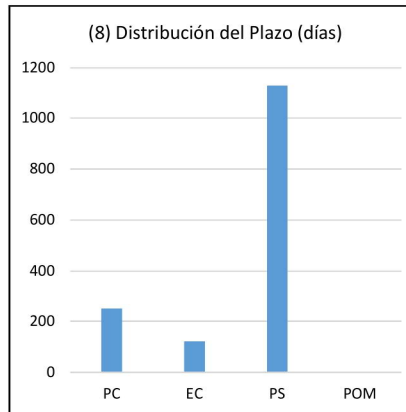

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	¢ 400.054.542,15	100%
	Orden Modificación (OM)	-¢ 68.561.250,80	
	Reajustes (R)	¢ 4.429.487,71	
	Monto total (MO+OM+R)	¢ 335.922.779,06	
	Financiero Ejec.	¢ 335.922.779,05	
Pendiente de pago (PP)	¢ -	% Ejec.	

(9) Consideraciones relevantes

(10) Elaborado y aprobado por:

La orden de modificación N°3 y final (Finiquito) fue aprobada mediante oficio GCTR-31-22-0197 (1185) de fecha 15 de marzo de 2022. Por lo tanto, la relación contractual queda debidamente finiquitada.

Ingeniero (a) de Proyecto:
Ing. Maykel González Lazo


Ingeniero (a) de Supervisor:
Ing. José Mena Carmona

Gerente:
Ing. Pablo Contreras Vásquez


(1) Fecha informe: 04/04/2022
 Periodo que reporta: Marzo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada No. 2014LA-000006-ODI00.

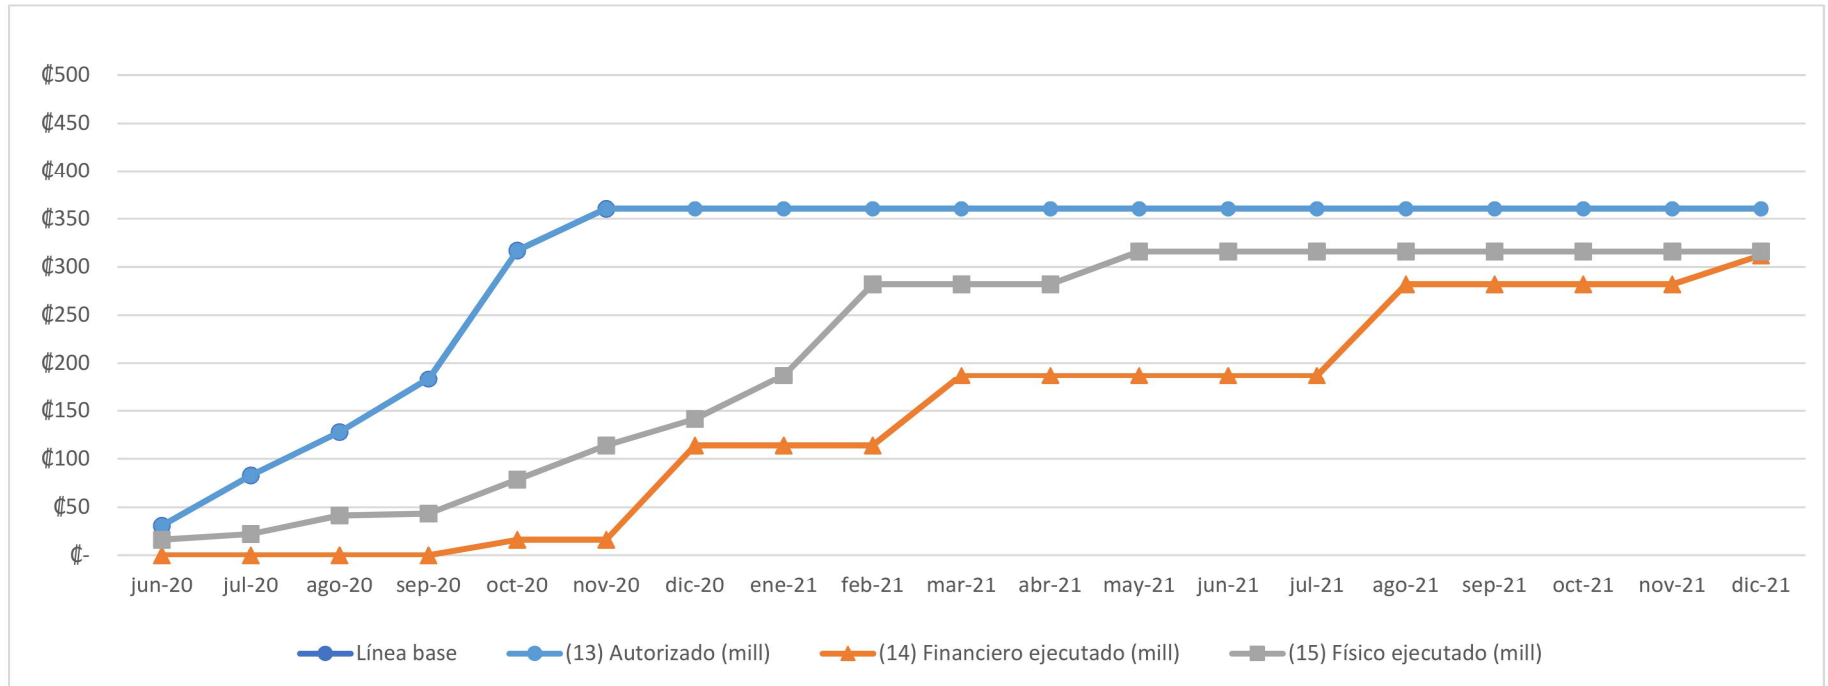


Flujo de desembolsos

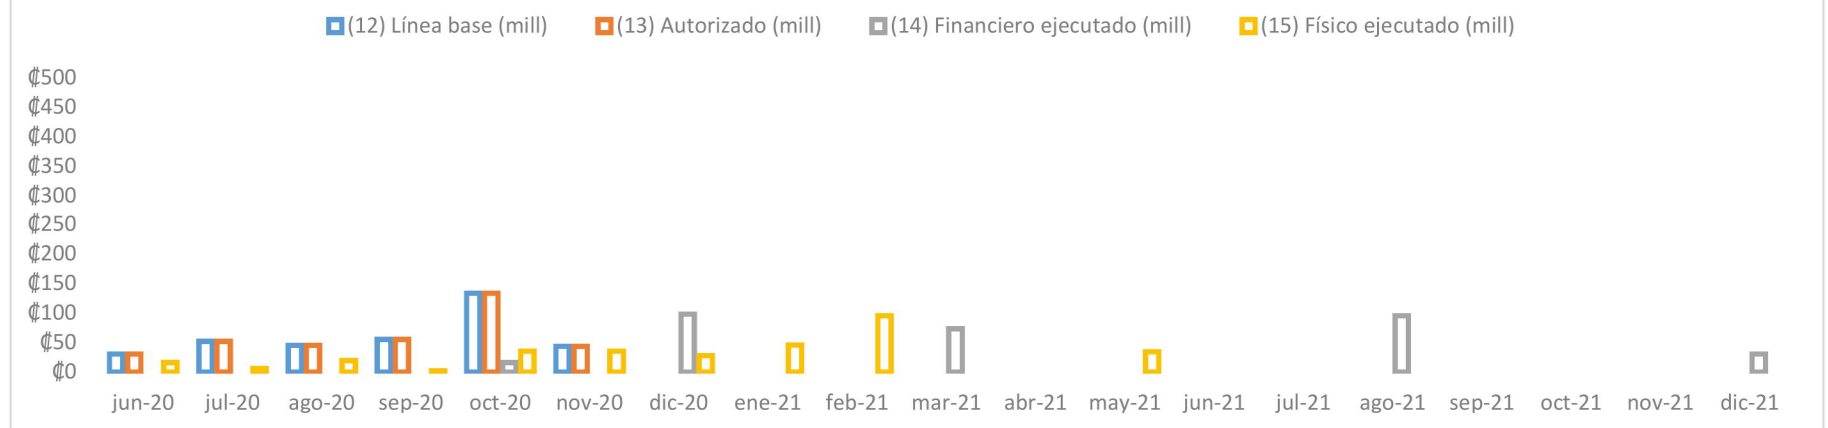

(6) Estado del proyecto: Finiquito

Escala de tiempo del proyecto

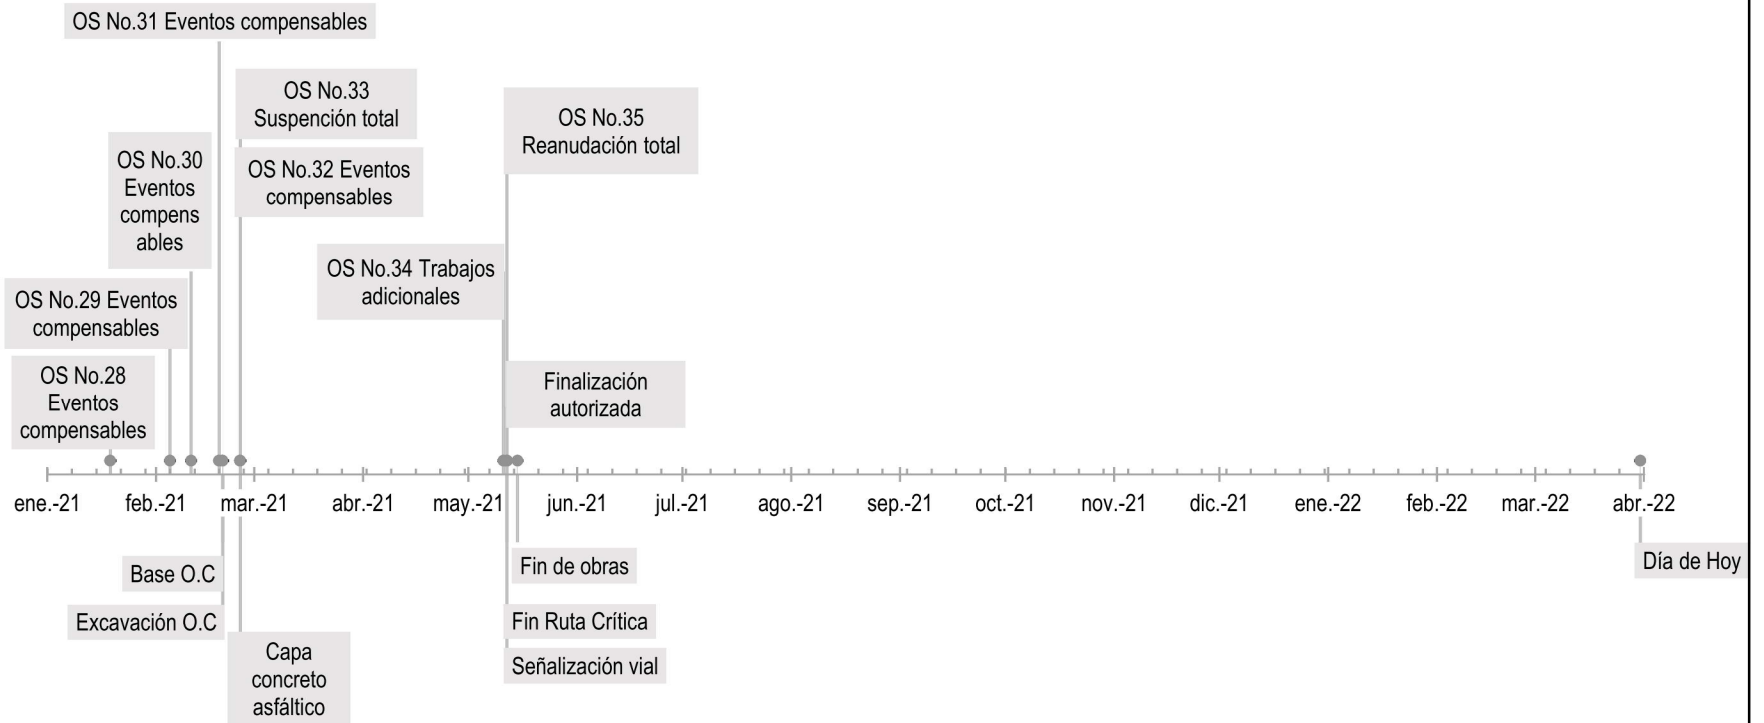

Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 04/04/2022
Periodo que reporta: Marzo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3)Proyecto: "Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la Quebrada Azul y la Quebrada Cima, Ruta Nacional N°148". Licitación Abreviada

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
ETAPA II. DISEÑO					
O.S. No.1 (Inicio de labores) 31/03/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.2 (Eventos compensables) 08/05/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.3 (Suspensión total) 08/05/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.4 (Reanudación total) 09/08/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.5 (Suspensión total) 26/09/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.6 (Reanudación total) 09/11/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.7 (Eventos compensables) 22/11/2017	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.8 (Suspensión total) 22/11/2017	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Finiquito

(1) Fecha informe: 04/04/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Marzo 2022

O.S. No.9 (Reanudación total) 12/01/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.10 (Suspensión total) 24/01/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.11 (Reanudación total) 20/04/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.12 (Suspensión total) 20/04/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.13 (Reanudación total) 17/08/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.14 (Suspensión total) 27/08/2018	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.15 (Reanudación total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.16 (Suspensión total) 29/01/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.17 (Reanudación total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.18 (Suspensión total) 19/07/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.19 (Reanudación total) 09/08/2019	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Finiquito

(1) Fecha informe: 04/04/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Marzo 2022

O.S. No.20 (Suspensión total) 27/08/2019	-	-	-	-	Aprobada
O.M. No.1 (Disminución de monto) 29/10/2019	-	-	-¢ 2.690.706,33	Adición o eliminación de reglones de pago no presentados en oferta, así como variaciones de cantidades.	Aprobada
ETAPA III.CONSTRUCCIÓN					
O.S. No.21 (Reanudación) 28/05/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.22 (Eventos compensables) 13/11/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.23 (Eventos compensables) 23/11/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.24 (Eventos compensables) 11/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.25 (Eventos compensables) 11/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.26 (Eventos compensables) 21/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.27 (Eventos compensables) 21/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.28 (Eventos compensables) 19/01/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.29 (Eventos compensables) 05/02/2021	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Finiquito

(1) Fecha informe: 04/04/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Marzo 2022

O.S. No.30 (Eventos compensables) 11/02/2021	-	-	-	-	Aprobada	
O.S. No.31 (Eventos compensables) 19/02/2021	-	-	-	-	Aprobada	
O.S. No.32 (Eventos compensables) 25/02/2021	-	-	-	-	Aprobada	
O.S. No.33 (Suspensión total) 25/02/2021	-	-	-	-	Aprobada	
O.M. No.2 (Reacomodo e inclusión de ítem) 07/05/2021	-	-	-	Reacomodo de cantidades sin variar objeto, monto ni plazo. Además, incluir el ítem CR.552.02.B Suministro y colocación de concreto 230 kg/ cm2	Aprobada	
O.S. No.34 (Trabajos adicionales 110.06 bacheo) 11/05/2021	-	-	-	Bacheo en calle 0 Entre estación 0+633 y 0+770 de ruta alterna	Aprobada	
O.S. No.35 (Reanudación) 11/05/2021	-	-	-	-	Aprobada	
O.M. No.3 y final (Finiquito) 15/03/2022	-	-	-	65.870.544,47	Se realiza el cierre técnico y financiero de la Contratación, una vez cumplido el objeto del mismo, realizados los estudios técnicos que acrediten los términos de la contratación y pago de la totalidad de la obra realizada.	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Finiquito

(1) Fecha informe: 04/04/2022
Periodo que reporta: Marzo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico

El proyecto se ejecutó en su totalidad en mayo 2021.

(6) Estado del proyecto: Finiquito
