
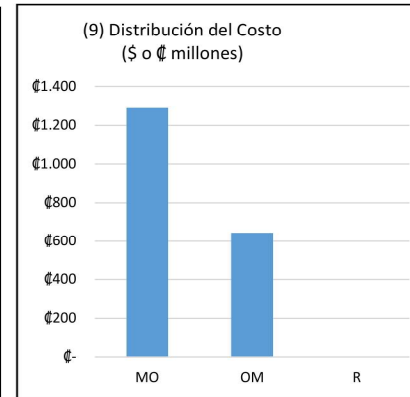


(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara"
 Licitación Pública 2018LN-000002-0006000001

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Rafael Mena Carmona
Teléfono / Correo	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	Codocsa S.A. / GCVP

(6) Descripción: Ubicación de Proyecto: Guanacaste, Nicoya, Nosara. Longitud: la longitud incluidos los accesos es (Puente Rempujo, Puente Esperanza, Puente Sube y Baja). Descripción de trabajo a realizar: Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Río Esperanza y Río Rempujo y sus accesos, en la Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara. Sección de control: 50592 Localización: Barco Quebrado (R.934)-Nosara (Cruce centro Población).

(7) PLAZO	Orden de Inicio	13/11/2019	54%
	Plazo contractual (PC)	300 días	
	Eventos compens. (EC)	0 días	
	Plazo por suspensión (PS)	727,00 días	
	Plazos OM (POM)	75 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	375 días	
	Última suspensión	8/12/2020	
	Plazo utilizado	204 días	% Avance
Fecha de Finalización	6/12/2022		

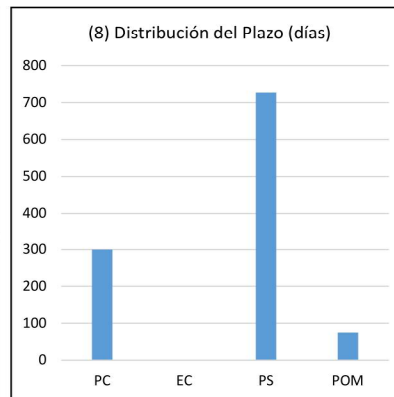

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	₡ 1.291.327.588,91	7%
	Orden Modificación (OM)	₡ 643.049.227,08	
	Reajustes (R)	₡ -	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 1.934.376.815,99	
	Financiero Ejec.	₡ 129.797.449,44	
Pendiente de pago (PP)	₡ 136.095.610,66	% Ejec.	

(9) Consideraciones relevantes

(10) Elaborado y aprobado por:



<p>En este mes se trabajaron en las siguientes actividades:</p> <p><u>Puente sobre el Río Rempujo (Avance a abril 2022: 21,54%):</u> -Transporte de pilotes suministrados. -Colocación de acero de refuerzo en muro y aletones de ambos bastiones. -Encofrado y colada de concreto en muro y aletones de bastión 1 y placa de fundación de bastión 2. -Pintura de vigas.</p> <p><u>Puente sobre el Río Esperanza (Avance a abril 2022: 15,40%):</u> -Excavación y relleno para sustitución de material para fundación de bastión 2. -Apuntalamiento y empalmes de pilote en bastión 1 -hinca de pilotes en ambos bastiones. -Corta de sobrantes de pilotes en bastión 2. -Colado de sello de fundación de bastión 2. -Colocación de acero de refuerzo en placa de fundación y muro de bastión 2. -Colada de concreto en placa de fundación de bastión 2.</p> <p><u>Puente sobre Quebrada Sube y Baja (Avance a abril 2022: 2,99%):</u> -Limpieza y desmonte. -Transporte de pilotes suministrados.</p> <p>Con respecto a la contratación de servicios de verificación de calidad requerido para el proyecto, la misma se encuentra en proceso por parte de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes.</p> <p>El informe técnico sobre el reclamo administrativo interpuesto por la empresa Codocsa S.A. al presente contrato, continúa en revisión por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. El mismo había sido remitido mediante el oficio GCTI-15-21-1209 (0736) de fecha 30 de noviembre de 2021.</p> <p>La inscripción del proyecto ante el CFIA se encuentra en lista, con su respectivo número de exoneración de parte del I.V.A.</p>	<p>Ingeniero (a) de Proyecto: José Rafael Mena Carmona</p> <hr/> <p>Gerente: Pablo Contreras Vásquez</p>
--	--

(1) Fecha informe: 06 de junio del 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Mayo 2022

(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara"
Licitación Publica 2018LN-000002-0006000001

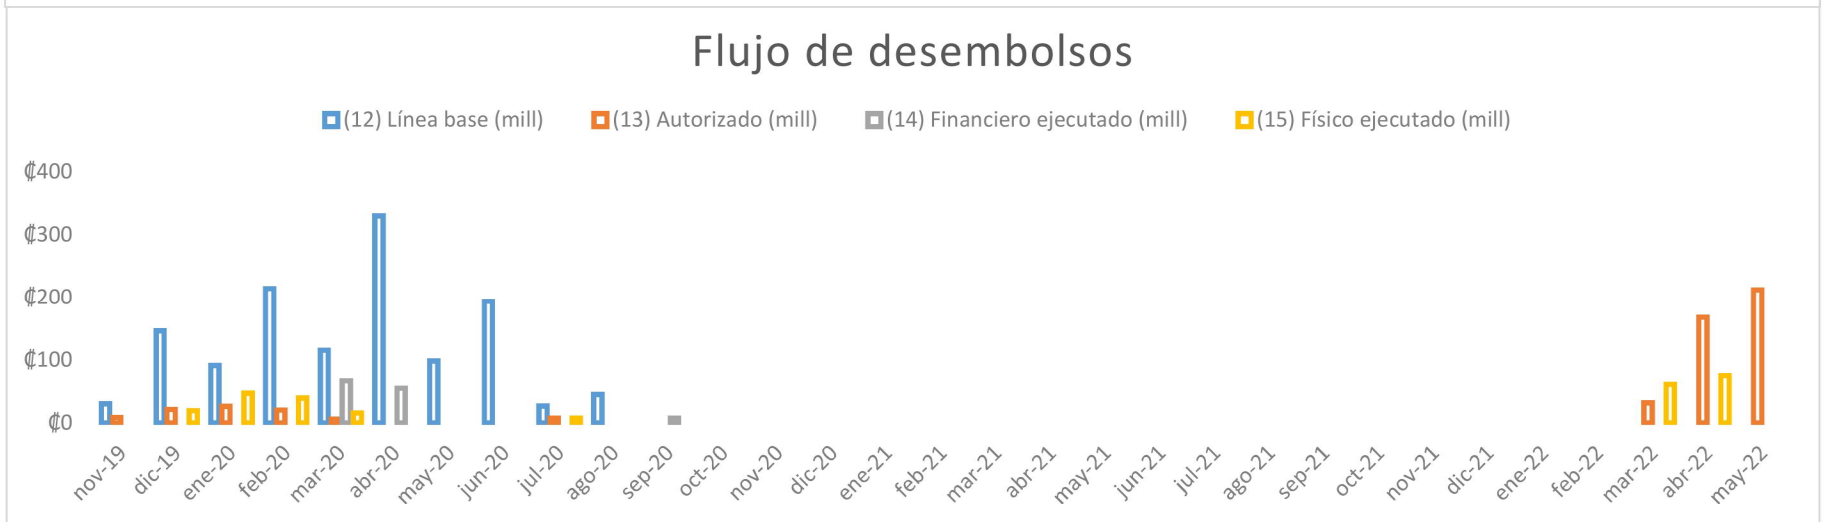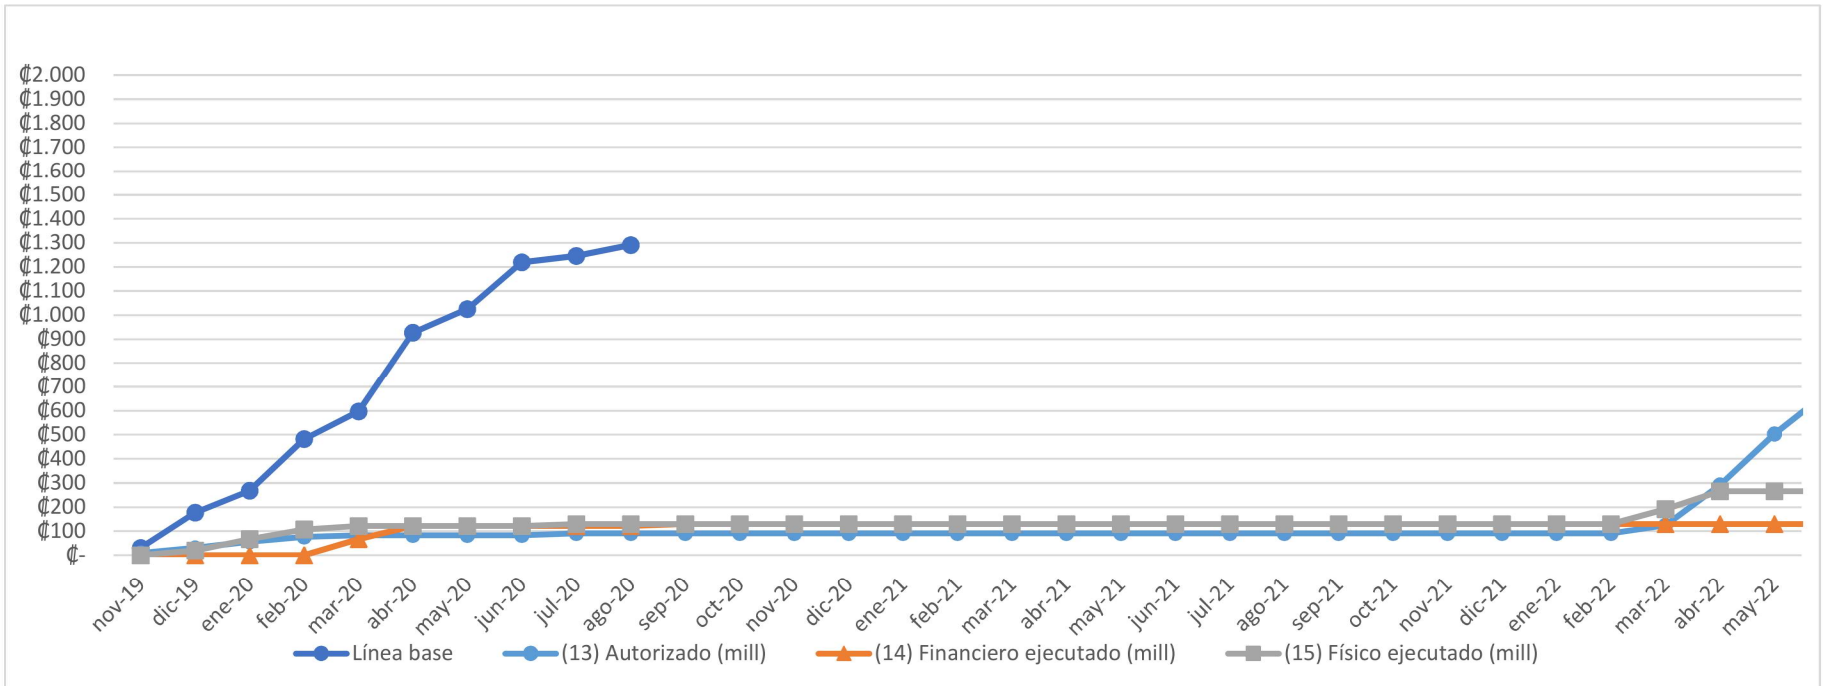

(4) Estado del proyecto: En Ejecución


(1) Fecha informe: 06 de junio del 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Mayo 2022

(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara" Licitación Publica 2018LN-000002-0006000001

Escala de tiempo del proyecto

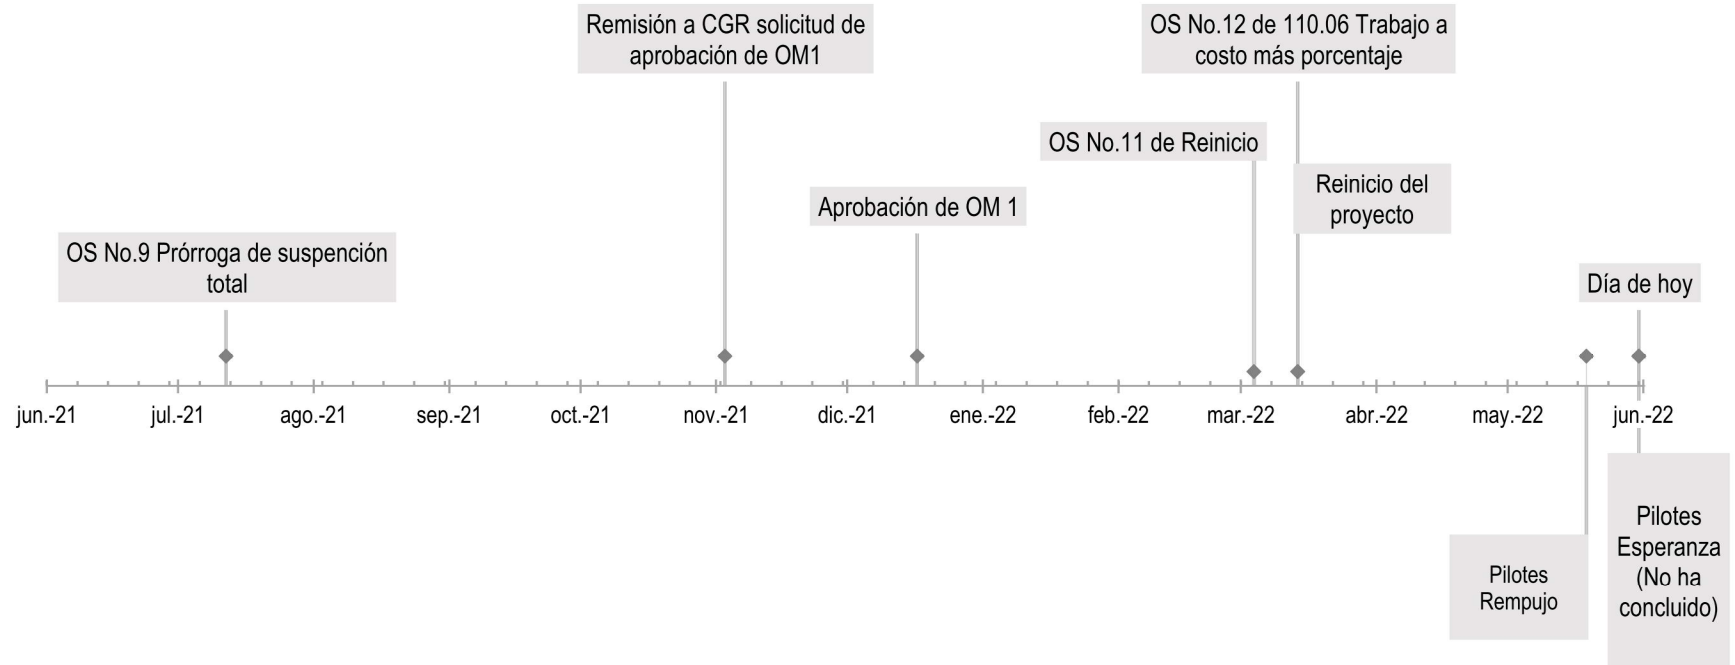

Ruta Crítica del proyecto

(4) Estado del proyecto: En Ejecución

(1) Fecha informe: 06 de junio del 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Mayo 2022

(3) Proyecto: "Construcción de tres Puentes sobre: la Quebrada Sube y Baja, Rio Esperanza y Rio Rempujo, Ruta Nacional No. 160, Sección Garza-Nosara"
Licitación Publica 2018LN-000002-0006000001

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
Orden de servicio No.1 (Orden de Inicio). 13/11/2019	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.2 (Orden de Suspensión). 20/12/2019	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.3 (Orden de Reinicio) 20/12/2019	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.4 (Orden de Suspensión). 01/04/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.5 (Orden de Reinicio). 01/07/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.6 (Orden de Suspensión parcial). 01/07/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.7 (Orden de trabajos adicionales). 01/07/2020	-	-	-	-	Aprobada

(4) Estado del proyecto: En Ejecución

(1) Fecha informe: 06 de junio del 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Mayo 2022

Orden de servicio No.8 (Orden de Suspensión total). 04/12/2020	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.9 (Prórroga de Suspensión total). 12/07/2021	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.10 (Prórroga de Suspensión total). 06/12/2021	-	-	-	-	Aprobada
Orden de modificación No.1 (Aumento de monto y plazo y creación de ítems). 23/02/2022	75 días naturales	Tiempo estimado para realizar las obras objeto de esta orden	₺ 643.049.227,08	Aumento de cantidades y creación de ítem requeridos para cumplir el objeto contractual	Aprobada
Orden de servicio No.11 (Reinicio total). 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.12 (Trabajos adicionales CR.110.06). 14/03/2022	-	-	-	-	Aprobada
Orden de servicio No.13 (Eventos compensables).	-	-	-	-	En proceso

(4) Estado del proyecto: En Ejecución

(1) Fecha informe: 06 de junio del 2022
Periodo que reporta: Mayo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico



Fotografía N°1. Colada de placa de fundación.
Bastión 2, Puente sobre el Río Rempujo



Fotografía N°2. Encofrado de pantalla. Bastión 1,
Puente sobre el Río Rempujo



Fotografía N°3. Colada de placa de fundación.
Bastión 2, Puente sobre el Río Esperanza



Fotografía N°4. Limpieza. Puente sobre el Qda.
Sube y Baja

(4) Estado del proyecto: En Ejecución
