
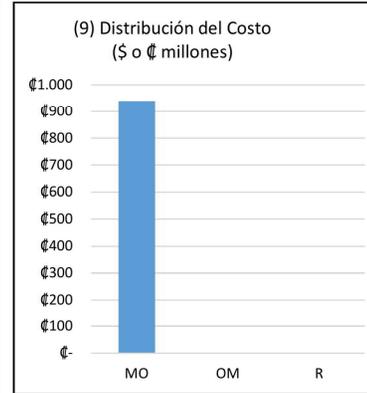


(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

| | |
|--------------------------------|--|
| (5) Unidad encargada | Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP) |
| Encargado | Ing. José Mena Carmona |
| Teléfono / Correo | 8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr |
| Fuente Financiamiento | Fondo Vial |
| Contratista/Supervisora | CODOCSA S.A / GCVP |

(6) Descripción: Realizar la construcción del puente sobre el Río Poás y sus accesos, en la Ruta Nacional No. 107, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantones: 01 Alajuela y 08 Poás; Distritos: 07 Sabanilla (Alajuela) y 01 San Pedro (Poás). Sección: 20380 y 20390.
 Obras a realizar:
 -Desarmar, trasladar y descargar el puente metálico lanzable existente y depositarlo en el Plantel Colima, en Santo Domingo de Heredia.
 -Demoler la estructura del puente existente.
 -Construir la subestructura y superestructura, del puente sobre el río Poás.
 -Construir los accesos de aproximación.
 -Colocar el señalamiento vial correspondiente.
 La intervención total comprende aproximadamente 0,045 kilómetros.

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| (7) PLAZO | Orden de Inicio | 4/9/2020 | 1% |
| | Plazo contractual (PC) | 180 días | |
| | Eventos compens. (EC) | 0 días | |
| | Plazo por suspensión (PS) | 633 días | |
| | Plazos OM (POM) | 0 días | |
| | Plazo total (PC+EC+POM) | 180 días | |
| | Última suspensión | 6/3/2022 | % Avance |
| | Plazo utilizado | 2 días | |
| Fecha de Finalización | | INDEFINIDA | |

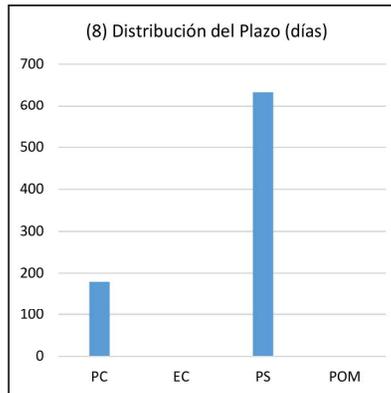

| | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| (8) COSTO | Monto de oferta (MO) | ₡ 940.552.331,32 | 0% |
| | Orden Modificación (OM) | ₡ - | |
| | Reajustes (R) | ₡ - | |
| | Monto total (MO+OM+R) | ₡ 940.552.331,32 | |
| | Financiero Ejec. | ₡ - | % Ejec. |
| | Pendiente de pago (PP) | ₡ - | |

(9) Consideraciones relevantes


(10) Elaborado y aprobado por:

| | |
|---|--|
| <p>Se continúa a la espera de la respuesta por parte de IMSA, al oficio DVP 34-2021-0308 de fecha 15 de julio de 2021 emitido por la Gerencia de Contratación, sobre inconsistencias presentadas en las cantidades y planos enviados por IMSA. Mediante oficio DCO 22-2022-0333 de fecha 03 de mayo de 2022 se realizó el séptimo recordatorio sobre las dudas pendientes de atender del proyecto en referencia.</p> <p>Con respecto al deslizamiento que se presentó en el sector del mirador. El contratista mediante nota CODO-OF-21-2022 de fecha 5 de mayo de 2022, remite el subsane solicitado por la Dirección de diseño de vías y Puentes sobre las memorias de cálculo estructural. Además, el contratista a solicitud de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, evalúa alguna solución que no requiera intervenir área privada, lo cual conllevaría un proceso de expropiación.</p> <p>El trámite correspondiente al Decreto de Conveniencia Nacional necesario para realizar la corta de árboles respectiva en el proyecto, se encuentra en trámite a cargo de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. Mediante oficio GCTI-15-22-0332 (1138) de fecha 18 d emayo de 2022 la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes consulta el estado del trámite.</p> <p>Con respecto a la contratación de servicios de verificación de calidad requerido para el proyecto, la misma se encuentra en proceso por parte de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes.</p> <p>Una vez que se defina el diseño por parte de la Gerencia de Contrataciones, se procederá a realizar la orden de modificación para incluir los cambios e ítems nuevos del rediseño, con el fin de contar con todo lo requerido para el reinicio de la obra.</p> | <p>_____ Ingeniero (a) de Proyecto: Ing. José Mena Carmona</p> <p>_____ Gerente: Ing. Pablo Contreras Vásquez</p> |
|---|--|

(1) Fecha informe: 06/06/2022
 Periodo que reporta: Mayo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

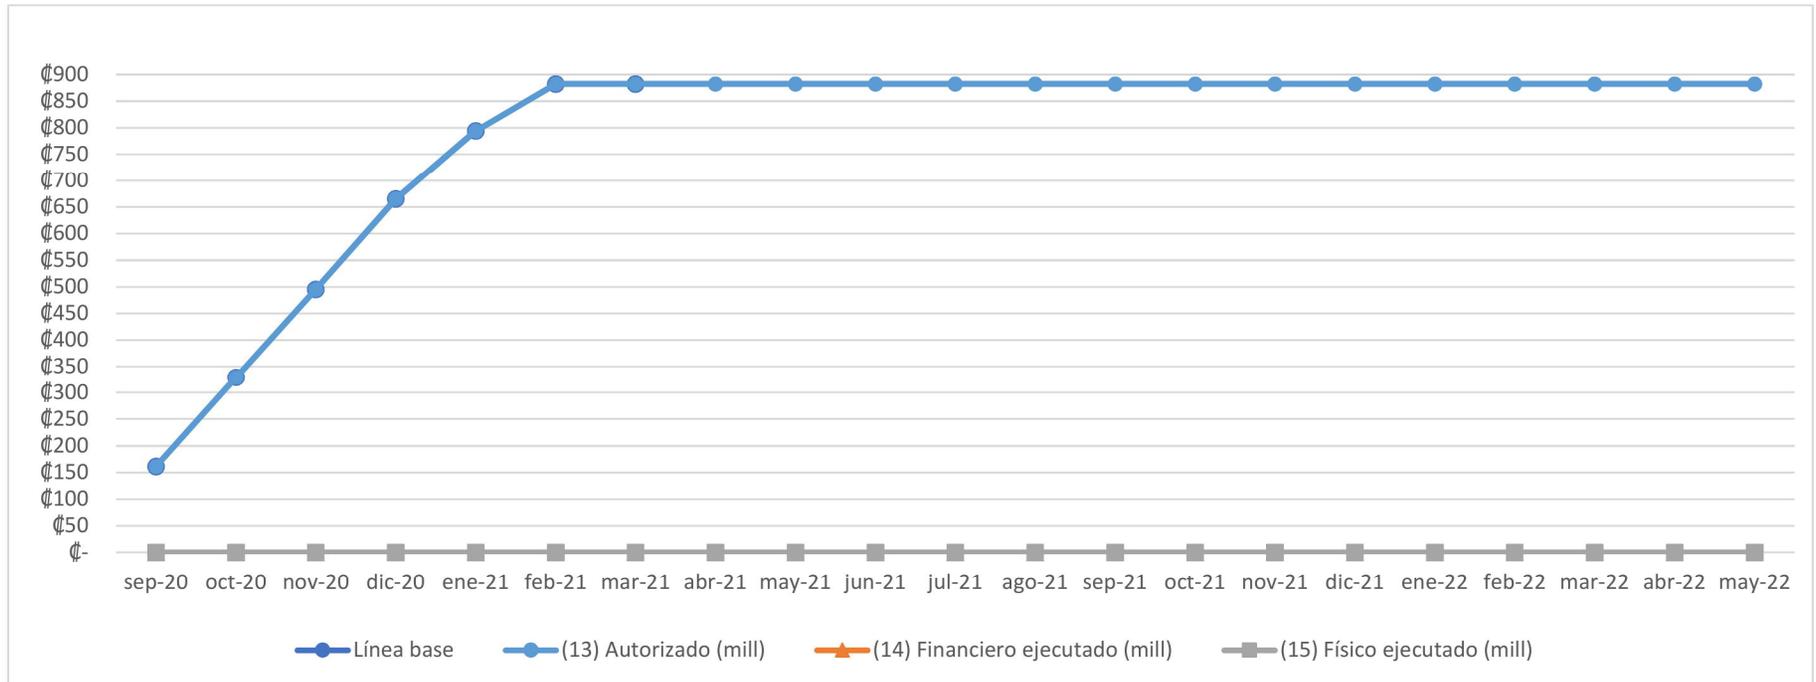


Flujo de desembolsos



(6) Estado del proyecto: Suspendido

Escala de tiempo del proyecto

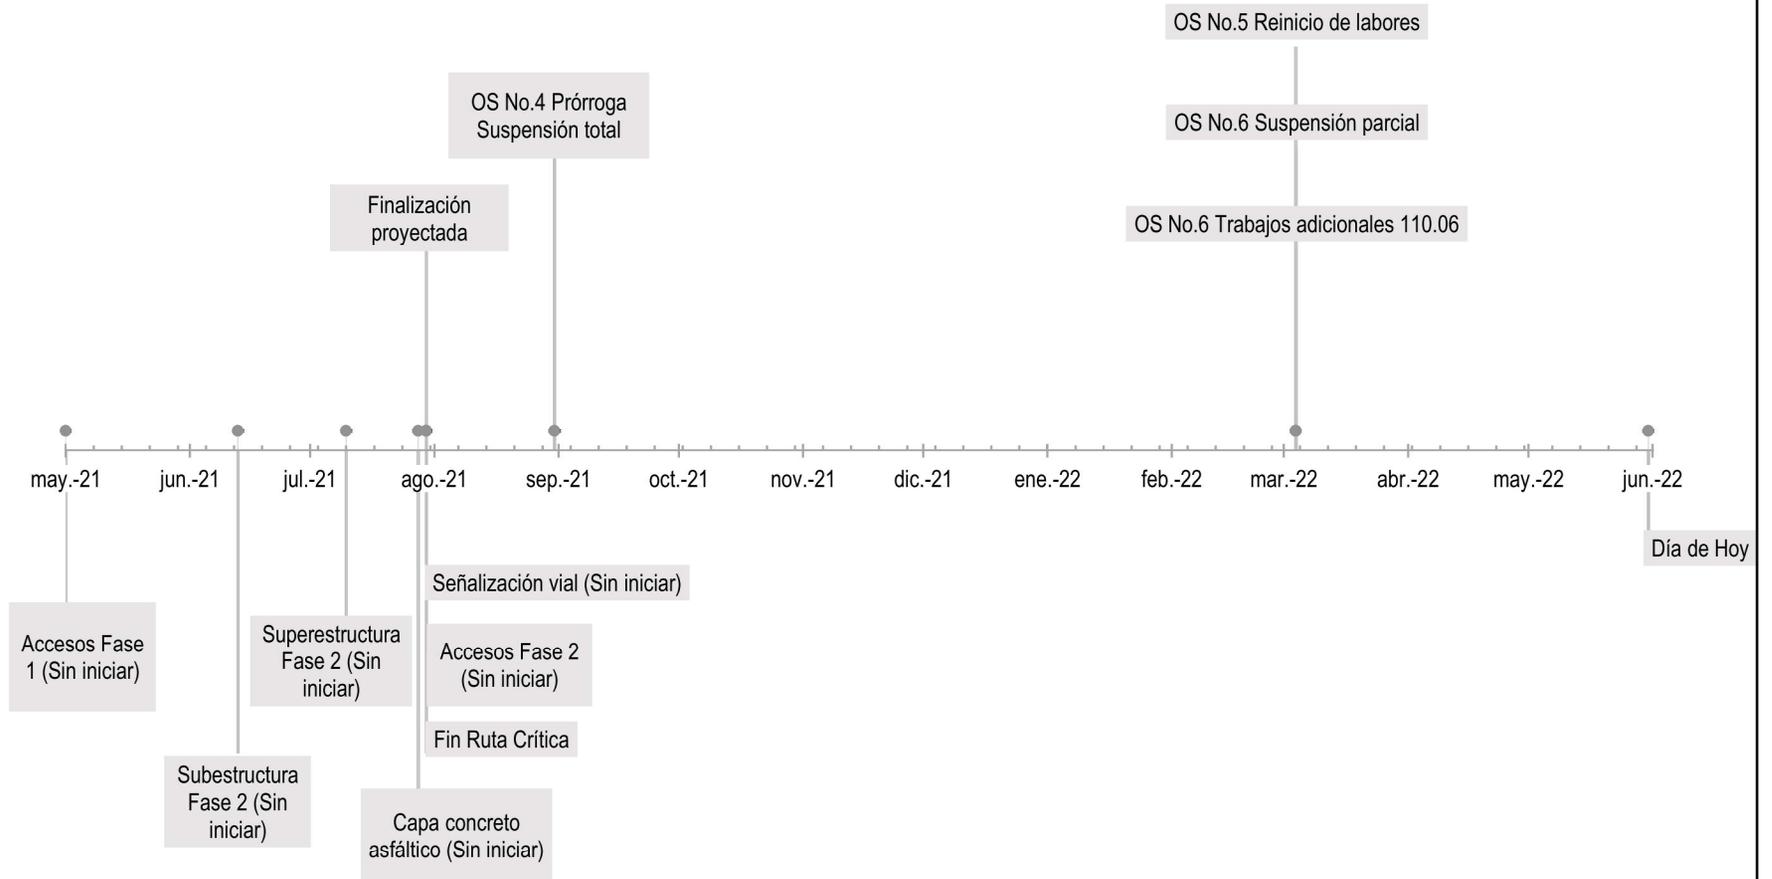

Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 06/06/2022
Periodo que reporta: Mayo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3)Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

| (16)Tipo de orden, número y fecha | (17) Modificación en Tiempo | | (18) Modificación en Costo | | (19) Estado Actual |
|---|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------|
| | Incremento | Razón | Incremento | Razón | |
| O.S. No.1 (Inicio de labores) 04/09/2020 | - | - | - | - | Aprobada |
| O.S. No.2 (Suspensión total de labores) 04/09/2020 | - | - | - | - | Aprobada |
| O.S. No.3 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2) 07/04/2021 | - | - | - | - | Aprobada |
| O.S. No.4 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2 y prorrogada con O.S. No.3) 31/08/2021 | - | - | - | - | Aprobada |
| O.S. No.5 (Reinicio de labores) 04/03/2022 | - | - | - | - | Aprobada |
| O.S. No.6 (Suspensión parcial de labores) 04/03/2022 | - | - | - | - | Aprobada |
| O.S. No.7 (Trabajos adicionales CR.110.06) 04/03/2022 | - | - | - | - | Aprobada |

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 06/06/2022
Periodo que reporta: Mayo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico

No se adjunta registro fotográfico debido a que el proyecto se encuentra suspendido, por lo cual no hay avance de obra que mostrar.

(6) Estado del proyecto: Suspendido
