

(1) Fecha informe: 18/03/2020

(2) Tipo de trabajo:



Periodo que reporta: al 29 de febrero de 2020

(3) Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada	UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA
Encargado	Greivin Jiménez Esquivel
Teléfono / Correo	88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Aporte del Gobierno Mexico \$5MM+Fondo Vial CONAVI
Contratista/Supervisora	UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla obras complementarias, como obras de arte, pasos a desnivel, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios Fronterizos

(7) PLAZO	Orden de Inicio	1/6/2015	80%
	Plazo contractual (PC)	59,83 meses	
	Eventos compens. (EC)	0,5 meses	
	Plazo por suspensión (PS)	11,67 meses	
	Plazos OM (POM)	0 meses	
	Plazo total (PC+EC+POM)	72 meses	
	Última suspensión	N/A	
	Plazo utilizado	58,80 meses	% Avance
Fecha de Finalización	31/5/2021		

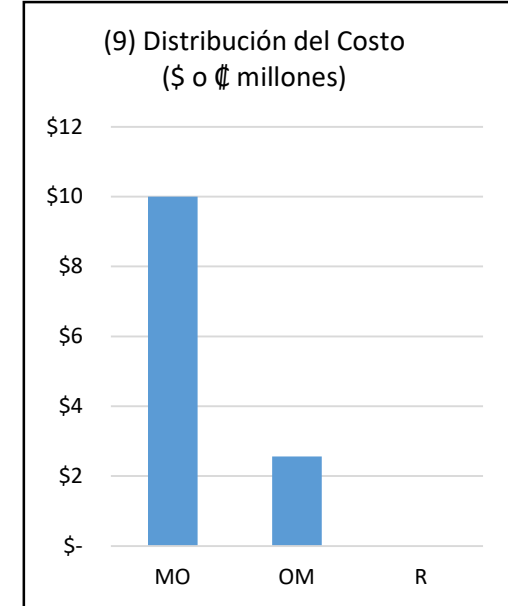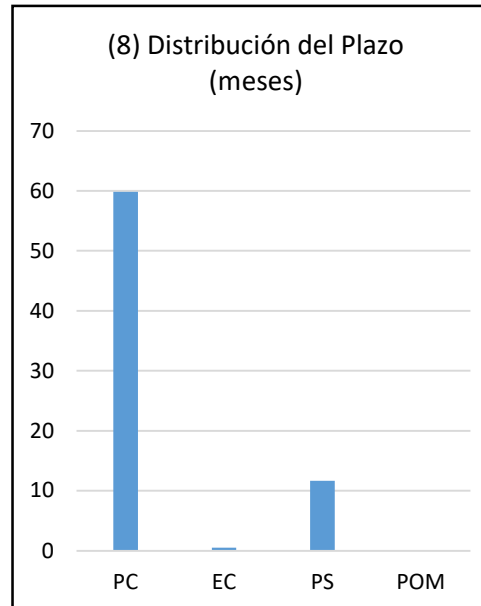

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	\$ 10.000.000,00	99%
	Orden Modificación (OM)	\$ 2.558.873,00	
	Reajustes (R)	\$ -	
	Monto total (MO+OM+R)	\$ 12.558.873,00	
	Financiero Ejec.	\$ 12.462.627,04	
	Pendiente de pago (PP)	\$ 96.246,26	% Ejec.

(9) Consideraciones relevantes

(10) Elaborado y aprobado por:

La fase de ejecución tiene como fecha de término el 10 de julio de 2020, el cierre el proyecto está programado para mayo de 2021 (Periodo de Notificación de Defectos de 12 meses más dos meses de cierre administrativo financiero), sin embargo se deberá presentar una Adenda No.3 al MdA por ampliación de plazo (tres meses aproximadamente) ya que la fase de ejecución presenta un atraso de 90 días en la construcción de la Pila No.4 en Panamá, aún no se estima un posible incremento en el aporte de contrapartida por parte del Gobierno de Costa Rica.


Ingeniero (a) de Proyecto:
Lic. Mario Sánchez Ramírez
Gerente:
Ing. Greivin Jiménez Esquivel MAP.

(4) Estado del proyecto:


(1) Fecha informe: 18/03/2020

Periodo que reporta: al 29 de febrero de 2020

(3) Proyecto: "Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)"

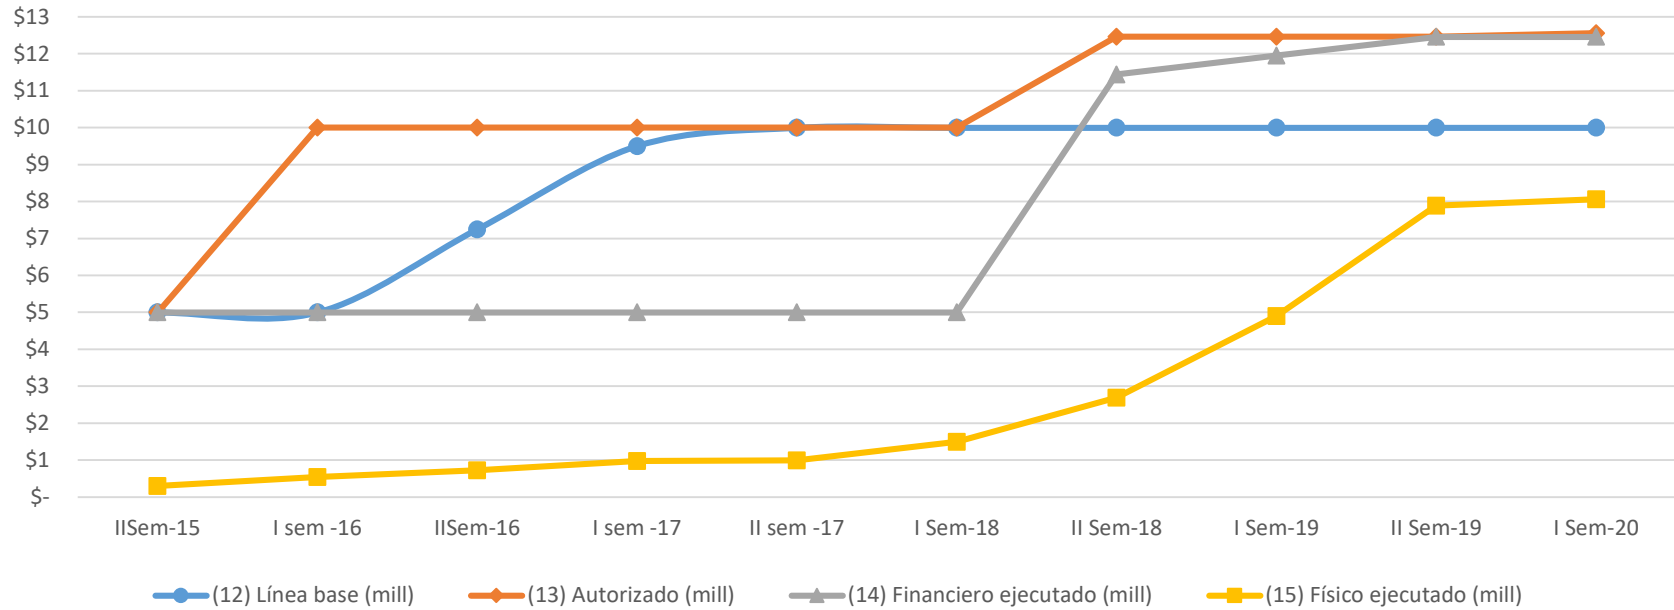

Flujo de desembolsos

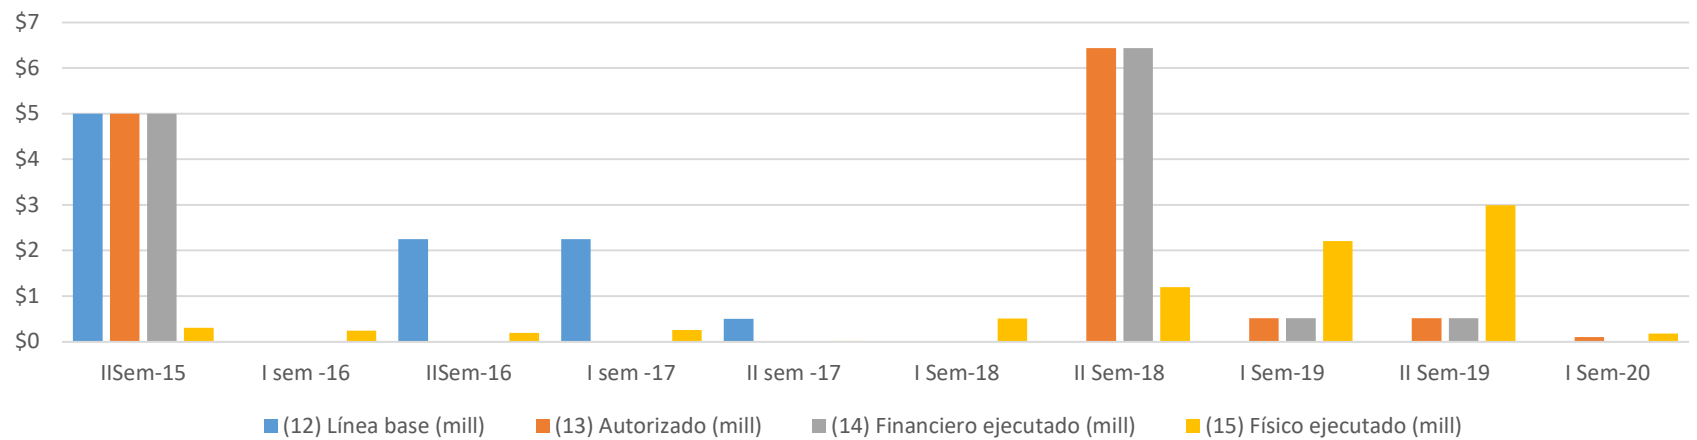

(4) Estado del proyecto:

(1) Fecha informe: 18/03/2020

Periodo que reporta: al 29 de febrero de 2020

(3) Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Escala de tiempo del

Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio MDA


Orden de suspensión

Orden de Reiniciar Ruta crítica

Fin del Periodo Notificación Defectos

Fin Ejecución

Fin MDA



Fin de Construcción de Puente

Ruta crítica

día de Hoy

Ruta Crítica del proyecto

(4) Estado del proyecto:

(1) Fecha informe: 18/03/2020

Periodo que reporta: al 29 de febrero de 2020

(3) Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
Orden de Servicio No.1. Inicio de Labores	0	Se emite la Orden de Iniciar Labores	NO	No Aplica	Inicio de Labores a partir del 01 de junio del 2015
Orden de Suspensión. No.2 del 26 de setiembre de 2017	11,67 meses	Se vencía el plazo del MdA sin contar con refrendo de CGR	NO		Sin efecto a partir de 17 de setiembre de 2019
Orden de Servicio No.3- Reinicio del 05 de setiembre de 2018	0	Ajuste en plazo de etapa constructiva 12 meses e inclusión de 12 meses para periodo de notificación de defectos	NO	Inclusión de Partida de contingencia, Facilidades fronterizas temporales, Gerenciamiento de UNOPS y ajuste al costo de la fase de ejecución.	Vigente: vence el 15 de setiembre de 2020

(4) Estado del proyecto:

(1) Fecha informe: 18/03/2020

Periodo que reporta: al 29 de febrero de 2020

(3) Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”



UNIDAD EJECUTORA PUENTE BINACIONAL RÍO SIXAOLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO AL 29 DE FEBRERO DE 2020



(4) Estado del proyecto:
