
Unidad Ejecutora RN32 Etapa: Construcción Fecha informe: 14 de febrero de 2024. Periodo que reporta: Enero 2024. Aprobado por: Ing. Greivin Jiménez Esquivel



	Orden de Inicio	20-no		
PLAZO	Plazo contractual (PC)	1049 días		
	Eventos compens. (EC)	1258	días	96%
	Plazo por suspensión (PS	0	días	
	Plazos OM (POM)	0	días	
	Plazo total (PC+EC+POM	1049	días	
	Última suspensión	N.A.		
	Plazo utilizado	1005	días	%
	Fecha de Finalización	15-mar-24		Avan.

COSTO	Monto de oferta (MO)	\$ 451.63		
	Orden Modificación (OM)	\$ -	87%	
	Reajustes (R)	\$ -	07 /6	
	Monto total (MO+OM+R)	\$ 451.63		
	Financiero Ejec.	\$ 393.95	%	
	Pendiente de pago (PP)	\$ 8.18	Ejec.	

Fuente Financiamier	Costa Rica/China
Contratista/Superviso	CHEC

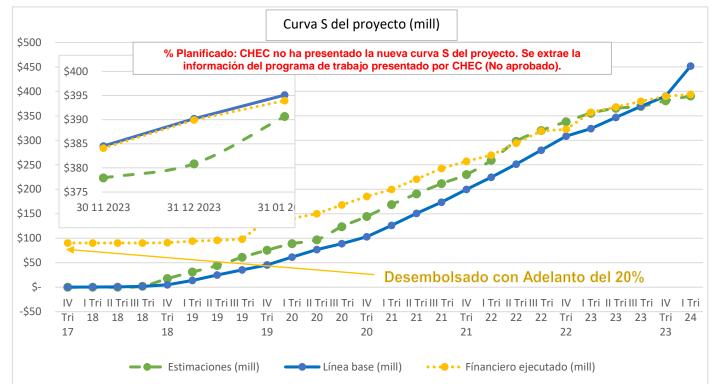

## Fotografía

## **Consideraciones relevantes**

Construcción carretera

Mediante O.S. No. 16 de CHEC, se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 15 de marzo de 2024 por eventos compensables al Contratista. Sólo se va a realizar en análisis de valor ganado en ésta línea ya que es la rehabilitación y construcción de obra que es una de las estapas más fuertes del proyecto y se está ejecutando en estos momentos.

