

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 65


MES: ENERO 2024






OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$44,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$45,955,507.00	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 16)	15 de marzo de 2024
Reclamos	\$24,583,915.64	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos)	\$580,132,809.70		

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

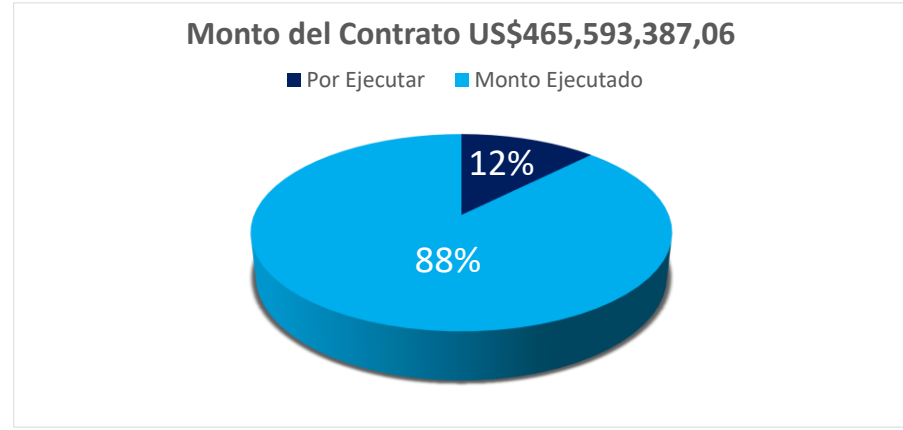

AVANCE FÍSICO

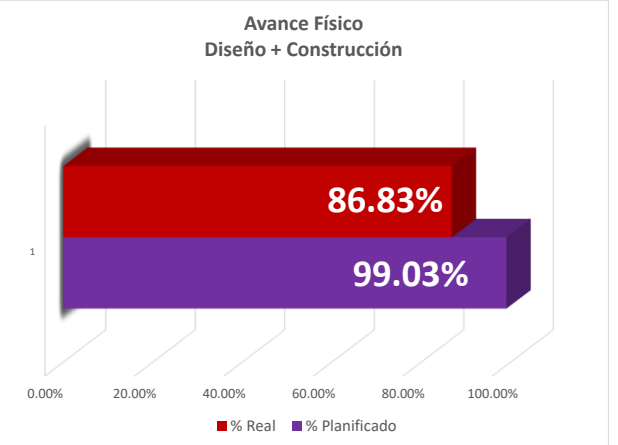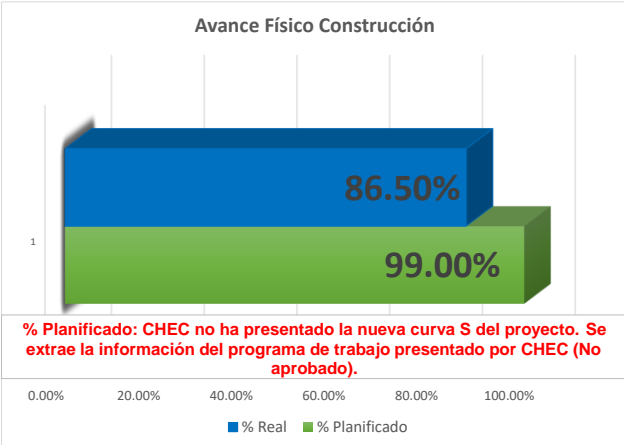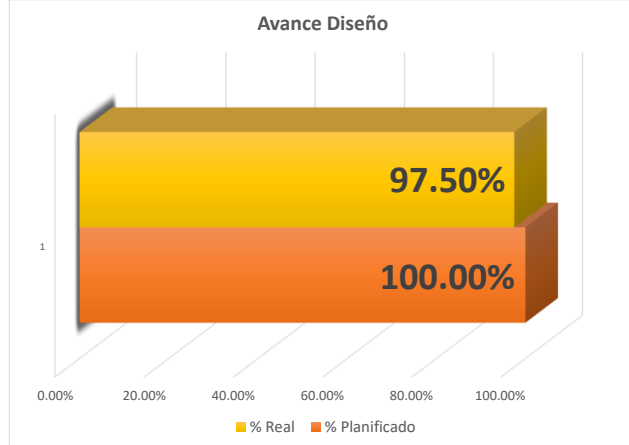

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 65

MES: ENERO 2024



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

EXPROPIACIONES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Expedientes Efectivos entregados al DABI (A)	576
Expedientes/planos por entregar en Gestión Técnica (B)	4
TOTAL EXPEDIENTES EFECTIVOS (A+B)	580
Expedientes con desestimiento / archivados (C)	68
TOTAL EXPEDIENTES (A+B+C)	648
TOTAL expedientes entregados al DABI (A+C)	644
Expedientes Efectivos Terminados (EPE/Inscritas) (D)	315
Expedientes efectivos en trámite (A+B-D)	265
