




**Avance del proyecto**  
**“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”**

**Junio 2024**

Km 49+650, Intercambio Río Frío, entronque con la RN 4

**Unidad Ejecutora RN 32**

# Ubicación del Proyecto

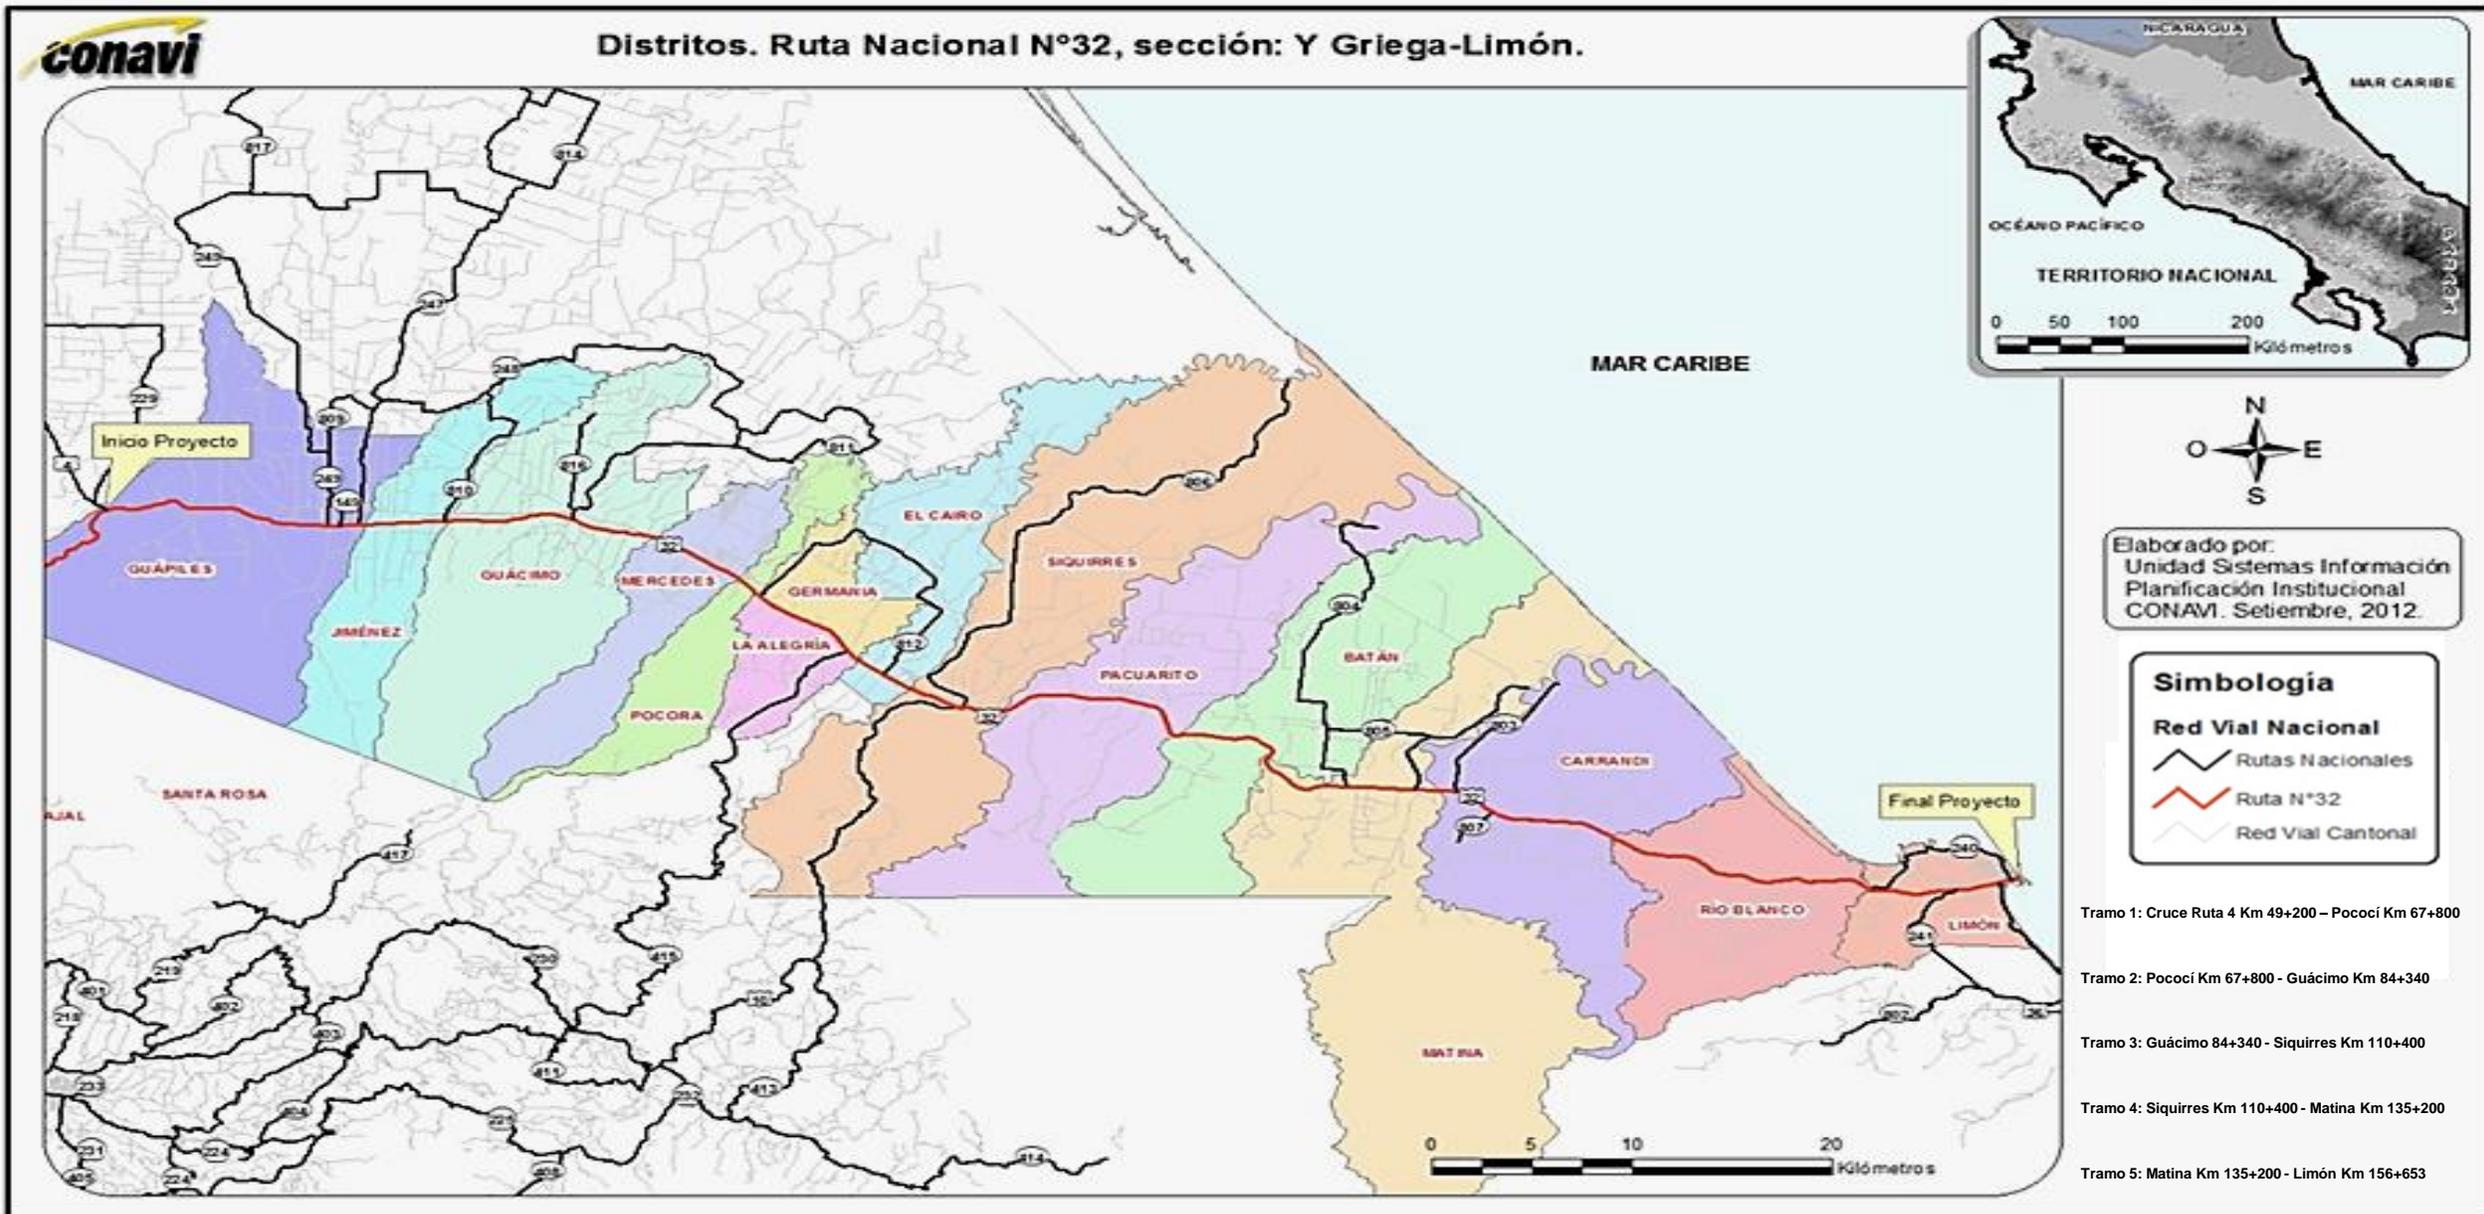

Elaborado por:  
 Unidad Sistemas Información  
 Planificación Institucional  
 CONAVI. Setiembre, 2012.

# Alcance del Proyecto

Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.


# Avance en los compromisos de la Administración

Km 62+850, IC Guáples, entronque con la RN 247



# Escala de Tiempo del Proyecto

## Escala de tiempo del proyecto

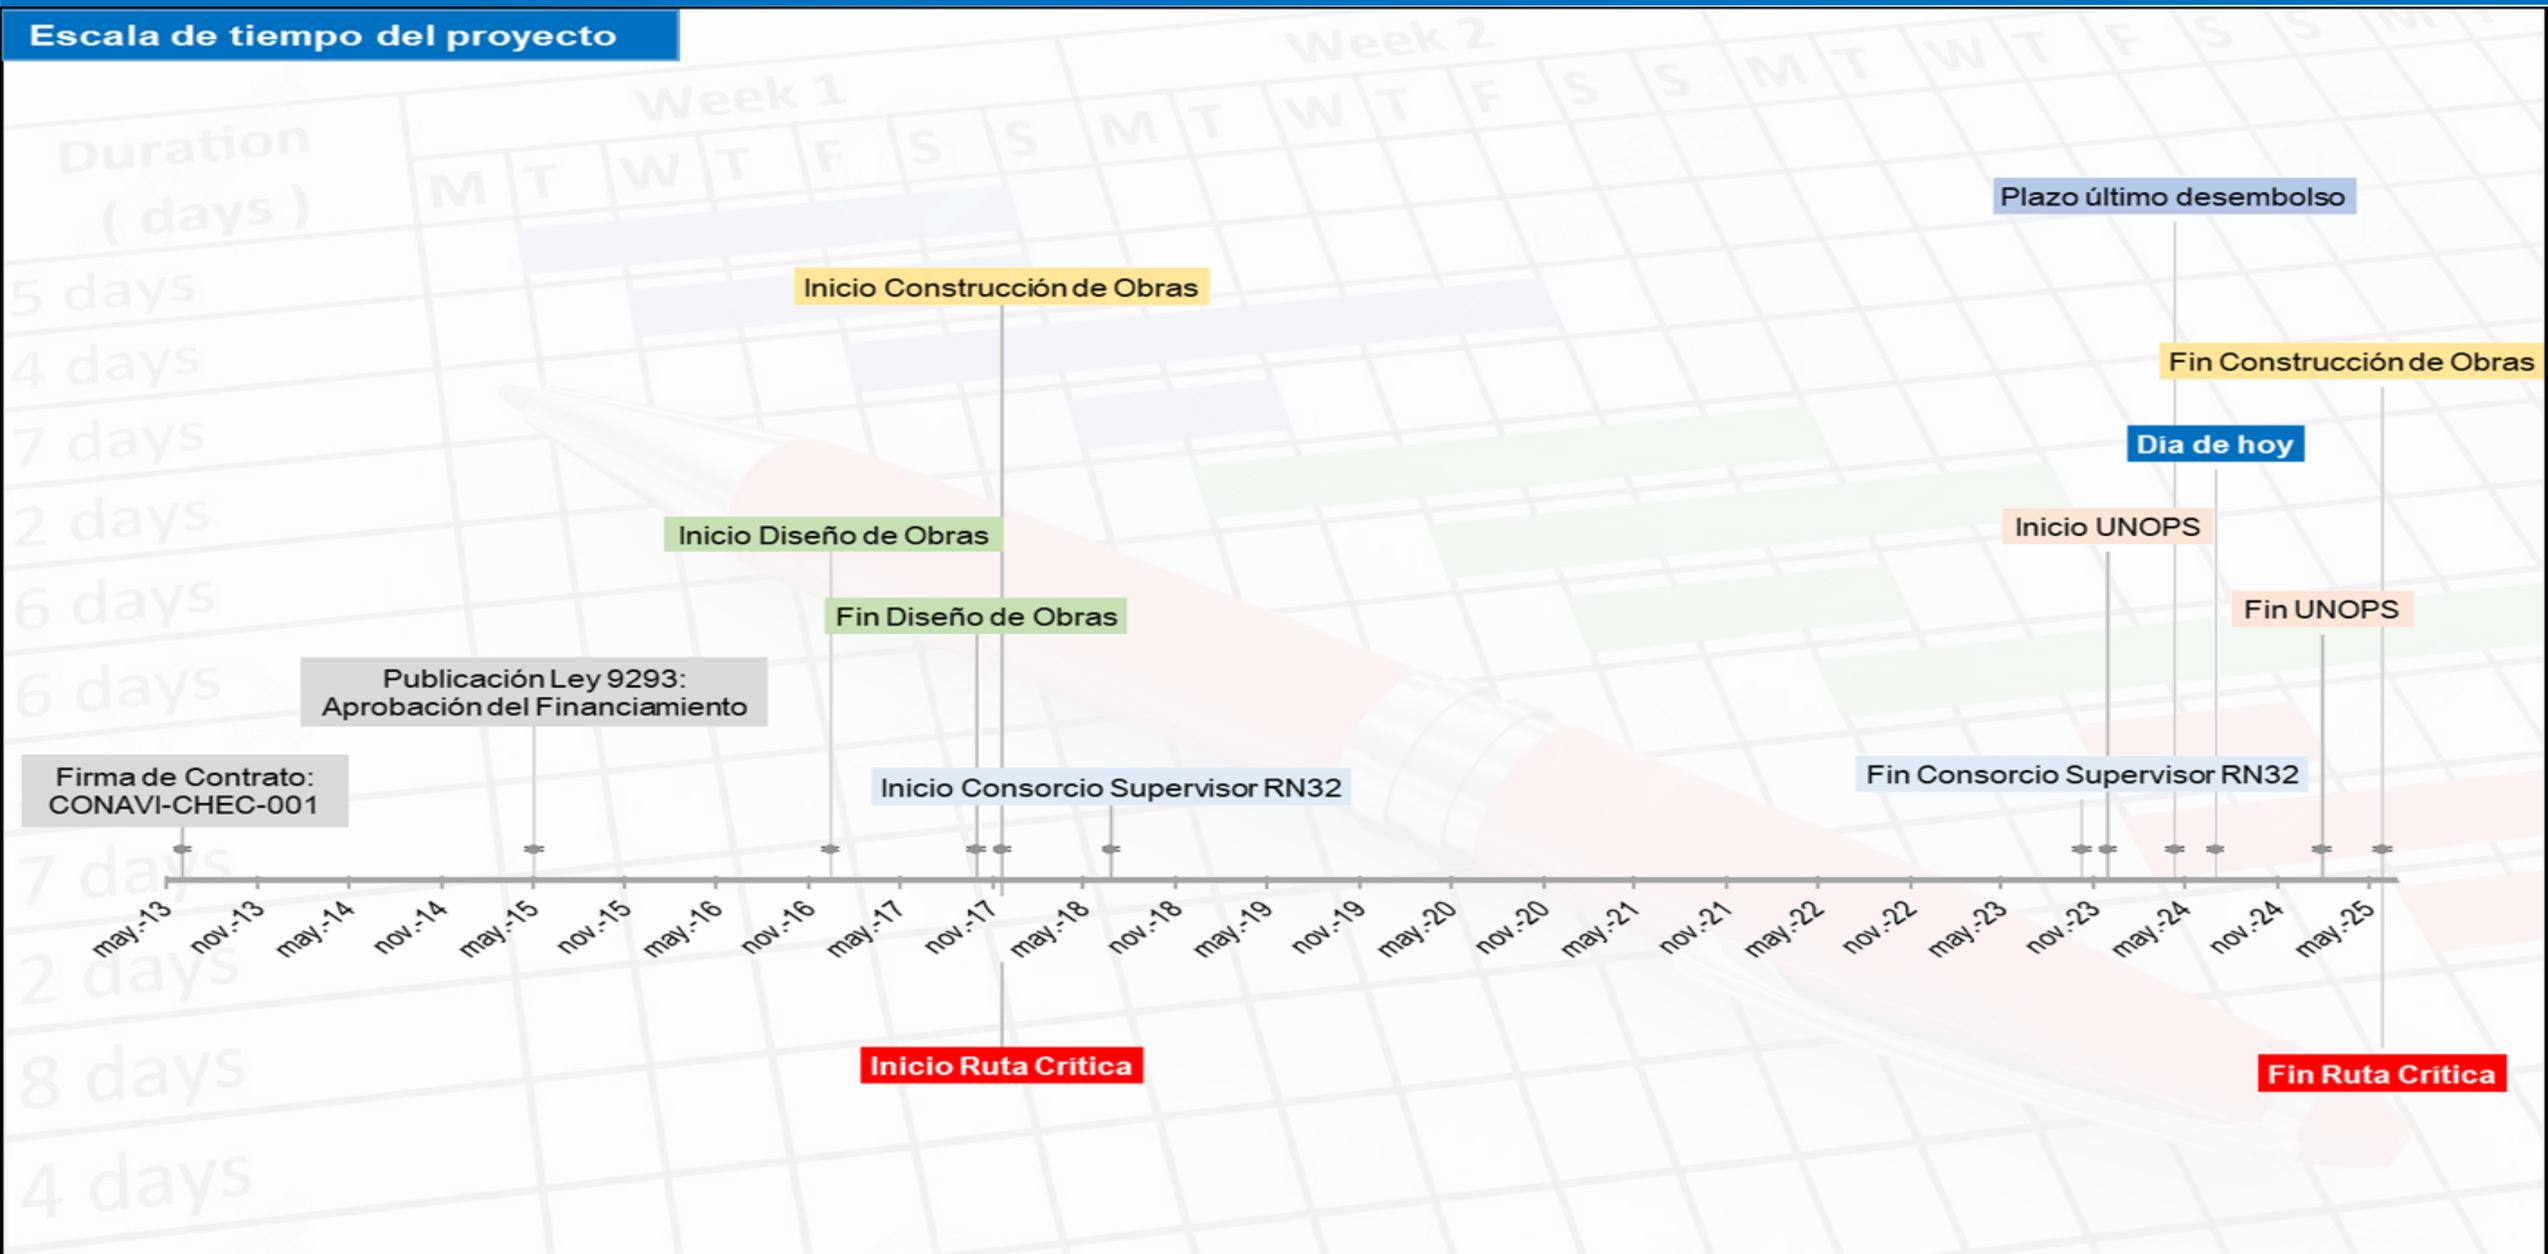


# Información Financiera del Proyecto

Préstamo Concesional Yuanes	¥ 628,000,000.00
Préstamo Comprador de Exportación	\$296,000,000.00
Contrapartida Nacional	\$69,839,008.07
<b>Contrato de Préstamo</b>	<b>\$465,593,387.07</b>
Contrapartida Nacional Adicional (Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)	\$89,955,507.00
Reclamos	\$24,583,915.64
<b>Inversión Total del Proyecto</b>	<b>\$580,132,809.56</b>



EMPRÉSTITO EXIMBANK

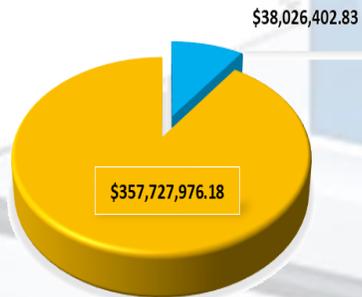

■ Disponible ■ Ejecutado

CONTRAPARTIDA




■ Disponible ■ Ejecutado

CONTRAPARTIDA ADICIONAL



■ Disponible ■ Ejecutado

RECLAMOS

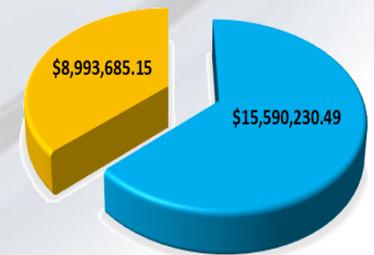


■ Disponible ■ Ejecutado

# Información del Plazo y Costo del Proyecto

PLAZO	Orden de Inicio	20-nov-17	88%
	Plazo contractual (PC)	1049 días	
	Eventos compens. (EC)	1697 días	
	Plazo por suspensión (PS)	0 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	2746 días	
	Última suspensión	N.A.	
	Plazo utilizado	717 días	%
	Fecha de Finalización	28-may-25	Avan.

COSTO	Monto de oferta (MO)	\$ 451.63	90%
	Orden Modificación (OM)	\$ -	
	Reajustes (R)	\$ -	
	Monto total (MO+OM+R)	\$ 451.63	
	Financiero Ejec.	\$ 407.31	%
	Pendiente de pago (PP)	\$ -	Ejec.


Fuente Financiamier	Costa Rica/China
Contratista/Supervis	CHEC

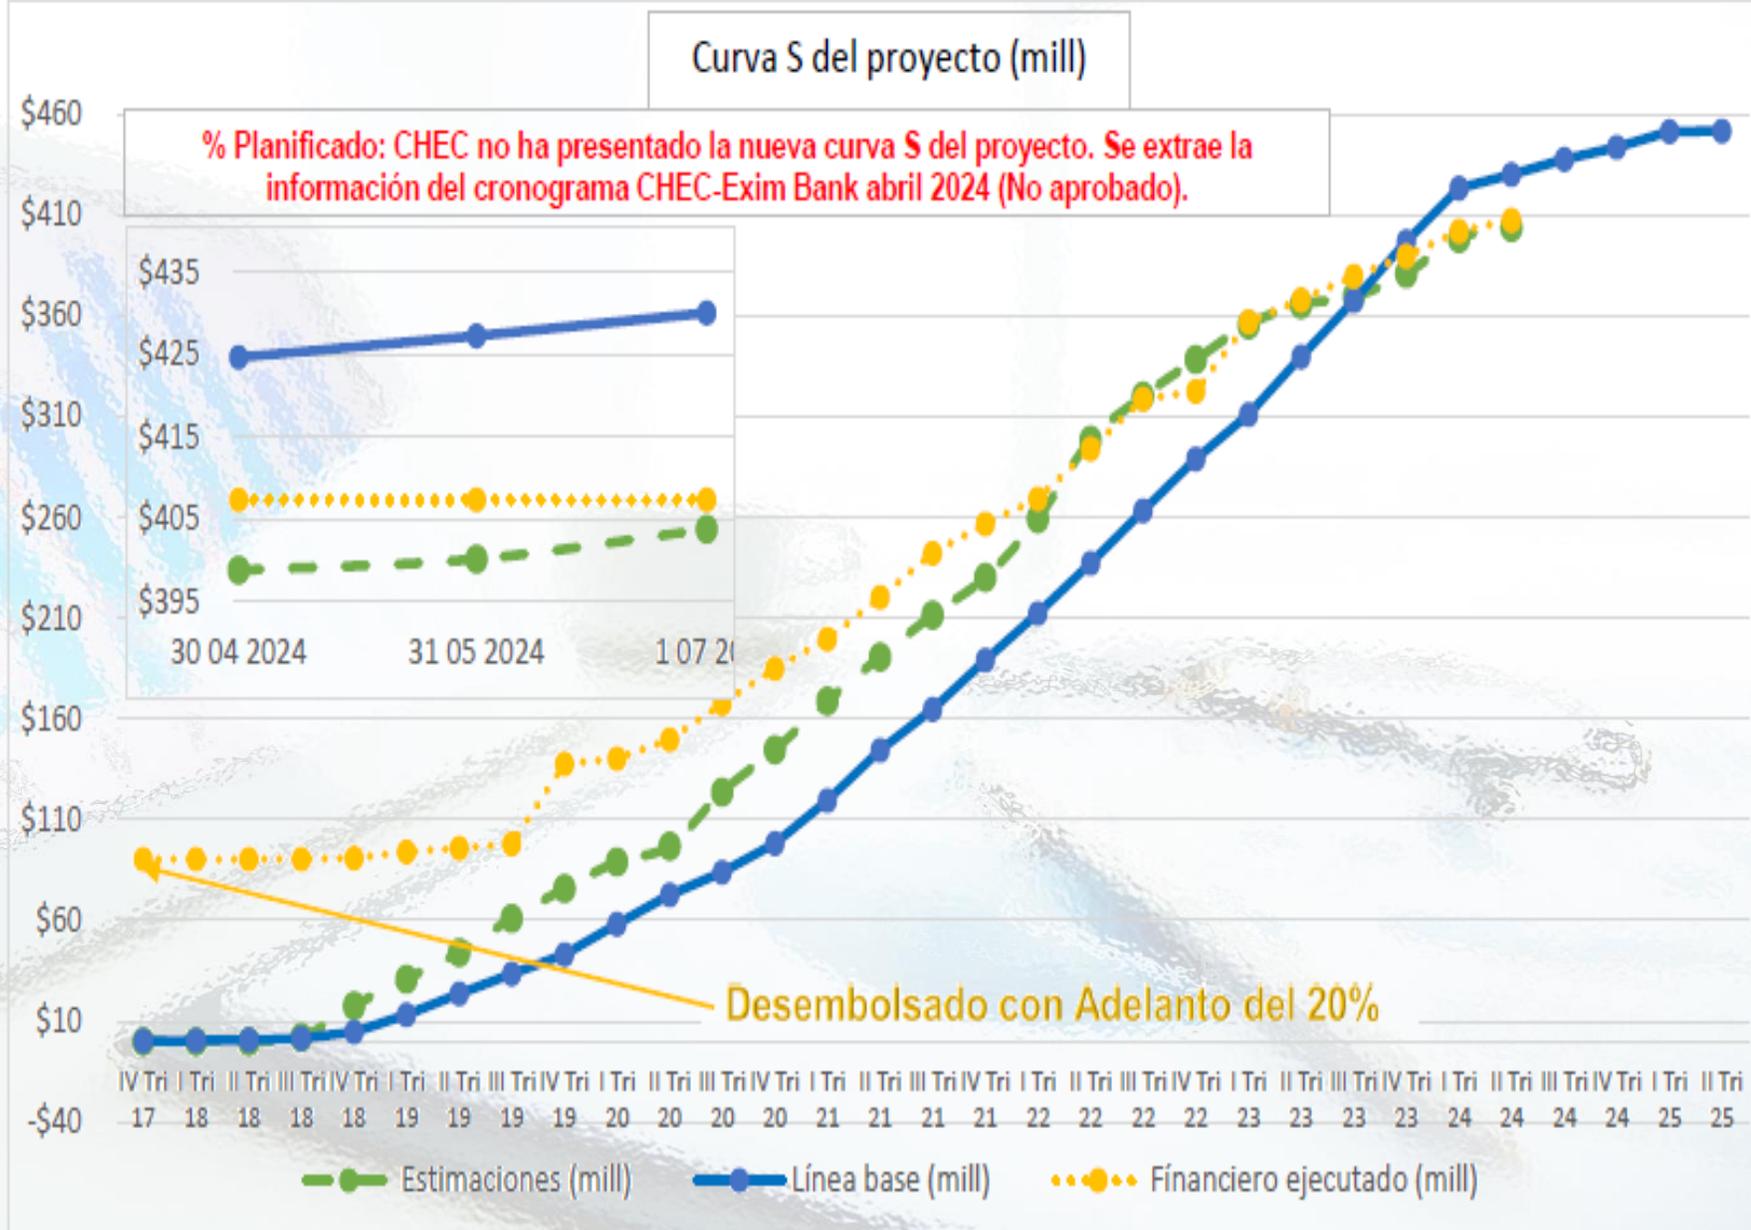

# Avance financiero y Físico del Proyecto


## Avance físico

### Avance Diseño

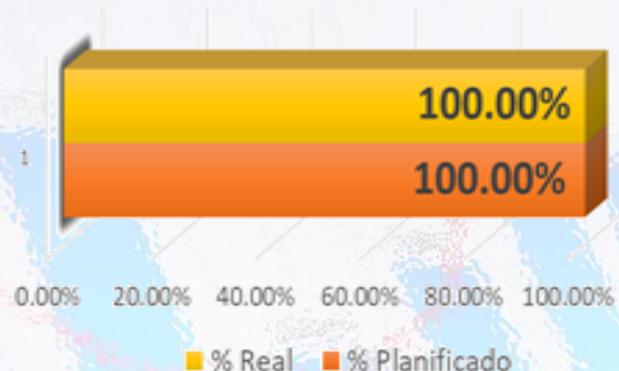


### Avance Físico Construcción

% Planificado: CHEC no ha presentado la nueva curva S del proyecto. Se extrae la información del cronograma CHEC-Exim Bank abril 2024 (No aprobado).

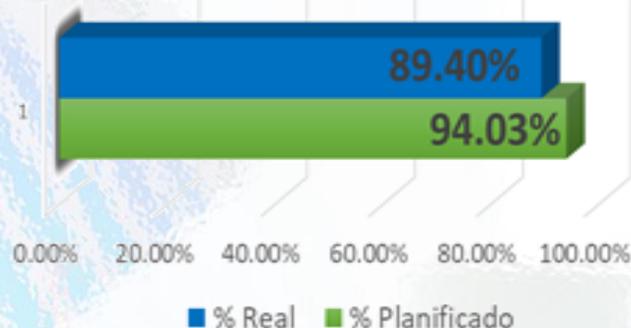

### Avance Físico Diseño + Construcción

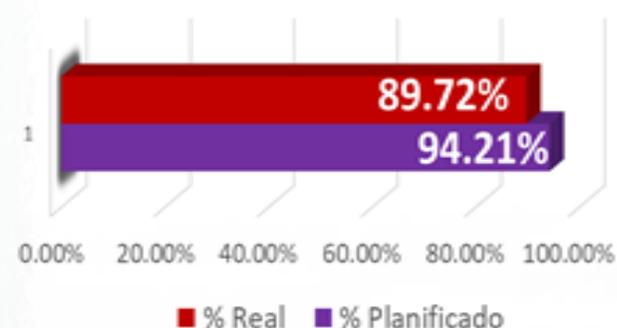


## Avance financiero

### Avance Financiero Diseño



### Avance Financiero Construcción

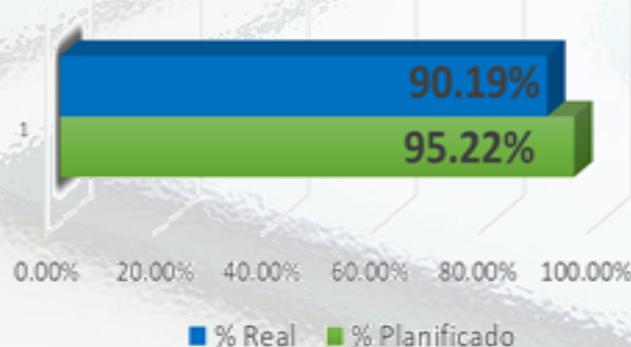


### Avance Financiero Diseño + Construcción

El % real de avance financiero de diseño y construcción incluye el monto del desembolso con adelanto del 20% que se le pagó a CHEC al iniciar el proyecto.




# Resumen estado de (UNOPS):

## Expropiaciones

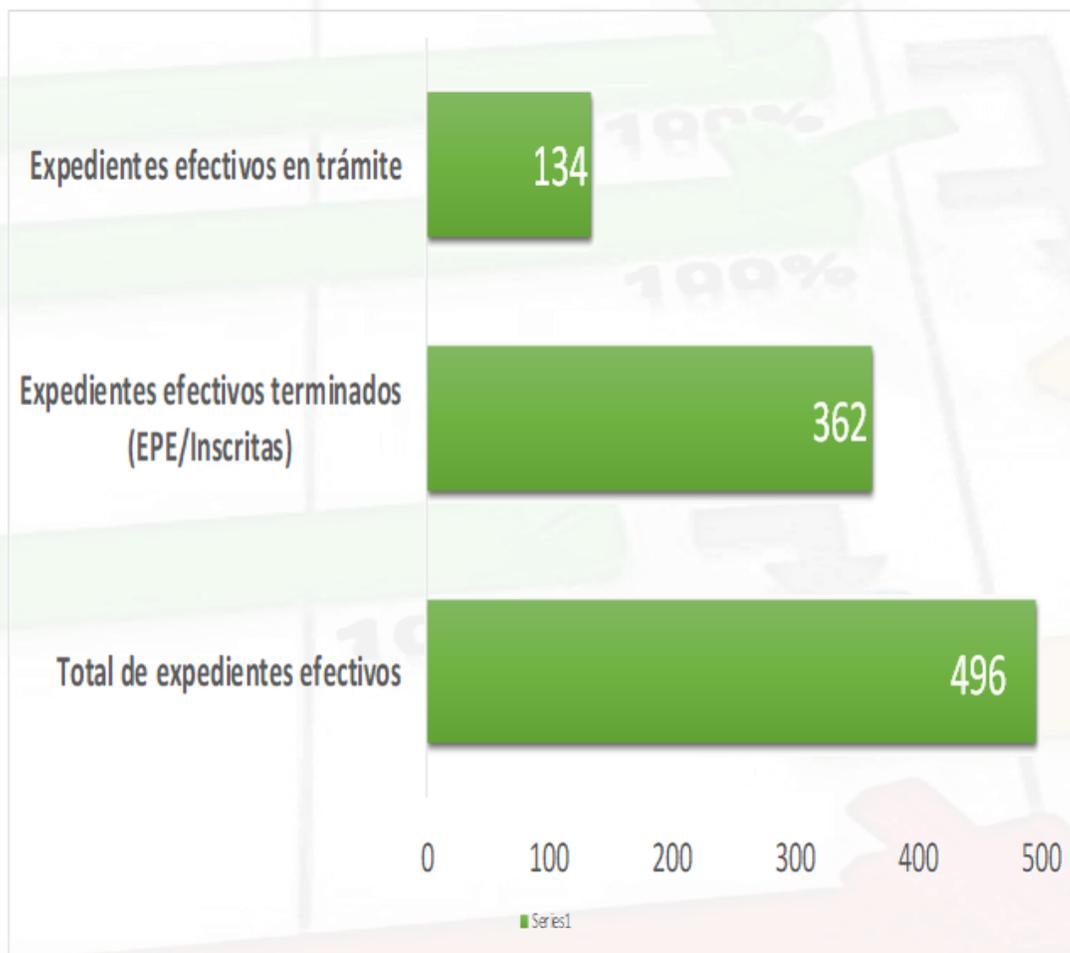

## Relocalización de Servicios Públicos

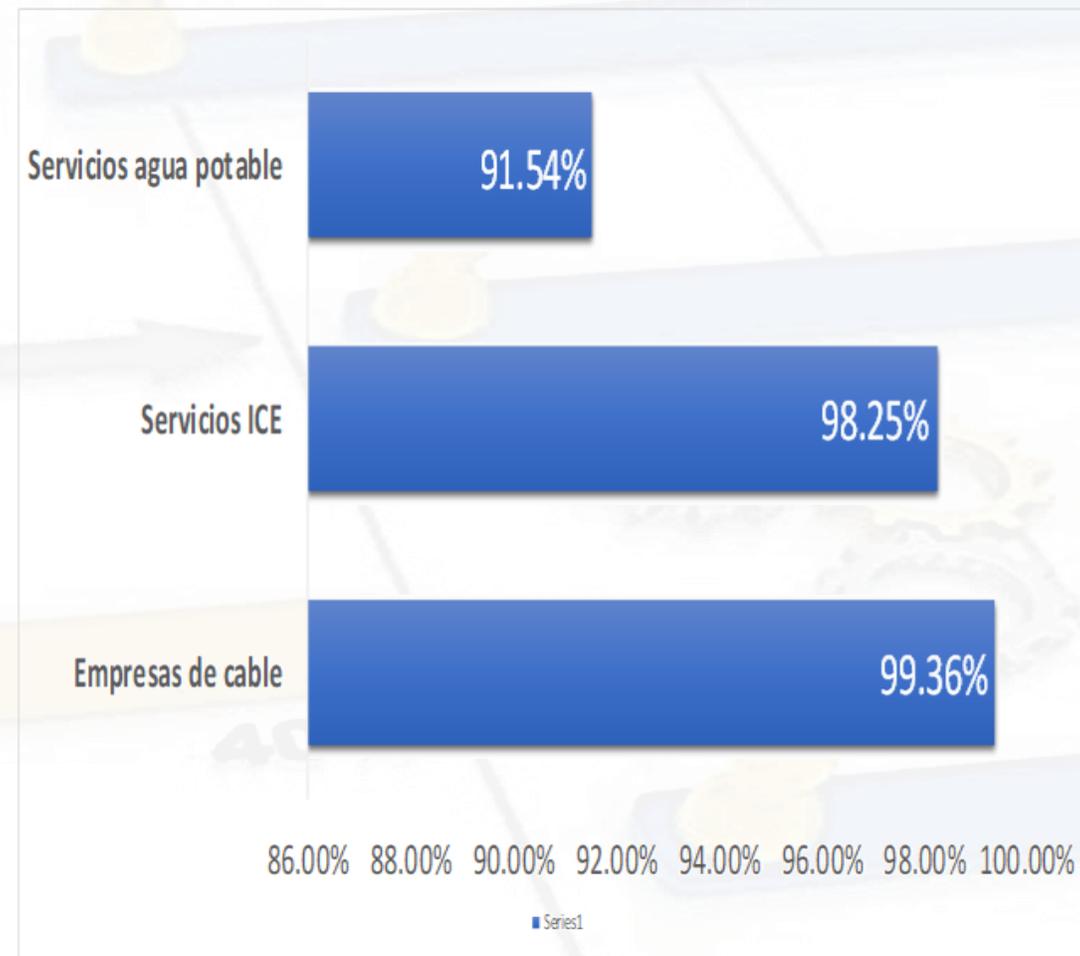


La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin interrupción mientras se realiza el trámite de adjudicación.

# Avance del Proyecto

# Control de avance construcción 4 carriles

Proyecto: Ruta 32  
Control de Avance para la construcción de 4 carriles


## Avance físico construcción: 89.40% (junio 2024)

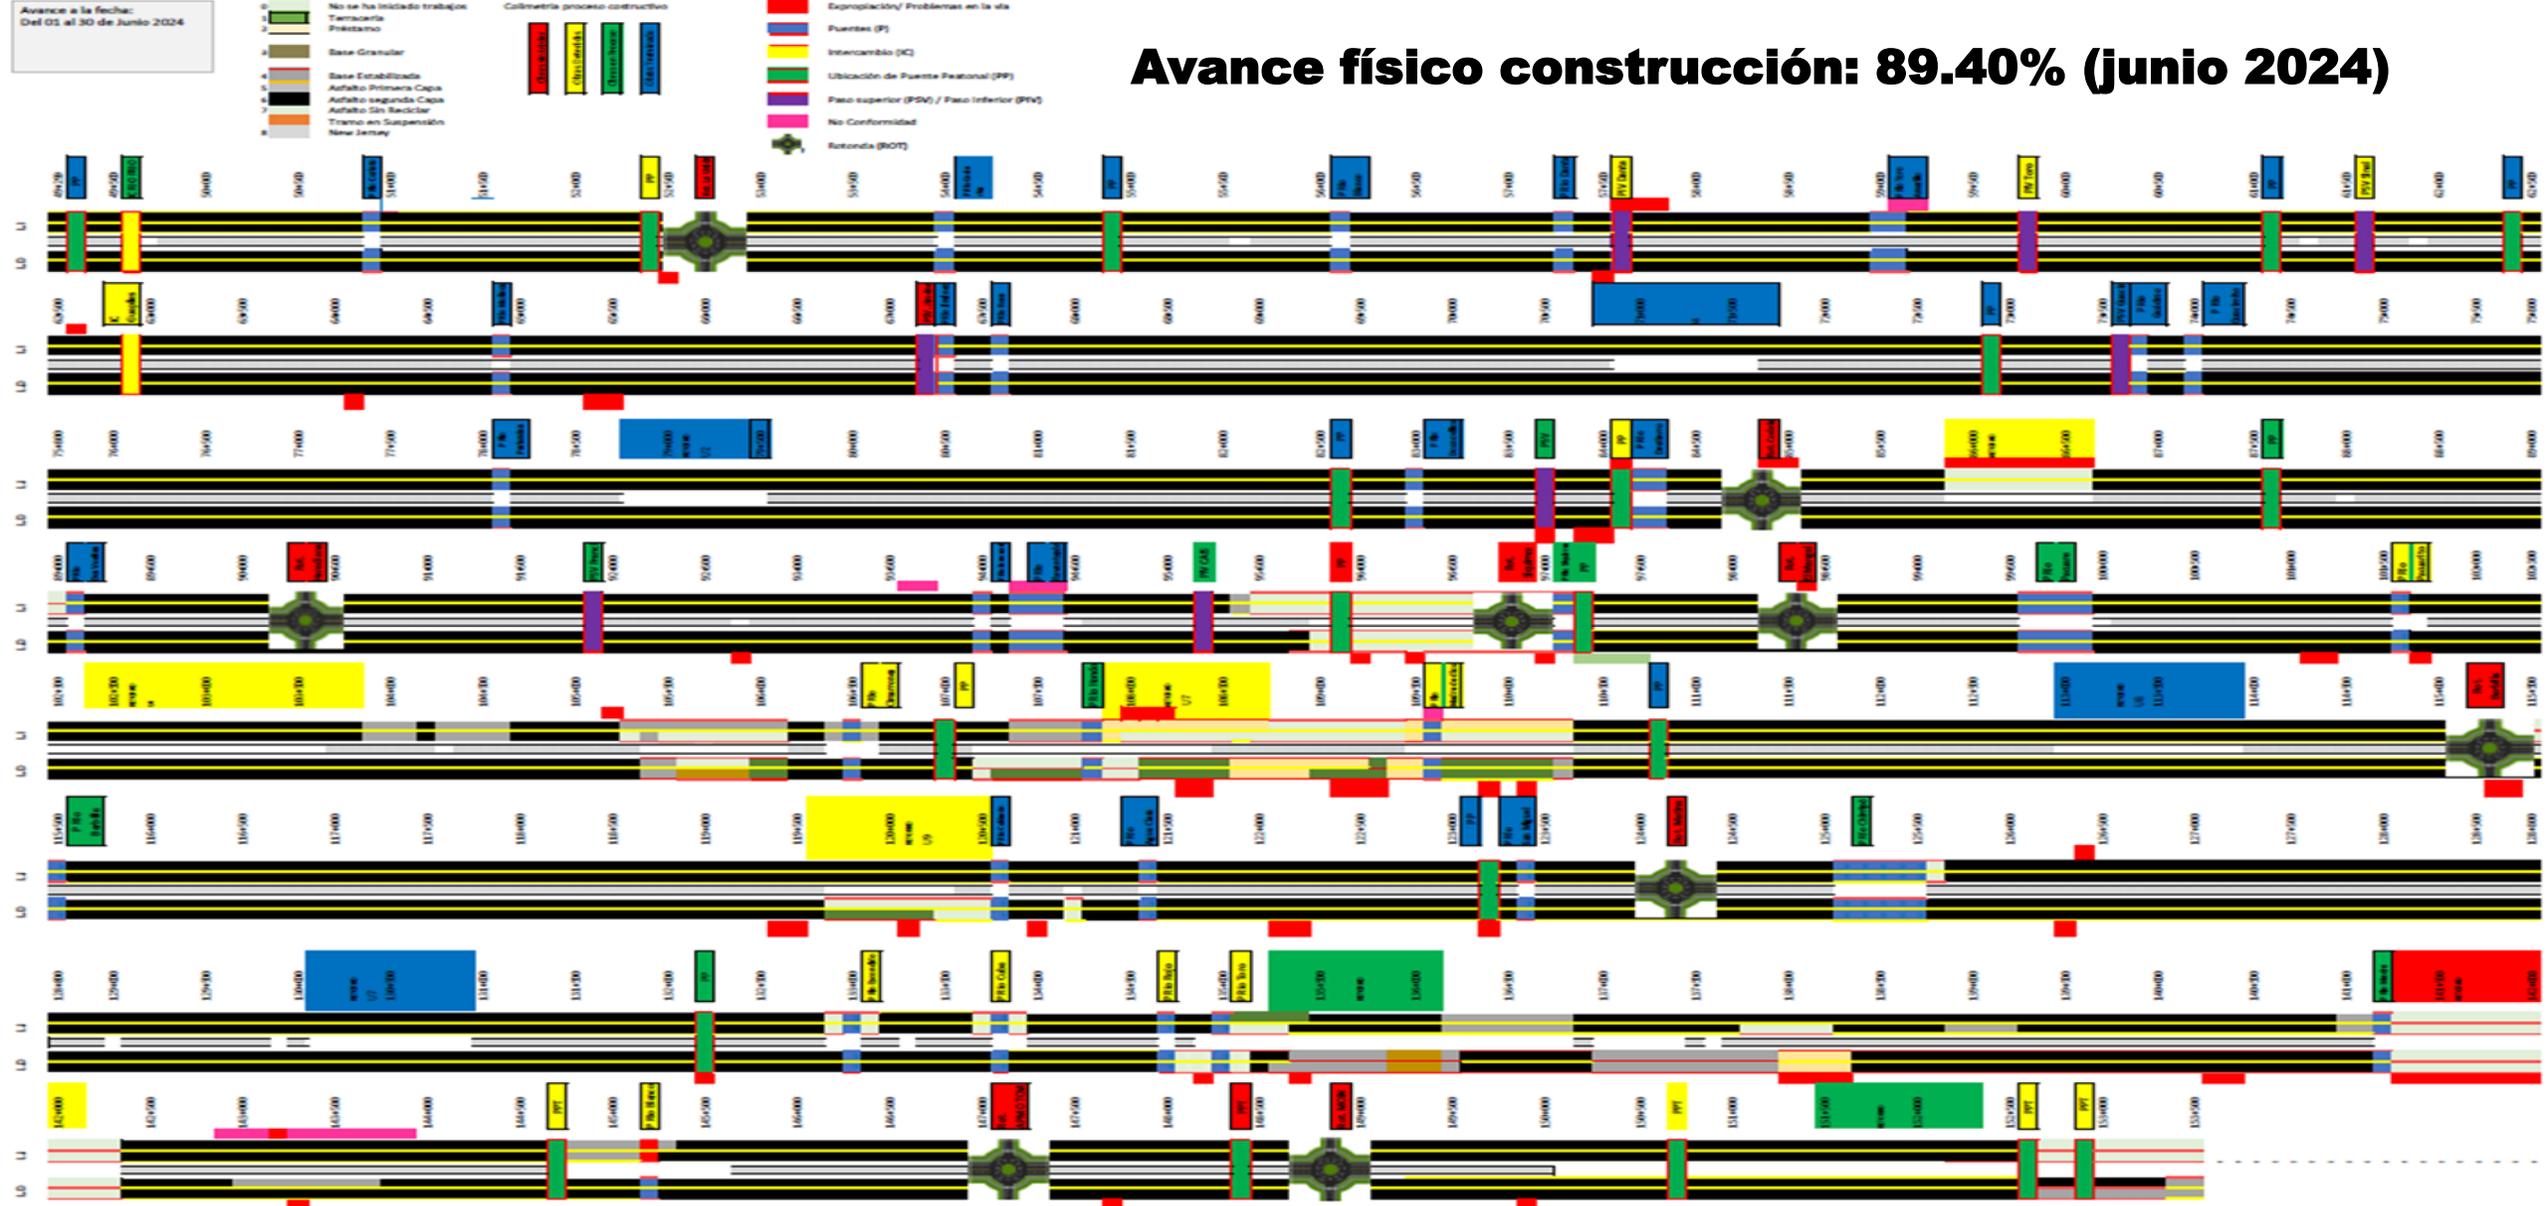

# Gestión de interesados

# Resumen estado Gestión Social (UNOPS)

Para el mes de junio se atendieron un total de 68 consultas nuevas y se dio seguimiento a 93 consultas anteriores. El siguiente gráfico describe el estado de las consultas.

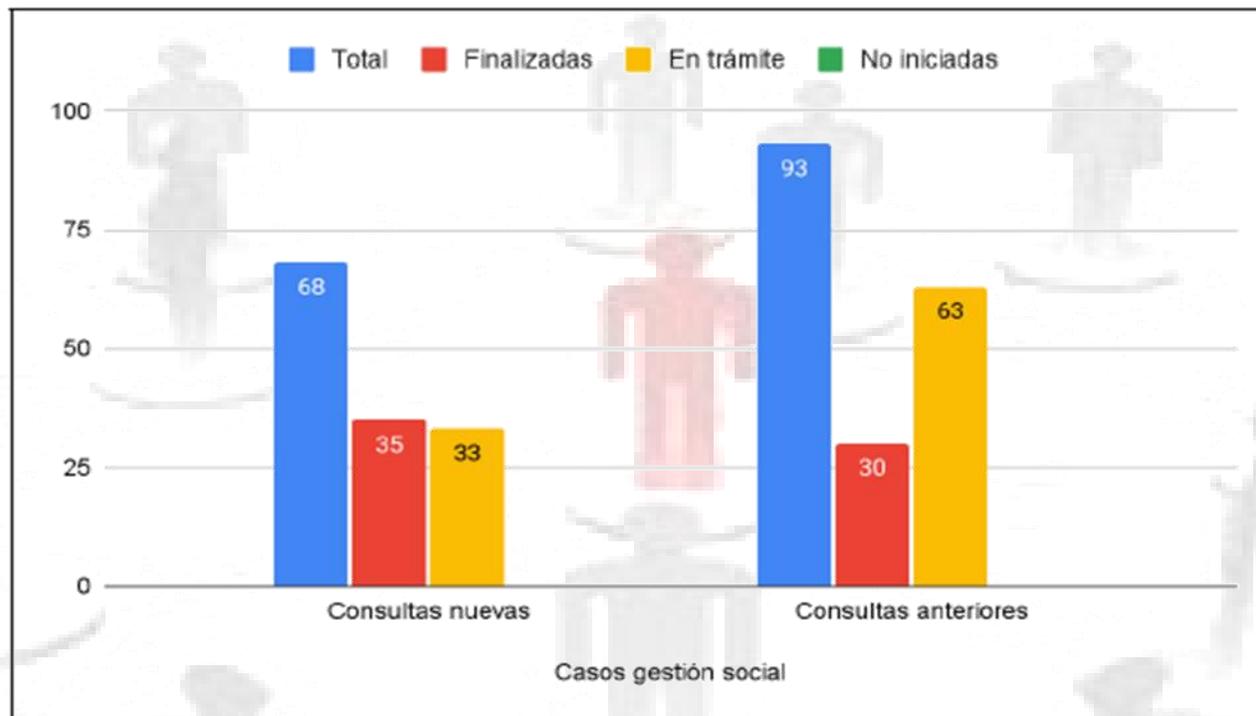

La siguiente tabla describe la distribución por cantón de las consultas.

Cuadro 8. Distribución por cantón de las consultas					
ID	Cantón	Casos abordados	No iniciados	En trámite	Finalizados
1	Pococí	10	0	3	7
2	Guácimo	10	0	5	5
3	Siquirres	16	0	11	5
4	Matina	21	0	12	9
5	Limón	11	0	1	9



**¡Muchas gracias por su atención!**
