

30 de setiembre de 2016

**GCTT-01-16-0965**

**Ingeniero**  
**German Valverde González**  
**Director Ejecutivo a.i.**  
**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD**  
**S. O.**

REFERENCIA: Informe final de gestión por acogerme a jubilación a partir de esta fecha.

Estimado señor:

Mediante el oficio No. GRH-02-2016-1358 del 14 de setiembre de 2016, la Dirección de Gestión del Recurso Humano del CONAVI, me informó sobre los requisitos a cumplir debido a mi renuncia por jubilación, a más tardar el último día de labores. Entre ellos, se encuentra la presentación del Informe de Fin de Gestión, de acuerdo con la Resolución No. R-CO-61 de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 131 del 7 de julio de 2005, el cual presento en este acto.

Este informe cubre el período desde el 15 de abril de 2015 hasta el 30 de setiembre de 2016; debido a que durante el periodo comprendido entre febrero y el 14 de abril de 2015, por disposición de la Dirección General de Servicio Civil, fui suspendido mientras se tramitaban gestiones de despido en mi contra por parte del CONAVI.

**A. Labor sustantiva de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes.**

La Gerencia de Contratación de Vías y Puentes está formada por: la Dirección de Contratación de Vías y Puentes, la Dirección de Diseño de Vías y Puentes y la Dirección de Costos de Vías y Puentes. Las funciones generales desempeñadas por cada Dirección se presentan a continuación; de más está indicar que hasta la fecha, fui responsable jerárquico de las personas que las realizan.

**Dirección de Contratación de Vías y Puentes.**

- Elaborar los carteles de licitación para proyectos de mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción, ampliación y construcción nueva de carreteras, puentes y otras obras viales; así como las consultorías de ingeniería de tránsito, planificación, ingeniería geotécnica, estudios hidrológicos, estudios ambientales y topografía.

- Evaluar las ofertas técnicas y establecer recomendaciones de adjudicación en procesos de licitación para diseño, supervisión, construcción, estudios geotécnicos y demarcación para carreteras, puentes, estaciones de peaje y de pesaje.
- Dar respuesta técnica a los recursos de objeción, revocatoria y apelación interpuestos por los oferentes para diferentes procesos licitatorios.
- Establecer las especificaciones técnicas más convenientes para la formulación de proyectos viales.
- Asistir a la reunión de preoferta, cuando así se requiera.
- Programar las contrataciones en coordinación con la Dirección de Proveeduría Institucional.
- Brindar asesoría en temas de contratación vial.
- Fungir como unidad supervisora en contrataciones de diseño y consultoría.
- Dotar al CONAVI de un banco de proyectos de inversión pública para etapas de diseño.

Dirección de Diseño de Vías y Puentes.

- Elaborar diseños menores de carreteras.
- Elaborar términos de referencia para diseño de obras viales.
- Realizar levantamientos topográficos menores.
- Revisar informes en los contratos para diseño de carreteras.
- Asesorar en términos de diseño vial y temas socio-ambientales.
- Revisar y actualizar diseños de pavimentos.
- Prestar servicios de regencia ambiental.
- Supervisar contratos de regencia ambiental.
- Realizar trámites ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

Dirección de Costos de Vías y Puentes.

- Administrar el Sistema de Control de Costos de Obras Viales.
- Elaborar presupuestos de obra.
- Elaborar análisis de razonabilidad de costos de las ofertas.
- Actualizar la información sobre precios de materiales, equipo, maquinaria, mano de obra y rendimientos.
- Suministrar porcentajes de reajuste para los renglones de pago de proyectos en ejecución.
- Atender reclamos de contratistas.
- Analizar costos para renglones de pago a incorporar mediante orden de modificación.
- Calcular los precios máximos para alquiler de equipo y maquinaria.

**B. Cambios en el entorno.**

En el período comprendido entre abril de 2015 y esta fecha, se dieron 2 (dos) cambios drásticos en la plataforma utilizada para la publicación de los procedimientos de contratación. En 2015, se pasó de los procedimientos tradicionales con presentación física de ofertas en papel a las ofertas digitales por medio de la plataforma Compr@red.

Luego, en abril de 2016, la Dirección de Proveeduría Institucional dejó de generar contrataciones mediante Compr@red y se empezó a utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Ambas transiciones significaron arduas labores de coordinación y revisión de los pliegos de condiciones con la Dirección de Proveeduría Institucional; así como la capacitación del personal. Esto generó algunos retrasos en la promoción de las contrataciones.

Por otro lado, debe comentarse que la Resolución No. R-DCA-199-2015 de la Contraloría General de la República, significó un cambio importante en el análisis de la razonabilidad de precios, al excluir las ofertas por incumplimiento de salarios mínimos o desglose de la mano de obra asociada a la maquinaria. Debido a que hubo muchas contrataciones con ofertas presentadas en fecha previa a dicha resolución, que pudieron haberse declarado infructuosas, con un alto desperdicio de los recursos institucionales que se habían destinado a su promoción, se generó un mecanismo excepcional para su revisión, el cual fue aprobado por la Dirección Ejecutiva, mediante oficio No. DIE 03-15-1385 del 20 de mayo de 2015; permitiéndose la conservación de un importante número de procedimientos.

Otro cambio experimentado en la revisión de las ofertas, se relaciona con los criterios legales sobre la obligatoriedad de que la maquinaria ofrecida por las empresas esté debidamente inscrita ante el Registro Nacional.

Los cambios en la revisión de ofertas relacionados con salarios mínimos, mano de obras y maquinaria han provocado que se tenga que destinar mayor cantidad de recurso humano al proceso. En razón de la limitada cantidad de personal disponible para la revisión de ofertas, en muchos casos no es posible cumplir los plazos establecidos por la Dirección de Proveeduría Institucional para la revisión de las ofertas y ha debido recurrirse a personal de las otras Direcciones que conforman esta Gerencia.


En materia de personal, es conveniente indicar que a pesar de que esta Gerencia se dotó del personal necesario, según estudio de cargas de trabajo realizado como parte de la reorganización institucional, decisiones de las autoridades superiores han propiciado que en los últimos 3 (tres) años, se pierda casi un tercio de los profesionales originales. Situación que no ha ido aparejada con una disminución de funciones, todo lo contrario, lo que provoca serios problemas de gestión y a largo plazo será insoportable.

**C. Estado de autoevaluación.**

El análisis del Sistema de Valoración de Riesgos Institucionales para el año 2014 muestra que la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes obtuvo un 69,27% (sesenta y nueve coma veintisiete por ciento) con un nivel “Moderado”. En comparación, en el año 2015 se obtuvo una calificación de 87,61% (ochenta y siete coma sesenta y un por ciento) con un nivel “Experto”.

Los resultados por componente funcional, se encuentran reflejados en el Gráfico No. 1. Se muestran claramente las mejoras en todos los componentes.

Gráfico No. 1. Valoración por componente ASCII de la Gerencia de Contratación en el año 2014.

**D. Acciones para control interno.**

Para el año 2015, se establecieron las siguientes acciones de mejora en cuanto a control interno:

1. Comunicar mediante un oficio a los funcionarios de esta Gerencia el Informe del SEVRI.
2. Comunicar y divulgar mediante un oficio los objetivos, metas y acciones programadas para el año 2016 a todo el personal de la Gerencia.
3. Mediante un comunicado dar a conocer a los funcionarios de esta Gerencia la misión, visión y código de ética institucional.
4. Promoción, en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información, de sistemas más flexibles.

5. Revisar los manuales de procedimientos que actualmente tiene esta Gerencia con el fin de determinar si requieren de una actualización.
6. Solicitar a la Contraloría de Servicios y Auditoría Interna, ambas del CONAVI y divulgar al personal de esta Gerencia, el proceso correspondiente para dar trámite a las denuncias que se presenten por actos ilícitos contra la Hacienda Pública.

#### **E. Logros alcanzados.**

Para la descripción de los logros alcanzados en las contrataciones, estas se dividen en las categorías en las cuales se presentan a la Unidad de Planificación Institucional en los informes mensuales de gestión:

1. Conservación de vías.
2. Diseños y otras consultorías.
3. Demarcación.
4. Mejoramiento o construcción de carreteras.
5. Construcción o suministro de puentes.

Se aclara que las licitaciones de diseño y construcción, se incluyen en la categoría de "Diseños y otras consultorías".


#### **Conservación de vías. Contrataciones pendientes de revisión de ofertas en abril de 2015.**

Al 15 de abril de 2016, se tenían 28 (veintiocho) contrataciones para conservación de vías cuyo proceso de evaluación de ofertas estaba inconcluso. En 21 (veintiún) casos, la adjudicación se veía afectada por la Resolución No. R-DCA-199-2015 de la Contraloría General de la República, de manera que el proceso tendría que declararse infructuoso por incumplimiento de los salarios mínimos o el desglose de la mano de obra (operadores de maquinaria).

Ante ello, se propuso un mecanismo para el análisis de las ofertas en aquellos casos donde todos los oferentes incumplieran lo establecido en la Resolución No. R-DCA-199-2015. Tal propuesta fue aprobada por la Dirección Ejecutiva mediante oficio No. DIE 03-15-1385 del 20 de mayo de 2015. Gracias a ello, para la mayoría de las contrataciones pudo establecerse recomendación para su adjudicación.

En el Gráfico No. 2 se presenta la situación actual por distribución porcentual de las 28 (veintiocho) contrataciones antes citadas. En 17 (diecisiete) casos se logró la adjudicación, 6 (seis) resultaron infructuosas y 1 (una) desierta. Se tienen 4 (cuatro) contrataciones que todavía no se han adjudicado, pese a contar con los análisis técnicos y de razonabilidad de costos.

Gráfico No. 2. Estado de las contrataciones para conservación de vías que estaban pendientes de revisión de ofertas en abril de 2015.

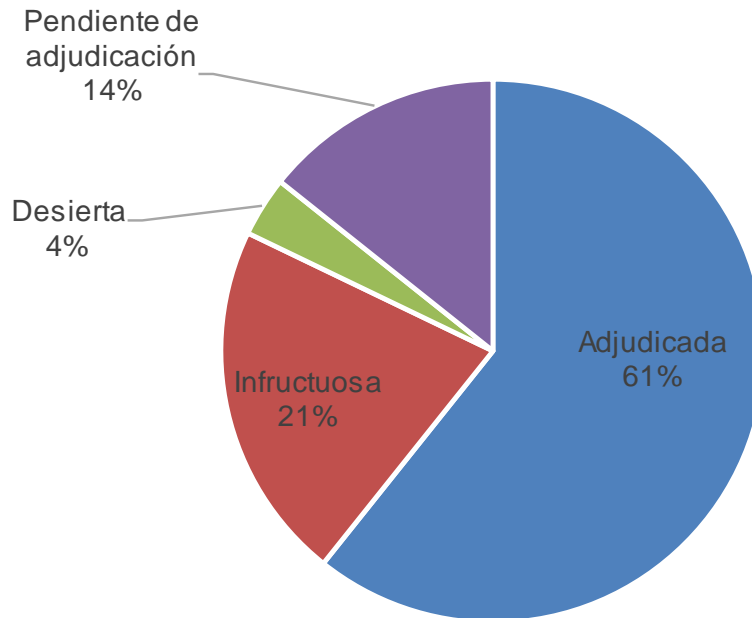


#### Conservación de vías. Contrataciones publicadas en 2015.

Durante los primeros 3 (tres) meses del año 2015, no había sido publicado ni un solo cartel de licitación. En contraste, durante el resto del año, se generaron 103 (ciento tres) contrataciones que fueron publicadas y alcanzaron la etapa de apertura de ofertas. Estas se distribuyen en 15 (quince) contrataciones directas, 70 (setenta) licitaciones abreviadas, 3 (tres) licitaciones públicas y 15 (quince) contrataciones por emergencia para mitigación de polvo.

En 1 (un) caso no se recibieron ofertas, mientras que en 102 (ciento dos) ocasiones se procedió oportunamente con la emisión de los informes técnico y de razonabilidad de precios. La mediana del tiempo transcurrido desde la apertura de ofertas hasta la versión final del último de los informes es de 42 (cuarenta y dos) días naturales.

En el Gráfico No. 3 se presenta la situación actual por distribución porcentual de las 103 (ciento tres) contrataciones antes citadas. En 76 (setenta y seis) casos se concluyó la contratación, en 9 (nueve) están adjudicadas, 5 (cinco) resultaron infructuosas y 13 (trece) están pendientes de adjudicación.

Gráfico No. 3. Estado de las contrataciones para conservación de vías generadas durante el año 2015.

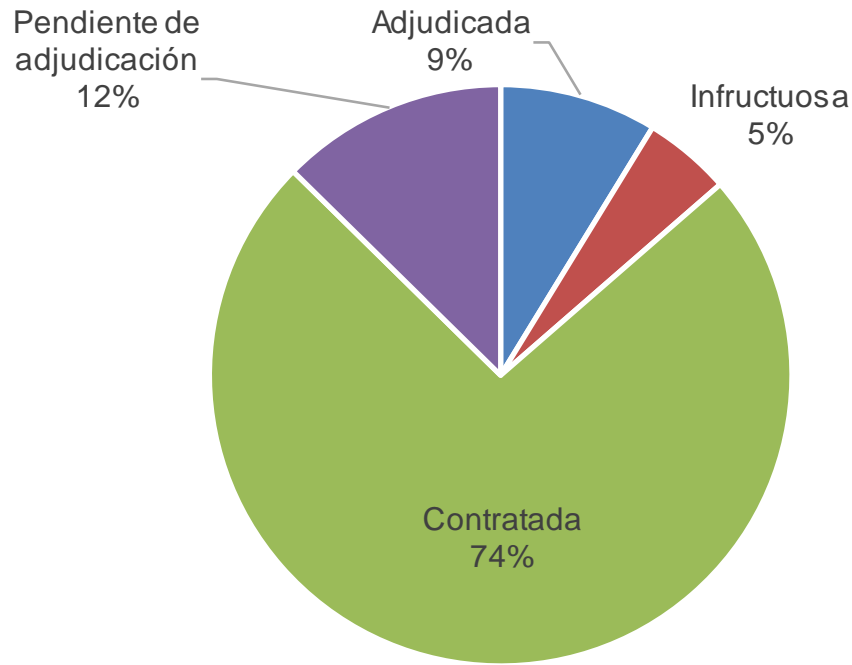


Conservación de vías. Contrataciones publicadas en 2016.

Durante el año 2016, la publicación de carteles se vio perjudicada por el cambio de plataforma de Compr@red a SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas), lo cual ha repercutido en menor cantidad de carteles. Hasta el momento, se han publicado 26 (veintiséis) contrataciones.

En el Gráfico No. 4 se presenta la situación actual por distribución porcentual de las contrataciones del año 2016. En 11 (once) procesos se está en evaluación de ofertas, en 4 (cuatro) casos se evaluaron las ofertas, pero se está pendiente de adjudicación; 4 (cuatro) licitaciones están adjudicadas, 6 (seis) están pendientes de apertura y en 1 (un) caso la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes solicitó dejar sin efecto la contratación.

Se tienen otros 6 (seis) procedimientos con la documentación preparada, pero que se encuentran en trámites previos a su publicación. Tales procesos corresponden a las Rutas Nacionales Nos. 250, 604, 734, 744, 745 y 751.

Gráfico No. 4. Estado de las contrataciones para conservación de vías publicadas durante el año 2016.

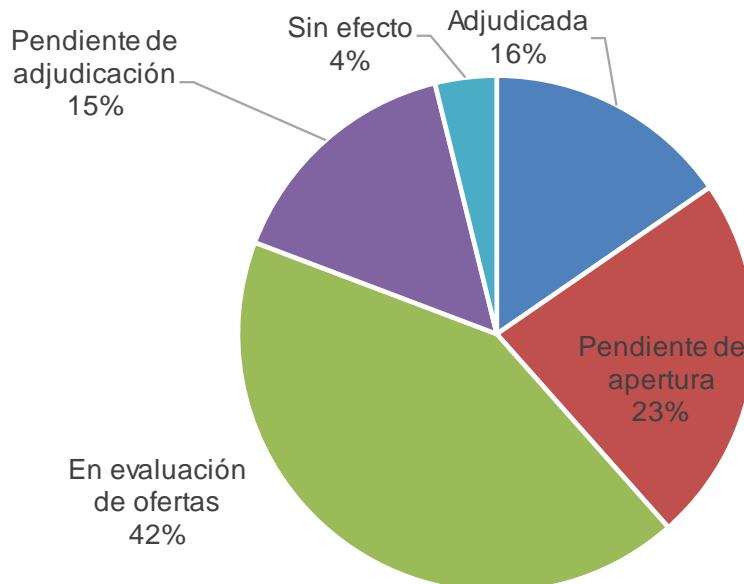

Debe destacarse que en 5 (cinco) casos para los cuales no se han recibido ofertas, se está a la espera de que se resuelvan los recursos de objeción presentados por Constructora RAASA S.A.

Además, en 2 (dos) licitaciones en evaluación de ofertas se está a la espera de criterio de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos sobre la vigencia incompleta de la oferta.

### Demarcación.

Se publicaron 2 (dos) contrataciones en el periodo incluido en este informe: una contratación directa y una licitación abreviada. Ambas ya finalizaron su proceso de contratación.

### Mejoramiento o construcción de carreteras.

Durante 2015 se publicó una licitación para mejoramiento de alcantarillado pluvial, la cual todavía se encuentra en revisión de ofertas debido a la necesidad de solicitar criterio de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos, mismo que se solicitó desde el 14 de julio de 2016.

En 2016, se han publicado 3 (tres) licitaciones para mejoramiento. En el caso de la Contratación Directa No. 2016CD-000006-0006000001 (Guacimal-Santa Elena) ya se emitieron los informes técnico y de razonabilidad de costos. Las otras 2 (dos) licitaciones están pendientes de la apertura de ofertas.



Construcción o suministro de puentes.

Se generó una licitación pública para suministro de puentes metálicos modulares lanzables, la cual se recomendó declarar como infructuosa

Diseño y otras consultorías.

En abril de 2015, se tenían 14 (catorce) contrataciones de diseño o consultoría administradas por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes: 1 (una) para elaboración de planos de catastro, 2 (dos) para estudios de factibilidad, 4 (cuatro) para diseño de carreteras y 7 (siete) para diseño o diseño y construcción de puentes. De ellas, 8 (ocho) están aprobadas y otras 6 (seis) están pendientes.

Por otro lado, en abril de 2015 se tenían en proceso de revisión de ofertas; 1 (una) contratación para diseño de carretera y 2 (dos) para diseño y construcción de puentes. De ellas, 2 (dos) están adjudicadas y 1 (una) pendiente de adjudicación. Ninguna tiene contrato aprobado todavía.

Además, se generaron 7 (siete) contrataciones nuevas: 2 (dos) para diseño o diseño y construcción de estabilización de taludes, 1 (una) para estudio de factibilidad, 1 (una) para diseño de carreteras y 3 (tres) para diseño o diseño y construcción de puentes. De ellas, 1 (una) tiene orden de inicio, 1 (una) tiene orden de compra, 3 (tres) están pendientes de adjudicación, 1 (una) está pendiente de apertura de ofertas y 1 (una) fue suspendida por decisión del Consejo de Administración.

**F. Estado de los proyectos.**

En la Tabla No. 1 se presentan los análisis técnicos y de razonabilidad de costos efectuados a partir de abril de 2015 para procesos licitatorios de todos los tipos, según su número de contratación. Para cada informe se indica el número de oficio y la fecha de emisión.

Tabla No. 1. Lista de informes técnicos y de razonabilidad de precios.

Tabla No. 1			
No.	Contratación	Análisis de razonabilidad de costos	Análisis técnico
1	2014LA-000006-ODI00	DCVP-43-15-0945 27/8/2015	DVP-05-15-0486 01/09/15
2	2014LA-000010-ODI00	DCVP-43-15-1042 21/9/2015	DCO-35-14-0963 21/09/15
3	2014LA-000020-ODI00	DCVP-32-15-0622 24/06/15	DVP-05-15-0011 13/01/15
4	2014LA-000022-ODI00	DCVP-43-15-0933 26/8/2015	-
5	2014LA-000028-ODI00	DCVP-43-15-0733 13/07/15	DCO-17-14-0049 20/01/15

<b>Tabla No. 1 (continuación)</b>			
<b>No.</b>	<b>Contratación</b>	<b>Análisis de razonabilidad de costos</b>	<b>Análisis técnico</b>
6	2014LA-000029-0DI00	DCVP-43-15-0904 18/08/15	-
7	2014LA-000039-0DI00	DCVP-43-15-0827 30/07/15	DCO-22-15-0800 13/08/15
8	2014LA-000041-0DI00	DCVP-43-15-0861 03/08/15	DVP-07-15-0482 31/08/15
9	2014LA-000042-0DI00	DCVP-43-15-0885 11/08/15	DVP-07-15-0478 28/08/15
10	2014LA-000043-0DI00	DCVP-43-15-1053 23/09/15	DVP-26-15-0544 30/09/15
11	2014LA-000048-0DI00	DCVP-43-15-1040 18/09/15	DCO-35-15-1020 07/10/15
12	2014LA-000049-0DI00	DCVP-43-15-0943 27/08/15	DVP-26-15-0512 18/09/15
13	2014LA-000050-0DI00	DCVP-43-15-0880 10/08/15	DCO-17-15-0829 20/08/15
14	2014LA-000051-0DI00	DCVP-43-15-1111 02/10/15	DCO-40-15-0993 29/09/16
15	2014LA-000052-0DI00	DCVP-43-15-0922 24/08/15	DVP-26-15-0495 07/09/15
16	2014LA-000053-0DI00	DCVP-43-15-0923 24/08/15	DCO-35-15-0994 29/09/16
17	2014LA-000055-0DI00	DCVP-43-15-0924 24/08/15	DCO-22-15-0851 26/08/15
18	2014LA-000057-0DI00	DCVP-43-15-0896 14/08/15	DCO-22-15-0820 18/08/15
19	2014LA-000058-0DI00	DCVP-43-15-0741 14/07/15	-
20	2014LA-000059-0DI00	DCVP-43-15-0883 11/08/15	DVP-07-15-0476 28/08/15
21	2014LA-000060-0DI00	DCVP-43-15-0575 10/06/15	DCO-17-15-0520 02/06/15
22	2014LA-000061-0DI00	DCVP-43-15-0898 14/08/15	DCO-25-15-0774 07/08/15
23	2014LA-000062-0DI00	DCVP-43-15-1075 25/09/15	DVP-07-15-0489 02/09/15
24	2014LA-000063-0DI00	DCVP-43-15-1076 25/09/15	DVP-07-15-0490 02/09/15
25	2014LA-000064-0DI00	DCVP-43-15-0977 02/09/15	DCO-17-15-0901 4/9/15
26	2014LA-000065-0DI00	DCVP-43-15-1068 25/09/15	-
27	2014LA-000066-0DI00	DCVP-43-15-1078 25/09/15	DCO-33-15-0989 28/09/16
28	2014LA-000068-0DI00	DCVP-43-15-0620 24/06/15	DCO-28-15-0074 28/01/15
29	2014LA-000069-0DO00	DCVP-11-15-0614 19/06/15	GCTI-29-15-0500 11/05/15
30	2014LA-000071-0DI00	DCVP-11-15-01108 02/10/15	DCO-25-15-0975 23/9/2015
31	2014LA-000072-0DI00	DCVP-13-15-164 16/02/15	DCO-22-15-0184 27/02/15
32	2014LA-000077-0DI00	DCVP-43-15-0976 02/09/15	-
33	2014CD-000074-0DI00	DCVP-43-15-0602 17/06/15	DCO-35-15-0415 10/05/15
34	2014CD-000075-0DI00	DCVP-13-15-0605 18/06/15	DCO-28-15-0820 10/09/15
35	2014LN-000005-0DI00	DCVP-32-15-1031 17/09/15	-
36	2014LN-000010-0DI00	DCVP-16-15-1021 16/09/15	-
37	2015LA-000001-0DI00	DCVP-32-15-0576 11/06/15	DCO-17-15-0523 02/06/15

**Tabla No. 1 (continuación)**

No.	Contratación	Análisis de razonabilidad de costos	Análisis técnico
38	2015LA-000002-0DI00	DCVP-16-15-0946 27/08/15	DCO-22-16-0274 16/03/16
39	2015LA-000003-0DI00	DCVP-32-15-0642 29/06/15	DCO-17-16-0618 17/06/15
40	2015LA-000004-0DI00	DCVP-43-15-0544 29/05/16	DCO-22-15-0503 28/05/15
41	2015LA-000005-0DI00	DCVP-16-15-0901 17/08/15	DCO-17-15-0787 12/08/15
42	2015LA-000006-0DI00	DCVP-13-15-0947 27/08/15	DCO-25-15-0858 27/08/15
43	2015LA-000007-0DI00	DCVP-43-15-0586 11/06/15	DCO-35-15-0519 01/06/15
44	2015LA-000008-0DI00	DCVP-43-15-0590 11/06/15	DCO-22-15-0566 12/06/15
45	2015LA-000009-0DI00	DCVP-16-15-0934 26/08/15	DCO-22-15-0857 26/08/15
46	2015LA-000010-0DI00	DCVP-13-15-1018 16/09/15	DCO-17-15-0939 14/09/15
47	2015LA-000011-0DI00	DCVP-15-15-960 31/08/15	DCO-17-15-0849 26/08/15
48	2015LA-000012-0DI00	DCVP-43-16-0359 30/05/16	DCO-17-16-0504 27/05/16
49	2015LA-000013-0DI00	DCVP-43-16-0831 30/07/16	DCO-17-15-0730 30/07/15
50	2015LA-000014-0DI00	DCVP-13-15-0738 13/07/15	DCO-17-15-0673 13/07/15
51	2015LA-000015-0DI00	DCVP-16-15-1109 02/10/20	DCO-17-15-0996 30/09/15
52	2015LA-000016-0DI00	DCVP-43-15-1058 23/09/15	DCO-17-15-0973 23/09/15
53	2015LA-000017-0DI00	DCVP-16-15-1067 25/09/15	DCO-40-15-0875 31/08/15
54	2015LA-000018-0DI00	DCVP-43-15-1027 17/09/15	DCO-33-15-0899 04/09/15
55	2015LA-000019-0DI00	DCVP-43-15-1192 23/10/15	DCO-35-15-1094 22/10/15
56	2015LA-000020-0DI00	DCVP-32-15-0992 04/09/15	DCO-22-15-0789 12/08/15
57	2015LA-000021-0DI00	DCVP-13-15-1240 5/11/15	DCO-35-15-1160 05/11/15
58	2015LA-000022-0DI00	DCVP-43-16-0061 25/01/16	DCO-35-16-0075 25/01/15
59	2015LA-000023-0DI00	DCVP-16-16-0597 02/09/16	DCO-35-16-0612 05/07/16
60	2015LA-000024-0DI00	DCVP-43-15-0736 13/07/15	DCO-22-15-0676 13/07/15
61	2015LA-000025-0DI00	DCVP-13-15-1336 04/12/15	DCO-35-15-1263 03/12/15
62	2015LA-000026-0DI00	DCVP-43-15-0876 31/08/15	DCO-22-16-708 31/08/15
63	2015LA-000027-0DI00	DCVP-13-15-0942 27/08/15	DCO-17-15-0916 10/09/15
64	2015LA-000028-0DI00	DCVP-16-15-1013 10/09/15	DCO-22-15-0951 10/09/15
65	2015LA-000029-0DI00	DCVP-16-16-0294 06/05/16	DCO-40-16-0412 06/05/16
66	2015LA-000030-0DI00	DCVP-43-16-0365 01/06/16	DCO-25-16-0509 30/05/16
67	2015LA-000031-0DI00	DCVP-43-15-1271 17/11/15	DCO-40-15-1201 16/11/15
68	2015LA-000032-0DI00	DCVP-32-15-1294 26/11/15	DCO-17-15-1233 26/11/15
69	2015LA-000033-0DI00	DCVP-16-15-1006 09/09/15	DCO-25-15-0931 11/09/15
70	2015LA-000034-0DI00	DCVP-16-15-1220 21/11/15	DCO-17-15-1091 21/10/15

Tabla No. 1 (continuación)			
No.	Contratación	Análisis de razonabilidad de costos	Análisis técnico
71	2015LA-000035-0DI00	DCVP-43-15-1158 15/10/15	DCO-40-15-1028 09/10/15
72	2015LA-000036-0DI00	DCVP-43-15-1166 19/10/15	DCO-17-15-1053 16/10/15
73	2015LA-000037-0DI00	DCVP-13-16-0372 06/06/16	DCO-17-16-0049 14/01/16
74	2015LA-000039-0DI00	DCVP-43-15-1300 25/11/15	DCO-17-15-1241 27/11/15
75	2015LA-000040-0DI00	DCVP-43-15-1156 15/10/15	DCO-40-15-1029 09/10/15
76	2015LA-000041-0DI00	DCVP-43-15-1057 23/09/15	DCO-40-15-0921 11/09/15
77	2015LA-000042-0DI00	DCVP-32-15-1222 03/11/15	DCO-40-15-1145 03/11/15
78	2015LA-000043-0DI00	DCVP-16-15-1285 23/11/15	DCO-22-15-1222 23/11/15
79	2015LA-000044-0DI00	DCVP-43-15-1221 02/11/15	DVP-26-15-0618 29/10/15
80	2015LA-000045-0DI00	DCVP-16-16-0489 08/08/15	DCO-33-15-1033 13/10/15
81	2015LA-000046-0DI00	DCVP-43-16-0029 18/01/16	DCO-33-15-1317 17/12/15
82	2015LA-000047-0DI00	DCVP-32-16-0184 18/03/16	DCO-22-16-0373 21/04/16
83	2015LA-000048-0DI00	DCVP-32-16-0293 06/05/16	DCO-33-16-0413 06/05/16
84	2015LA-000049-0DI00	DCVP-43-15-1261 11/11/15	DCO-17-15-1193 11/11/16
85	2015LA-000050-0DI00	DCVP-43-15-1193 21/10/15	DCO-40-15-1090 21-10-15
86	2015LA-000052-0DI00	DCVP-16-15-1247 05/11/15	DVP-07-15-0642 05/11/15
87	2015LA-000053-0DI00	DCVP-43-15-1246 05/11/15	DCO-33-15-1047 05/11/15
88	2015LA-000054-0DI00	DCVP-16-16-0114 19/02/16	DCO-25-15-1219 23/11/15
89	2015LA-000055-0DI00	DCVP-32-16-0228 15/04/16	DCO-40-16-0355 15/04/16
90	2015LA-000056-0DI00	DCVP-16-16-0156 04/03/16	DVP-05-16-0174 02/03/16
91	2015LA-000057-0DI00	DCVP-43-15-1343 08/12/15	DCO-40-15-1278 08/12/15
92	2015LA-000058-0DI00	DCVP-16-16-0062 25/01/16	DVP-26-16-0036 13/01/16
93	2015LA-000059-0DI00	DCVP-13-16-0003 05/01/16	DCO-35-16-0002 04/01/16
94	2015LA-000061-0DI00	DCVP-16-16-0366 01/07/16	DCO-17-16-0510 31/05/16
95	2015LA-000062-0DI00	DCVP-43-16-0366 01/06/16	DCO-17-16-0399 29/04/16
96	2015LA-000063-0DI00	DCVP-16-16-0282 29/04/16	DCO-25-16-0229 03/03/16
97	2015LA-000066-0DI00	DCVP-16-16-0148 01/03/16	DCO-17-16-0143 11/02/16
98	2015LA-000067-0DI00	DCVP-43-16-0189 28/03/16	DCO-17-16-0291 28/03/16
99	2015LA-000068-0DI00	DCVP-13-16-0302 11/05/16	DCO-XX-16-0426 11/05/16
100	2015LA-000069-0DI00	DCVP-43-16-0115 19/02/16	DCO-40-16-0177 19/02/16
101	2015LA-000070-0DI00	DCVP-11-16-0591 31/08/16	DCO-25-16-0734 30/08/16
102	2015LA-000071-0DI00	DCVP-16-16-0624 14/09/16	DCO-33-15-0583 13/09/16
103	2015LA-000072-0DI00	DCVP-16-16-0132 23/02/16	DCO-17-16-0184 22/02/16

**Tabla No. 1 (continuación)**

No.	Contratación	Análisis de razonabilidad de costos	Análisis técnico
104	2015LA-000073-0DI00	DCVP-43-16-167 14/03/16	DCO-26-16-0199 14/03/16
105	2015LA-000074-0DI00	DCVP-43-16-0154 04/03/16	DCO-40-16-0230 04/03/16
106	2015LA-000075-0DI00	DCVP-32-16-277 27/04/16	DCO-40-16-0367 28/04/16
107	2015LA-000076-0DI00	DCVP-43-16-0165 11/03/16	DCO-31-16-0241 07/03/16
108	2015LA-000077-0DI00	DCVP-16-16-185 18/03/16	DCO-35-16-0565 21/06/16
109	2015LA-000079-0DI00	DCVP-43-16-0190 28/03/16	DCO-22-16-0357 15/04/16
110	2015CD-000042-0GCTT	DCVP-32-15-0616 22/06/15	DCO-17-15-0607 23/06/15
111	2015CD-000043-0GCTT	DCVP-43-15-0657 01/07/15	DCO-33-15-0626 30/06/15
112	2015CD-000044-0GCTT	DCVP-32-15-0902 17/08/15	DCO-22-15-0815 17/08/15
113	2015CD-000045-0GCTT	DCVP-13-15-0584 11/06/15	DCO-35-15-0915 09/09/15
114	2015CD-000046-0GCTT	DCVP-43-15-0583 11/06/15	DCPO-17-15-0552 10/06/15
115	2015CD-000050-0GCTT	DCVP-32-15-0854 03/08/15	DCO-40-15-0762 04/08/15
116	2015CD-000054-0GCTT	DCVP-13-15-0588 12/06/15	DCO-22-15-0567 12/06/15
117	2015CD-000055-0GCTT	DC VP-43-15-0612 19/06/15	DCO-33-15-0598 18/06/15
118	2015CD-000056-0GCTT	DCVP-43-15-0607 18/06/15	DCO-22-15-0585 17/06/15
119	2015CD-000057-0GCTT	DCVP-16-15-0644 29/06/15	DCO-22-15-0617 26/06/15
120	2015CD-000061-0GCTT	DCVP-32-15-0734 13/07/15	DCO-17-15-0604 22/06/15
121	2015CD-000062-0GCTT	DCVP-13-15-1039 18/09/15	DCO-17-15-0853 26/08/15
122	2015CD-000066-0GCTT	DCVP-32-16-0461 13/07/15	DCO-17-16-0511 31/05/16
123	2015CD-000081-0GCTT	DCVP-13-15-1226 03/11/15	DCO-25-15-1097 23/10/15
124	2015CD-000083-0GCTT	DCVP-13-16-0020 12/01/16	DCO-17-16-0035 12/01/16
125	2015CD-000095-0GCTT	DCVP-16-15-1147 13/10/2015	DCO-33-15-0995 30/09/15
126	2015LN-000005-0GCTT	-	DCO-25-16-0526 08/06/16
127	2015LN-000008-0GCTT	DCVP-33-16-0473 03/08/16	DVP-33-16-0473 03/08/16
128	2015LN-000009-0GCTT	DCVP-32-16-0112 09/02/16	DCO-22-16-0066 20/01/16
129	2015LN-000010-0GCTT	DCVP-13-16-0075 02/02/16	DCO-40-16-0096 27/01/16
130	2015LN-000011-0GCTT	DCVP-43-16-0261 26/04/16	DCO-22-16-0385 25/04/16
131	001-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1197 23/10/15	DCO-35-15-1102 23/10/15
132	002-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1164 16/10/15	DCO-17-15-1060 16/10/15
133	003-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1163 16/10/15	DCO-25-15-1059 16/10/15
134	004-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1170 19/10/15	DCO-22-15-1068 19/10/15
135	005-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1153 15/10/15	DCO-35-15-1040 07/10/15
136	006-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1173 20/10/15	DCO-40-15-1079 20/10/15

Tabla No. 1 (continuación)			
No.	Contratación	Análisis de razonabilidad de costos	Análisis técnico
137	007-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1172 20/10/15	DCO-33-15-1015 07/10/15
138	008-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1146 13/10/15	DCO-33-15-1074 20/10/15
139	009-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1145 13/10/15	DCO-40-15-1016 07/10/15
140	010-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1241 05/11/15	DCO-17-15-1161 05/11/15
141	011-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1241 05/11/15	DCO-17-15-1160 05/11/15
142	012-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1239 04/11/15	DCO-35-15-1158 04/11/15
143	013-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1234 04/11/15	DCO-33-15-1154 04/11/15
144	014-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1233 04/11/15	DCO-40-15-1151 04/11/15
145	015-CONAVI-CNE	DCVP-43-15-1224 03/11/15	DCO-25-15-1136 21/11/15

A continuación, se presenta el estado de las diversas contrataciones agrupadas por categorías. En primer lugar, se incluyen las relacionadas con “conservación de vías” (Tablas Nos. 2 a 7). Después, se presentan las contrataciones que incluyen “diseños y consultorías” (Tablas Nos. 8 a 10). Finalmente, se presentan las contrataciones de “mejoramiento” o “construcción de carreteras” (Tabla No. 11), “demarcación” (Tabla No. 12) y “suministro de puentes” (Tabla No. 13).



Tabla No. 2. Contrataciones directas para conservación de vías, con revisión de ofertas posterior al 15 de abril de 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2014CD-000074-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 938 (en lastre), sección de control No. 51180: Las Vueltas-La Libertad; Zona 2-1	09/07/2014	18/08/2014	12/05/2015			Infructuoso	Declarado infructuoso mediante Acuerdo No. A 045-2015 del 03-07-15. Mediante oficio No. GCTT 01-15-0602 del 16-07-15 se responde a recurso de revocatoria interpuesto por Corporación FAIRUZA S.A. contra la declaratoria de infructuoso.
2014CD-000075-ODI00	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 749 (en lastre), sección de control No. 21380: Llanos-La Gloria y Ruta Nacional No. 750 (en lastre), sección de control No. 21390: Hacienda Altamira-Chambacú; zona 6-1	09/07/2014	23/07/2014	29/04/2015			Infructuoso	Declarado infructuoso mediante Acuerdo No. A 039-2015 del 26-06-15.
2015CD-000042-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 934 (en lastre), sección de control No. 51050: Terciopelo-Barco Quebrado; Zona 2-4.	07/05/2015	27/05/2015	22/06/2015	07/08/2015		100%	Adjudicado mediante resolución final No. DIE-07-15-2172 del 07-08-15.
2015CD-000043-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 931 (en lastre), sección de control No. 50820: Quebrada Taburete-Pozos (R. 150); Zona 2-2.	07/05/2015	05/06/2015	06/07/2015	14/07/2015	14/08/2015	100%	Adjudicado mediante resolución final No. DIE-07-15-1841 del 14-07-15. Mediante oficio No. DCO 17-15-0788 del 12-08-15 se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos del adjudicatario. Se emitió Orden de Compra No. 4119 del 14-08-15.
2015CD-000044-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 921 (en lastre), sección de control No. 51040: Nicoya-Quirimán; Zona 2-4.	07/05/2015	28/05/2015	17/08/2015	22/09/2015	29/10/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 22-15-1085 del 20-10-15 se concluyó que se cumplen los requisitos técnicos del adjudicatario. Se generó Orden de Compra No. 4236 del 29-10-15.
2015CD-000045-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 624 (en lastre), sección de control No. 60860: Cóbano-Montezuma; Zona 2-4.	07/05/2015	29/05/2015	24/06/2015	09/07/2015	10/09/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 35-15-0915 del 09-09-15 se concluyó que se cumplieron los requisitos del adjudicatario. Se generó Orden de Compra No. 4171 del 10-09-15.
2015CD-000046-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 907 (en lastre), sección de control No. 50750: Quebrada Honda-Corralillo; Zona 2-4.	07/05/2015	01/06/2015	11/06/2015	24/06/2015	30/07/2015	100%	Se emitió Orden de Compra No. 4093 del 30-07-15.
2015CD-000054-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 929 (en lastre), secciones de control Nos.: 50761 y 50762: Bo. Santa Martín-Pozo de Agua-Puerto Humo ; Zona 2-4	11/05/2015	02/06/2015	12/06/2015	24/06/2015	14/08/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 22-15-0790 del 12-08-15 se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos del adjudicatario. Se emitió Orden de Compra No. 4118 del 14-08-15.
2015CD-000055-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 906 (en lastre), secciones de control Nos. 50771 y 50772: Piave-Corralillo-San Lázaro ; Zona 2-4	11/05/2015	03/06/2015	19/06/2015	25/06/2015	17/07/2015	100%	Adjudicado mediante Acuerdo No. A 040-2015 del 25-06-15. Mediante oficio No. DCO 31-15-0688 del 15-07-15 se concluye que se cumplen los requisitos del adjudicatario.
2015CD-000056-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 157 (en lastre), seccion de control No. 50220: Casitas-Mansión; Zona 2-4	11/05/2015	09/06/2015	18/06/2015	25/06/2015	14/08/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 22-15-0781 del 10-08-15 se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos del adjudicatario. Se emitió Orden de Compra No. 4120 del 14-08-15.
2015CD-000057-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 905 (en lastre), seccion de control No. 50182: Barra Honda-Piave; Zona 2-4	11/05/2015	12/06/2015	29/06/2015	07/07/2015	17/08/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 22-15-0810 del 14-08-15 se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos del adjudicatario. Se emitió Orden de Compra No. 4126 del 17-08-15.
2015CD-000061-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 158 (en lastre), seccion de control No. 50682: Hojanca-Lajas; Zona 2-4	15/05/2015	10/06/2015	13/07/2015	13/08/2015	04/09/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 17-15-0894 del 03-09-15 se concluyó que se cumplieron los requisitos del adjudicatario. Se generó Orden de Compra No. 4152 del 04-09-15.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015CD-000062-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 904 (en lastre), sección de control No. 50642: Arado-Vistamar; Zona 2-3	19/05/2015	07/07/2015	18/09/2015	24/09/2015	29/10/2015	100%	Mediante oficio No. DCO 17-15-1099 del 23-10-15 se concluyó que se cumplen los requisitos técnicos del adjudicatario. Se generó Orden de Compra No. 4237 del 29-10-15.
2015CD-000063-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 931 (en lastre), sección de control No. 50702: Santa Bárbara-Quebrada Taburete; Zona 2-3	19/05/2015	25/06/2015				Infructuoso	La apertura de ofertas se dio el 25-06-15 y no se recibieron ofertas.
2015CD-000081-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 931 (en lastre), sección de control No. 50702: Santa Bárbara-Quebrada Taburete; Zona 2-3	02/09/2015	07/10/2015	03/11/2015	06/11/2015	01/12/2015	100%	Se emitió Orden de Compra No. 4319 del 01-12-15.
2015CD-000083-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 721 (en lastre), sección de control No. 21273: Cebadilla-La Garita.	22/09/2015	14/12/2015	12/01/2016	27/01/2016	12/02/2016	100%	Se emitió la Orden de Compra el 12-02-16.
2015CD-000095-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 749 y 750, en lastre, Zonas 6-1 y 6-2, Región Huetar Norte.	10/08/2015	24/08/2015	13/10/2015	19/10/2015	29/10/2015	100%	Mediante oficio No. DCVP 16-15-1147 del 13-10-15 se estableció que la oferta de Constructora NB Equipo y Maquinaria S.A. por \$90 681 590 (monto con descuento) tiene un precio razonable. Se adjudicó mediante acuerdo No. 70-2015 del 19-10-15. Se generó la Orden de Compra No. 4238 del 29-10-15.
2016CD-000008-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 902 (en lastre), sección de control No. 50692; Zona 2-4.	23/06/2016	05/07/2016	29/08/2016	01/09/2016		55%	Adjudicada mediante Acuerdo No. A28-2016 del 01-09-16. El 20-09-16 se recibió recurso de revocatoria.
2016CD-000011-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 506 (en lastre), sección de control No. 40470 (Bajos de Chilamate (R. 4) (R. 126)-Pueblo Nuevo (R. Sardinal)), Zona 6-1.	29/06/2016	20/07/2016	18/08/2016			55%	Mediante oficio No. DVP 05-16-0510 del 17-08-16 se estableció que la oferta de DINAJU S.A. es elegible desde el punto de vista técnico. Mediante oficio No. DCVP 13-16-0548 del 18-08-16 se concluyó que la oferta por \$115 477 217,81 tiene un precio razonable.
2016CD-000012-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 733 (en lastre), secciones de control Nos. 21150, 21111 y 21112 (Chimurria (R. 35)-San Rafael de Guatuso (R. 4)); Zona 6-2.	23/06/2016	20/07/2016				Sin efecto	Contratación dejada sin efecto de conformidad con oficio No. GCSV-51-16-2575 del 14-07-16.
2016CD-000013-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 745 (en lastre), sección de control No. 20963 Santa Rita (iglesia)-La Tabla (R. 744), Zona 6-1	01/07/2016	29/07/2016				40%	Mediante oficio No. DVP 33-16-0590 del 16-09-16 se solicitó subsane a DINAJU S.A.



Tabla No. 3. Licitaciones abreviadas para conservación de vías del año 2014, con revisión de ofertas posterior al 15 de abril de 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2014LA-000010	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 811 (en lastre), secciones de control Nos. 70170 y 70460: Ligua-Irlanda-Río Jiménez.	04/07/2014	22/09/2014	21/09/2015			Infructuoso	La Resolución No. R-DCA-267-2016 del 31-03-16 declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Constructora San Román de Turrialba S.A. De esta forma, queda en firme la declaratoria de licitación infructuosa.
2014LA-000020-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 245 (en lastre), secciones de control Nos. 60431, 60432, 60433, 60434 y 60435: Puerto Jiménez-Playa Tamales (R. Tamales)-Punta Carbonera (escuela)-Tuba (R. Piro)-Río Oro (R. Nuevo)-Carate; Zona 4-3.	18/06/2014	19/09/2014	01/07/2015	22/02/2016		80%	Resolución No. RES-CA-0094-2016 del 04-08-16 confirmó el acto de adjudicación en favor de Constructora Presbere S.A. por \$248 393 104.
2014LA-000022-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 507 (en lastre), secciones de control Nos. 40762, 40763, 40771 y 40780: Finca Coyol-Las Marías-El Achiote-La Aldea-Fátima.	23/06/2014	15/07/2014	26/08/2015	30/06/2016		80%	Constructora Hermanos Brenes S.A. presentó recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación. Mediante oficio No. GCTT 01-16-0868 del 12-09-16 se solicitó copia de la resolución del recurso de revocatoria. Mediante oficio No. GCTT 01-16-0905 del 22-09-16 se hizo recordatorio.
2014LA-000028-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 918 (en lastre), sección de control Nos.: 50381 y 50382; Zona 2-1	09/07/2014	05/12/2014	15/07/2015	08/10/2015		80%	Mediante oficio No. DCO 17-15-1157 del 04-11-15 se concluye que Constructora Presbere S.A. cumple los requisitos del adjudicatario.
2014LA-000029-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 931 (en lastre), sección de control Nos. 50702 y 50820; Zona 2-3	03/12/2014	06/03/2015	19/08/2015			Desierto	Se convocó a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones para el 08-12-15.
2014LA-000039-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.742 (en lastre), sección de control No.: 60601; Zona 3-1	19/11/2014	05/12/2014	11/08/2015	12/11/2015	17/02/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-07-15-0204 del 19-02-16 se remitió el contrato con aprobación interna No. 004-16 del 17-02-16.
2014LA-000041-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.328 (en lastre), secciones de control Nos.: 10121 y 10122; Zona 4-1	19/11/2014	08/12/2014	31/08/2015			Infructuoso	Se declaró la licitación como infructuosa mediante Artículo XXVI de la Sesión No. 1324-16 del 30-06-16.
2014LA-000042-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.925 (en lastre), secciones de control Nos.: 51025, 50891 y 50892 ; Zona 2-2	19/11/2014	08/12/2014	31/08/2015	10/03/2016		85%	Mediante oficio No. DCO 02-16-0483 del 20-05-16 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2014LA-000043-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.927 (en lastre), secciones de control Nos.: 50922 y 51260; Zona 2-2	19/11/2014	08/12/2014	30/09/2015	30/06/2016		85%	Mediante oficio No. DCO 02-16-0516 del 18-08-16 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2014LA-000048-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.755 (en lastre), secciones de control Nos.: 20272 y 60470; Zona 3-2	26/11/2014	15/01/2014	07/10/2015			Infructuoso	Mediante oficio No. DCO 35-15-1020 del 07-10-15 se concluyó que ninguna de las ofertas es elegible desde el punto de vista técnico.
2014LA-000049-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 301 (en lastre), secciones de control Nos.: 60591 y 60592; Zona 3-2	26/11/2014	28/01/2015	05/09/2016			55%	Mediante oficio No. DVP 26-16-0567 del 05-09-16 se concluyó que la oferta de JCB Constructora y Alquiler S.A. es elegible desde el punto de vista técnico. Mediante oficio No. DCVP 43-16-0606 del 05-09-16 se estableció que el precio de la oferta de \$309 354 206,39 es razonable.
2014LA-000050-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.752 (en lastre), secciones de control Nos.: 21141, 21142 y 21143; Zona 6-2	26/11/2014	19/02/2015	20/08/2015	18/12/2015	29/03/2016	100%	Adjudicado mediante Artículo VIII de la Sesión No. 1274-15 del 18-12-15. Mediante oficio No. GAJ-06-16-0406 del 30-03-16 se remitió contrato con aprobación interna No. 008-16 del 29-03-16.
2014LA-000051-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.136 (en lastre), sección de control No.: 10740; Zona 1-2	19/11/2014	09/12/2014	02/10/2015	07/03/2016		85%	Mediante oficio No. DVP 40-16-0430 del 11-07-16 se solicitó la documentación del adjudicatario. Mediante oficio No. DVP 40-16-0447 del 18-07-16 se concluyó que Secoya de Cartago S.R.L. cumple los requisitos del adjudicatario.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2014LA-000052-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.319 (en lastre), secciones de control Nos.: 10811,10812, 10792, 10791 y 11240; Zona 1-2	26/11/2014	25/02/2015	07/09/2015	28/03/2016	20/06/2016	100%	El 20-06-16 se obtuvo aprobación interna No. 29-16 para el contrato.
2014LA-000053-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.320 (en lastre), sección de control No.: 10800; Zona 1-2	26/11/2014	13/01/2015	29/09/2015	08/02/2016		85%	Mediante oficio No. DCO 35-16-0547 del 15-06-16 se concluyó que Constructora Presbere S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2014LA-000055-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 707 (en lastre), secciones de control Nos. 10680, 21261, 21262 y 21263; Zona 1-2.	01/12/2014	30/01/2015	26/08/2015	08/10/2015	26/02/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-06-16-0240 del 26-02-16 se remitió el contrato con aprobación interna No. 005-16 del 26-02-16.
2014LA-000057-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.322 (en lastre), sección de control No.: 10551; Zona 4-1	19/11/2014		18/08/2015			85%	Mediante oficio No. DCO 22-16-0714 del 18-08-16 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2014LA-000058-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.239 (en lastre), secciones de control Nos.: 10502, 10511 y 10512; Zona 1-2	27/11/2014	17/12/2014	14/07/2015			Infructuoso	Mediante oficio No. DCVP 43-15-0741 del 14-07-15 se recomienda declarar infructuoso el proceso. Revisado en Comisión de Recomendación de Adjudicaciones el 23-07-15.
2014LA-000059-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.314 (en lastre), sección de control No.: 10902; Zona 1-2	27/11/2014	27/04/2015	28/08/2015	31/03/2016	02/05/2016	100%	Se generó la Orden de compra No. 4503 del 02-05-16.
2014LA-000060-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.316 (en lastre), secciones de control Nos.: 10060 y 11190; Zona 1-2	27/11/2014	27/04/2015	10/06/2015	06/07/2015		85%	Mediante oficio No. DCO 17-15-0842 del 24-08-15 se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos del adjudicatario Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A.
2014LA-000061-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.324 (en lastre), secciones de control Nos.: 10970, 10980 y 11260; Zona 1-2	27/11/2014	17/12/2014	14/08/2015			55%	A ver en Comisión de Recomendación de Adjudicaciones el 12-04-16.
2014LA-000062-ODI00	Trabajos para la atención de la ruta Nacional 160, secciones de control Nos: 50591,50592, 50580; Zona 2-4	19/11/2014	09/12/2014	29/09/2015	27/06/2016		80%	El 06-07-16 Constructora San Román de Turrialba S.A. presentó recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación. Se respondió mediante oficio No. GCTT 01-16-0743 del 26-07-16 con la solicitud de que se rechace el recurso de revocatoria por improcedencia manifiesta.
2014LA-000063-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional 160, secciones de control Nos: 50610, 50621, 50622, 50623; Zona 2-4	19/11/2014	10/12/2014	29/09/2015			55%	Mediante oficio No. DCVP 43-15-1076 del 25-09-15 se estableció que la oferta de Constructora RAASA S.A. por \$265 510 137,03 tiene un precio razonable. Mediante oficio No. DVP 07-15-0538 del 29-09-15 se concluyó que la oferta es elegible desde el punto de vista técnico.
2014LA-000064-ODI00	Trabajos para la atención de la ruta Nacional 160; secciones de control Nos: 60790, 60800; Zona 2-4	19/11/2014	11/12/2014	04/09/2015	19/11/2015		85%	Mediante oficio No. DCO 17-16-0268 del 14-03-16 se concluyó que Constructora DINAJU S.A. cumple con la documentación del adjudicatario.
2014LA-000065-ODI00	Trabajos para la atención de la ruta Nacional No.:160; secciones de control No.: 60871, 60872, 60873, 60874; Zona 2-4	19/11/2014	11/12/2014	25/09/2015			55%	Mediante oficio No. PRO 10-2016-1057 del 08-08-16 se solicitó valorara la subsanibilidad de requisitos de acuerdo con la Resolución No. R-DCA-660-2015 de la Contraloría General de la República. Mediante oficio No. DCO 22-16-0730 del 25-08-16 se solicitó subsane a Constructora DINAJU S.A.
2014LA-000066-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 742 (en lastre), secciones de control Nos.: 20791 , 20792 y 20781; Zona 1-6	19/11/2014	15/12/2014	28/09/2015	05/05/2016	30/06/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-06-16-0898 del 30-06-16 se remitió contrato con aprobación interna No. 35-16.

Tabla No. 4. Licitaciones abreviadas para conservación de vías del año 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LA-000001-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 920 (en lastre), secciones de control Nos. 50800, 50950, 50790 y 51280: Filadelfia-Guinea-Río Bolsón-Río Charco-Río Talolinguita-Santa Bárbara; Zona 2-3.	20/04/2015	14/05/2015	11/06/2015	17/09/2015	17/02/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 003-16 del 17-02-16.
2015LA-000002-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 160 (en lastre), secciones de control Nos. 50571, 50572 y 50573: Río Montaña-San Juanillo-Marbella-Río Seco; Zona 2-3.	20/04/2015	27/05/2015	27/08/2015	19/11/2015	06/05/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 016-16 del 06-05-16.
2015LA-000003-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 909 (en lastre), sección de control No. 50550: Portegolpe-Caimito; Zona 2-3.	20/04/2015	15/05/2015	29/06/2015	10/08/2015		100%	Adjudicado mediante Artículo X de la Sesión No. 1233-15 del 10-08-15. Adjudicación notificada el 24-08-15.
2015LA-000004-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 911 (en lastre), secciones de control Nos. 51170 y 50443: Potrero-Nuevo Colón; Zona 2-3.	20/04/2015	15/05/2015	29/05/2015	10/08/2015	06/01/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 001-16 del 06-01-16.
2015LA-000005-ODI000	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 610 (en lastre), sección de control No. 60950: Los Ángeles-Volcán; Zona 4-1.	20/04/2015	15/05/2015	17/08/2015	28/04/2016	20/05/2016	100%	Orden de compra No. 4521 del 20-05-2016.
2015LA-000006-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 145 (en lastre), secciones de control Nos. 50143 y 50871: Marsellesa-Río Cañas-El Dos; Zona 2-2.	27/04/2015	02/06/2015	27/08/2015	18/01/2016	25/05/2016	100%	Se emitió aprobación interna del contrato según oficio No. GAJ-06-16-0690 del 25-05-16.
2015LA-000007-ODI00	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 604 (en lastre), secciones de control Nos. 60660, 60650 y 60850: Cebadilla-Pitahaya-El Palmar-Cuatro Cruces; Zona 3-1.	15/04/2015	25/05/2015	11/06/2015	10/08/2015	23/11/2015	100%	Contrato con aprobación interna No.52-15 del 23-11-15, mediante oficio No. GAJ-07-15-2057.
2015LA-000008-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 606 (en lastre), secciones de control Nos. 60710, 50880 y 51100: Santa Elena-Quebrada Berros-Quebrada Tornos-El Dos; Zona 2-2.	30/04/2015	26/05/2015	12/06/2015	10/08/2015		100%	
2015LA-000009-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 619 (en lastre), secciones de control Nos. 60070, 50971 y 50972: Santa Elena-Las Nubes-Cabeceras; Zona 2-2.	30/04/2015	29/05/2015	26/08/2015	28/04/2016	08/07/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-03-16-0941 del 08-07-16 se remitió al contrato aprobado a la Dirección Ejecutiva.
2015LA-000010-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 926 (en lastre), secciones de control Nos. 50202, 50203 y 50204: Nueva Tronadora-Viejo Arenal-El Silencio-Tilarán; Zona 2-2.	28/04/2015	26/05/2015	16/09/2015	30/06/2016		100%	Mediante oficio No. DVP 31-16-0485 del 08-08-16 se concluyó que Constructora Hermanos Bustamante e Hijos S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2015LA-000011-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 936 (en lastre), sección de control No. 51220: Caño Negro-Viejo Arenal; Zona 2-2.	30/04/2015	03/06/2015	31/08/2015	08/10/2015	03/03/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 006-16 del 06-05-16.
2015LA-000012-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 250 (en lastre), secciones de control Nos. 20672, 20673 y 20674: Pital-Sahino-Boca Tapada-Boca San Carlos; Zona 6-1.	06/05/2015	03/03/2016	30/05/2016			55%	Se presentó el análisis legal mediante oficio No. PRO 15-2016-1190 del 16-09-16.
2015LA-000013-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 734 (en lastre), sección de control No. 50070: Santa Lucía-Nuevo Arenal; Zona 2-2.	06/05/2015	24/06/2015	30/07/2015	17/09/2015	23/11/2015	100%	Contrato con aprobación interna No.51-15 del 23-11-15, mediante oficio No. GAJ-07-15-2056.
2015LA-000014-OGCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 902 (en lastre), secciones de control Nos. 51150, 50691 y 50692: Hojancha-Mercedes-Cruce a Río Ora-Carmona; Zona 2-4	11/05/2015	12/06/2015	13/07/2015			55%	Mediante oficio No. DCO 17-15-0673 del 13-07-15 se concluyó como elegible desde el punto de vista técnico la oferta de Constructora RAASA S.A. por \$117 253 164,93. Mediante oficio No. DCVP 13-15-0738 del 13-07-15 se estableció como razonable el precio de la oferta.



Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LA-000015-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 903 (en lastre), secciones de control Nos. 50632 y 50631: Jabillo-Quebrada Grande-Vista de Mar; Zona 2-4	11/05/2015	25/06/2015	02/10/2015	28/03/2016	28/04/2016	100%	Adjudicado mediante Artículo XI de la Sesión No. 1298-16 del 28-03-16. Mediante oficio No. DCO 17-16-0363 del 21-04-16 se estableció el cumplimiento de los requisitos del adjudicatario. Se emitió Orden de Compra No. 4500 del 28-04-16.
2015LA-000016-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 150 (en lastre), secciones de control Nos. 51050, 50470, 50782 y 50781: Talolinga-San Lázaro-Pozas-El Piave-Nicoya; Zona 2-4	15/05/2015	25/08/2015	23/09/2015	14/01/2016	06/05/2016	100%	Mediante oficio No. DCO 17-16-0461 del 18-05-16 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario. Contrato con aprobación interna No. 018-16 del 06-05-16.
2015LA-000017-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 915 (en lastre), secciones de control Nos. 50981 y 50982: Las Pampas-Finca Bongo-El Bongo; Zona 2-4	15/05/2015	17/08/2015	25/09/2015	23/05/2016	17/06/2016	100%	Se emitió Orden de Compra No. 4559 del 17-06-16.
2015LA-000018-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 928 (en lastre), seccion de control No. 50502: Paraíso-Playa Junquillal; Zona 2-3	15/05/2015	18/08/2015	17/09/2015	30/06/2016		100%	Mediante oficio No. DVP 33-16-0524 del 19-08-16 se solicitaron los documentos del adjudicatario.
2015LA-000019-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 912 (en lastre), seccion de control No. 50451: Paso Tempisque-San Blas; Zona 2-3	15/05/2015	18/08/2015	23/10/2015	28/03/2016	29/04/2016	100%	Cuenta con Orden de compra No. 4502 del 29-04-16.
2015LA-000020-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 910 (en lastre), seccion de control No. 50492: Cartagena-Tempate; Zona 2-3	15/05/2015	28/07/2015	04/09/2015	30/06/2016		80%	Adjudicado mediante Artículo XIII de la Sesión No. 1324-16 del 30-06-16.
2015LA-000021-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 605 (en lastre), secciones de control Nos. 60691 y 60692: Laberinto-Sarmiento-Guacimal; Zona 3-1	19/05/2015	30/07/2015	05/11/2015	23/05/2016	07/07/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 38-16 del 07-07-16.
2015LA-000022-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 756 (en lastre), secciones de control Nos. 60571 y 60572: Angostura-Facio-Llanada del Cacao; Zona 3-1	19/05/2015	31/07/2015	25/01/2016	28/04/2016	27/06/2016	100%	Aprobación interna del contrato según oficio No. GAJ-06-16-0868 del 27-06-16.
2015LA-000023-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 609 (en lastre), secciones de control Nos. 60531 y 60532: Finca Los Ángeles-Playón-Valle Vasconia; Zona 3-2	24/11/2015	29/01/2016	15/09/2016			55%	Mediante oficio No. DCVP 16-16-0597 del 02-09-16 se concluyó que la oferta de Grupo Empresarial El Almendro S.A. por 301 989 393,70 tiene un precio razonable. Constructora Hermanos Brenes presentó aclaración sobre inscripción de su maquinaria.
2015LA-000024-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 320 (en lastre), seccion de control No. 60550: Tárcoles-Río Tarcolitos; Zona 3-2	19/05/2015	22/06/2015	13/07/2015	10/08/2015	07/10/2015	100%	Contrato firmado y con aprobación interna No. 027-15 del 07-10-15.
2015LA-000025-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 239 (en lastre), seccion de control No. 60540: Vista de Mar-La Palma; Zona 3-2	21/05/2015	03/08/2015	04/12/2015	30/06/2016		85%	Mediante oficio No. DVP 31-16-0511 del 17-08-16 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2015LA-000026-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 737 (en lastre), secciones de control Nos. 21241, 21242: Aguas Claras-Colonia Blanca-Colonia La Libertad; Zona 2-1	21/05/2015	05/08/2015	31/08/2015	30/06/2016		100%	Mediante oficio No. DCO 22-16-0708 del 09-08-16 se concluyó que Constructora Secoya de Cartago S.R.L. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2015LA-000027-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 732 (en lastre), secciones de control Nos. 21481, 21482: San Isidro de Aguas Claras-Santa Adela-Cuatro Bocas; Zona 2-1	21/05/2015	03/08/2015	10/09/2015	28/04/2016	23/05/2016	100%	Se emitió Orden de Compra No. 4522 del 23-05-16.
2015LA-000028-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta de Travesía No. 51002 (en lastre), seccion de control No. 51002: Peñas Blancas; Zona 2-1	22/05/2015	30/07/2015	17/09/2015	23/11/2015	15/01/2016	100%	Se emitió la Orden de Compra No. 4337 el 15-01-16.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LA-000029-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 601 (en lastre), secciones de control Nos. 60741, 60742: Abangaritos-Cruce Manzanillo-San Gerardo; Zona 3-1	24/11/2015	29/03/2016	18/05/2016	30/06/2016		80%	Constructora Montedes S.A. presentó recurso de revocatoria mediante oficio No. MSA-097-2016 del 12-07-16. Mediante oficio No. GCTT 01-16-0725 del 18-07-16, se solicita que se rechace el recurso por extemporáneo. Mediante oficio No. GCTT 01-16-0902 del 22-09-16 se solicitó copia de la resolución del recurso de revocatoria, pero todavía se encuentra en trámite.
2015LA-000030-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 602 (en lastre), seccion de control No. 60750: Tortugal-Manzanillo; Zona 3-1	24/11/2015	28/03/2016	01/06/2016			55%	Pendiente del análisis legal de las ofertas.
2015LA-000031-0GCTT	Trabajos para la atención de la ruta Nacional 733, secciones de control Nos. 21150, 21111 y 21112: Chimurria-San Jorge-Santa Fe-San Rafael de Guatuso, Zona 6-2	29/05/2015	07/08/2015	10/05/2016	12/08/2016		80%	Adjudicado mediante Resolución Final No. ACA-01-16-0626 del 12-08-16. Constructora RAASA S.A. presentó recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación.
2015LA-000032-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 739 (en lastre), secciones de control Nos. 21581, 21582, 21583 y 20860: Florencia-La Vieja-Santa Rita-Río Balsa-Bajo Rodríguez; Zona 6-2	29/05/2015	04/08/2015	26/11/2015	28/04/2016	21/06/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-06-16-0841 del 21-06-16 se indicó que se emitió la aprobación interna del contrato.
2015LA-000033-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.143 (en lastre), secciones de control Nos. 21161, 21162, 21163, 50930: Laguna Ranita-Finca Conte-Cabanga-Río Venado; Zona 6-2	29/05/2015	05/08/2015	11/09/2015	30/06/2016	19/08/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 49-16 del 19-08-16.
2015LA-000034-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 614 (en lastre), secciones de control Nos. 60271, y 60272: Barrio Nuevo de Canoas-La Palma-La Cuesta; Zona 4-3	29/05/2015	11/09/2015	02/11/2015	26/05/2016	30/06/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-07-16-0892 del 30-06-16 se comunicó la aprobación interna del contrato No. 34-16.
2015LA-000035-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 608 (en lastre), secciones de control Nos. 60372, 60373 y 60374: Coto 47-Kilómetro 25-Finca Tamarindo-Laurel; Zona 4-3	29/05/2015	03/09/2015	15/10/2015	10/03/2016	07/07/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-03-16-0938 del 07-07-16 se remitió el contrato con aprobación interna a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.
2015LA-000036-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 611 (en lastre), secciones de control Nos. 61010 y 61020: Río Incendio-Conte-Puerto Pilón; Zona 4-3	29/05/2015	16/09/2015	19/10/2015	23/05/2016	30/06/2016	100%	Se cuenta con aprobación interna del contrato No. 33-16 del 30-06-16.
2015LA-000039-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 935 (en lastre), sección de control No. 51200: La Cruz-El Jobo; Zona 2-1	12/06/2015	19/08/2015	27/11/2015	14/01/2016	06/05/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 0017-16 del 06-05-16.
2015LA-000040-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 747-748 (en lastre), secciones de control Nos. 21101, 20941 y 20942: Platanar-San Francisco-La Palmera; Zona 6-2	29/06/2015	18/09/2015	15/10/2015	26/05/2016	07/07/2016	100%	Se cuenta con aprobación interna del contrato No. 39-16 del 07-07-16.
2015LA-000041-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 753 (en lastre), secciones de control Nos. 21091 y 21092: San Jorge de Cutris-San Marcos-Betania , Zona 6-2	29/06/2015	27/08/2015	23/09/2015	10/03/2016	21/06/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-06-16-0810 del 21-06-16 se indicó que se emitió la aprobación interna del contrato.
2015LA-000042-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 607 (en lastre), seccion de control No. 60500: Palo Seco-Porvenir; Zona 3-2	12/06/2015	17/08/2015	03/11/2015			55%	Mediante oficios Nos. CHB-557-2016 del 06-09-16 y CHB-575-2016 del 12-09-16 Constructora Hermanos Brenes S.A. efectuó aclaración sobre la inscripción de maquinaria. Mediante oficios Nos. GCTT 01-16-0834 del 01-09-16 y GCTT 01-16-0863 del 09-09-16 se hicieron recordatorios sobre la solicitud de información del proceso.
2015LA-000043-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 4 (en lastre), secciones de control Nos. 21025 y 50300: Birmania-Santa Cecilia, Zona 2-1	12/06/2015	28/08/2015	25/11/2015	28/04/2016	17/06/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-06-16-0802 del 17-06-16 se indicó que se emitió la aprobación interna del contrato.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LA-000044-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 917 (en lastre), secciones de control Nos. 50352, 50360, 21251 y 21252: Quebrada Grande-Los Ángeles-Nueva Zelandia-Dos Ríos-Brasilia; Zona 2-1	16/06/2015	01/09/2015	02/11/2015	28/04/2016	20/06/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-06-16-0819 del 20-06-16 se indicó que se emitió la aprobación interna del contrato.
2015LA-000045-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 922 (en lastre), sección de control No. 50830: Bagaces-Palo Verde; Zona 2-1	16/06/2015	21/09/2015	19/10/2015	27/06/2016	01/09/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-07-06-1220 se comunicó el contrato con aprobación interna No. 56-16 del 01-09-16.
2015LA-000046-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 936 (en lastre), secciones de control Nos. 21920 y 21910: Sangregado-R. Aguas Gatas-R. Caño Negro; Zona 6-2	06/07/2015	29/09/2015	18/01/2016	30/06/2016		80%	Adjudicado mediante Artículo XVI de la Sesión No. 1324-16 del 30-06-16.
2015LA-000047-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 760 (en lastre), secciones de control Nos.: 21930, 21940 y 21950: El Parque-Medio Queso-Primavera-Trocha; Zona 6-2	06/07/2015	05/10/2015	18/03/2016			Infructuoso	Mediante oficio No. DCVP 32-16-0420 del 28-06-16 establece que la aclaración efectuada por Constructora Herrera S.A. constituye una ampliación de la información contenida en la oferta original.
2015LA-000048-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No.734 (en lastre), sección de control No. 21120: Venado-Cruce a Santa Lucía; Zona 6-2	06/07/2015	17/09/2015	18/05/2016	30/06/2016		Infructuoso	Mediante Artículo XXVIII de la Sesión No. 1324-16 del 30-06-16, se declaró infructuosa la licitación. Constructora Hermanos Brenes S.A. presentó recurso de revocatoria.
2015LA-000049-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 227 (en lastre), secciones de control Nos. 21191, 21192 y 21193: Buenos Aires-San Joaquín-Coopevega-Moravia , Zona 2-1	07/07/2015	30/09/2015	11/11/2015	23/05/2016	30/06/2016	100%	Se cuenta con aprobación interna del contrato No. 32-16 del 30-06-16.
2015LA-000050-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 735 (en lastre), sección de control No. 21520: San José-Santa Adela, Zona 2-1	07/07/2015	30/09/2015	23/10/2015	30/06/2016		85%	Mediante oficio No. DVP 40-16-0504 del 12-08-16 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2015LA-000052-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales en lastre en la Zona 5-1 (alquiler de maquinaria)	31/07/2015	01/10/2015	11/11/2015	10/03/2016		80%	Resolución No. RES-CA-0093-2016 del 04-08-16 confirmó el acto de adjudicación en favor de NB Equipo y Maquinaria S.A. Mediante oficio No. PRO 06-16-1088 del 11-08-16, la Dirección de Proveeduría Institucional solicitó la elaboración del contrato a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.
2015LA-000053-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales en lastre en la Zona 5-2 (alquiler de maquinaria)	31/07/2015	06/10/2015	05/11/2015	28/04/2016	14/07/2016	100%	Contrato aprobado según oficio No. GAJ 03-16-0979 del 14-07-16.
2015LA-000055-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 901 (en lastre), secciones de control Nos. 51160, 50671 y 50672: Santa Marta-Río Ora-San Ramón-Finca Florida , Zona 2-4	11/08/2015	04/03/2016	15/04/2016	30/06/2016	23/08/2016	100%	Mediante oficio No. GAJ-07-16-1170 del 23-08-16 se comunicó el contrato con aprobación interna No. 53-16.
2015LA-000056-0GCTT	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 139, secciones de control Nos. 21200 y 21810: Cabañas-Río Mónico-Veracruz; Zona 6-2, Región Huetar Norte.	08/09/2015	04/11/2015	04/03/2016	28/04/2016	11/07/2016	100%	Mediante oficio No. DVP 33-16-0427 del 11-07-16 se estableció que Constructora El Bajo del León S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario. Se cuenta con aprobación interna del contrato No. 41-16 del 11-07-16.
2015LA-000057-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 163 (en lastre), secciones de control Nos. 60921, 60922, 50710 y 50720: Jicaral-San Francisco de Coyote , Zona 2-4	17/08/2015	19/11/2015	08/12/2015	28/04/2016	12/07/2016	100%	Se cuenta con aprobación interna del contrato No. 42-16 del 12-07-16.
2015LA-000058-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 623 (en lastre), secciones de control Nos. 51240, 60940 y 51230: Canjel-Jabillo, Zona 2-4	17/08/2015	29/10/2015	25/01/2016	05/05/2016	17/06/2016	100%	Contrato aprobado según oficio No. GAJ 06-16-0812 del 17-06-16.
2015LA-000059-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales No. 327, 332, 333 y 334 (en lastre), secciones de control Nos. 10892 (San Pedro-San Rafael), 11030 (San Antonio-China Kichá), 11090 (Fátima-San Jerónimo), 11043 y 11050 (Ceniza-Angostura-Repunta), Zona 4-1.	17/08/2015	19/11/2015	05/01/2016	26/05/2016	26/07/2016	100%	Se generó la Orden de Compra No. 4610 del 26-07-16.
2015LA-000061-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 323 (en lastre), sección de control No. 11000: Rivas-La Piedra; Zona 4-1,	25/11/2015	27/01/2016	05/07/2016			55%	Mediante oficios Nos. CHB-555-2016 del 06/09/16 y CHB-574-2016 del 12/09/16 Constructora Hermanos Brenes S.A. aclaró la situación sobre la maquinaria inscrita.



Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LA-000062-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 603 (en lastre), sección de control No. 60720: San Gerardo-Chomes, Zona 3-1	25/11/2015	28/03/2016	21/06/2016	30/06/2016	19/08/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 48-16 del 19-08-16.
2015LA-000063-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 620 (en lastre), secciones de control Nos. 60151 y 60152: Santa Elena-Monteverde-Reserva Biológica	25/11/2015	28/01/2016	29/04/2016			55%	A revisar en Comisión de Recomendación de Adjudicaciones el 13-09-16.
2015LA-000067-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 747 (en lastre), San Francisco-Los Llanos; Zona 6-1.	18/09/2015	21/01/2016	28/03/2016	26/05/2016	28/07/2016	100%	Se generó la Orden de Compra No. 4618 del 28-07-16.
2015LA-000068-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 206 (en lastre), sección de control No. 20230: Higuito-Copalchi; Zona 1-3	18/09/2015	08/12/2015	11/05/2016			Infructuoso	Mediante oficio No. GCTT 01-16-0758 del 03-08-16 se solicitó indicación sobre si el concurso debía promoverse nuevamente.
2015LA-000069-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 725 (en lastre), secciones de control Nos. 20850 y 21670: La Cueva-Concepción; Zona 1-5.	29/09/2015	12/01/2016	19/02/2016	30/06/2016		85%	Mediante oficio No. DVP 40-16-0478 del 04-08-16 se concluyó que se cumplen los requisitos del adjudicatario.
2015LA-000071-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 505 (en lastre), secciones de control Nos. 40511, 40512, 40850 y 40840: Puerto Viejo-Los Pooles; Zona 6-1, Región Huetar Norte.	29/10/2015	26/01/2016	21/09/2016			55%	Mediante oficio No. DCVP 16-16-0624 del 14-09-16 se estableció que la oferta de Constructora El Bajo de León por \$242 503 395 tiene un precio razonable. Mediante oficio No. DVP 33-16-0593 del 21-09-16 se concluyó que la oferta es elegible desde el punto de vista técnico.
2015LA-000072-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 744, secciones de control Nos. 20951, 20952 y 21770: Crucero-La Tabla-Pital; Zona 6-1: Región Huetar Norte.	29/10/2015	11/01/2016	23/02/2016	23/06/2016	12/08/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 46-16 del 12-08-16.
2015LA-000073-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 317, sección de control No. 10052: Pedernal-Polca; Zona 1-2: Puriscal.	03/11/2015	27/01/2016	14/03/2016	26/05/2016	21/07/2016	100%	Se emitió la Orden de Compra No. 4608 del 21-07-16.
2015LA-000074-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 238, sección de control No. 61030: Bella Luz (Ruta Nacional No. 611)-Río Coto Colorado; Zona 4-3: Región Brunca.	10/11/2015	28/01/2016	04/03/2016	30/06/2016	22/08/2016	100%	Contrato con aprobación interna No. 50-16 del 22-08-16.
2015LA-000075-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 245: Río Rincón-Puerto Jiménez; Zona 4-3: Región Brunca.	10/11/2015	25/01/2016	28/04/2016			Infructuoso	Mediante oficio No. GCTT 02-16-0893 del 20-09-16 se consulta sobre promoción de nuevo concurso luego de declaratoria como licitación infructuosa.
2015LA-000076-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 138, 227, 753, 760 y 761 (en lastre), Zona 6-2 (alquiler de maquinaria).	11/11/2015	25/01/2016	11/03/2016	30/06/2016		80%	Adjudicado a J.R. Ajima de Occidente S.A. mediante Artículo XXVIII de la Sesión No. 1324-16 del 30-06-16. Mediante oficio No. CHB-440-2016 del 13-07-16 Constructora Hermanos Brenes S.A. interpuso recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación. Mediante oficios Nos. GCTT 01-16-0865 del 12-09-16 y GCTT 01-16-0904 del 22-09-16 se solicitó copia de la resolución del recurso de revocatoria, la cual aparentemente todavía está en trámite.
2015LA-000077-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 139, 143, 733, 734, 752 y 936 (en lastre); Zona 6-2, Región Huetar Norte, alquiler de maquinaria.	11/11/2015	22/01/2016	21/06/2016			55%	Mediante oficio No. DCO 35-16-0782 del 19-09-16 se solicitó contrato de arrendamiento a Constructora Namosa S.A. a efectos de subsanar su oferta.
2015LA-000078-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 229, 505, 506, 507 y 510 (en lastre); Zona 6-1, alquiler de maquinaria.	26/11/2015	28/01/2016	31/03/2016			55%	Mediante oficio No. JRA-160-2016 la empresa J.R. Ajima de Occidente S.A. denunció que una maquinaria de Grupo Empresarial El Almendro S.A. no cuenta con la potencia requerida, lo cual fue rechazado por esta última empresa mediante oficio No. GEA-000094-2016 del 19-09-16.
2015LA-000079-0GCTT	Trabajos para la atención de las Rutas Nacionales Nos. 250, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 y 751 (en lastre); Zona 6-1.	26/11/2015	26/01/2016	15/04/2016			55%	Mediante oficio No. DCO 22-16-0357 del 15-04-16 se concluyó que la oferta de Constructora Hermanos Brenes S.A. por \$432 456 000 es elegible desde el punto de vista técnico.

Tabla No. 5. Licitaciones abreviadas para conservación de vías del año 2016.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2016LA-000001-0GCTT	Trabajos para la atención de Rutas Nacionales Nos. 242, 325, 326, 329, 331 y 335 (en lastre), secciones de control Nos. 10540, 10590, 10601, 10852, 10860, 11060 y 11070; Zona 4-1 (Alquiler de maquinaria y suministro de material).	15/01/2016	Suspendida				30%	Artículo XI de la Sesión No. 1307-16 del 05-05-16 instruyó elaborar una enmienda al cartel.
2016LA-000002-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 34 (en asfalto), secciones de control Nos.: 60101 (Barú-Matapalo) y 60102 (Matapalo-Marítima), Zona 4-2.	15/01/2016	15/02/2016	09/06/2016	08/09/2016		80%	Adjudicado mediante Resolución Final No. ACA-01-16-0589 del 08-09-16.
2016LA-000003-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 318 (en lastre), secciones de control Nos.: 10091 y 10092 Santa Rosa (R.239)-Fila del Aguacate (Escuela)-Lte Prov. San José/Puntarenas, Zona 1-2.	15/01/2016	18/02/2016	14/03/2016	30/06/2016		80%	Adjudicado mediante Artículo XIX de la Sesión No. 1324-16 del 30-06-16.
2016LA-000004-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 938 (en lastre), sección de control No. 51180; Zona 2-1.	19/01/2016	19/02/2016	05/07/2016			55%	Mediante oficio No. DCVP 16-16-0439 del 05-07-16 se estableció que la oferta de Secoya de Cartago S.R.L. por \$229 338 584,24 tiene un precio razonable. Mediante oficio No. DCO 22-16-0608 del 05-07-16 se estableció que la oferta es elegible desde el punto de vista técnico.
2016LA-000010-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 751 (en lastre), secciones de control Nos. 20993, 20992 y 20991: San José de Aguas Zarcas-Hacienda Altamira-San Jorge-Boca Arenal; Zonas 6-1 y 6-2.	29/02/2016	12/05/2016	26/05/2016	27/06/2016		80%	Mediante oficio No. GAJ-07-16-0996 del 18-07-16 la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos solicitó al adjudicatario los requisitos para la elaboración del contrato.
2016LA-000001-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 602 (en lastre), sección de control No. 51010; Zona 2-2.	23/06/2016	11/07/2016				40%	Mediante oficio No. DCO 25-16-0791 del 22-09-16 se hizo recordatorio a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos sobre consulta con respecto a la vigencia de la oferta de J.R. Ajima de Occidente S.A.
2016LA-000002-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 164 (en lastre), secciones de control Nos. 21232, 21233 y 21234, Zona 2-2	23/06/2016	14/07/2016				40%	Se solicitó subsane a Constructora Guarco S.A. mediante oficio No. DCVP 16-16-0555 del 23-08-16.
2016LA-000003-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 601 (en lastre), sección de control No. 50330, (Colorado (R. 133)-Río Abangares), Zona 2-2.	23/06/2016	22/07/2016				40%	Mediante oficio No. DVP 26-16-0487 del 08-08-16 se solicitó criterio a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos sobre la posibilidad de subsanar la vigencia de la oferta. Se hizo recordatorio mediante oficio No. DVP 26-16-0581 del 12-09-16.
2016LA-000004-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 408 (en lastre), secciones de control Nos. 30361, 30362, 30701, 30702 y 30703 (La Anita (R. 224)-Oriente (R. 225)), Zona 1-8.	23/06/2016	27/07/2016				40%	Se solicitó aclaración sobre la maquinaria mediante oficio No. DCVP 32-16-0633 del 20-09-16.
2016LA-000005-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 413 (en lastre), secciones de control Nos. 30351 y 30352 (La Suiza (R. 232) (R. 414)-Pacayitas (escuela)-Tres Equis (R. 10)), Zona 1-8.	29/06/2016	05/08/2016				40%	Se solicitaron subsanes a JCB Constructora y Alquiler S.A.
2016LA-000006-0006000001	Trabajos para la atención Ruta Nacional 417 (en lastre), secciones de control Nos. : 30761, 30762, 30771 y 30772 (Pastora (Casa Blanca) (R. 219)-Cima del Volcán Turrialba), Zona 1-8.	29/06/2016	09/08/2016	12/09/2016			55%	Mediante oficio No. DCVP 13-16-0615 del 12-09-16 se estableció que la oferta de Constructora Hermanos Brenes S.A. por \$562 763 517,82 tiene un precio razonable. Mediante oficio No. DCO 22-16-0763 del 12-09-16 se concluyó que la oferta también es elegible desde el punto de vista técnico.
2016LA-000007-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 402 (en lastre), secciones de control Nos. 30530 y 30522 (Cot (iglesia)-Lte. Cant. Oreamuno/Alvarado (R. Birris)-Pacayas (R. 230)), Zona 1-8.	23/06/2016	19/10/2016				30%	Se trasladó la fecha de apertura para el 19-10-16. Se está a la espera de que se resuelva el recurso de objeción presentado por Constructora RAASA S.A.



Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2016LA-000008-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 414 (en lastre), secciones de control Nos. 30381 y 30382 (Platanillo o Tayutic (escuela)-Moravia de Chirripó (Cruce Carolina)), Zona 1-8.	29/06/2016	19/10/2016				30%	Se trasladó la fecha de apertura para el 19-10-16. Se está a la espera de que se resuelva el recurso de objeción presentado por Constructora RAASA S.A.
2016LA-000009-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 411 (en lastre), sección de control No. 30032 (San Juan Sur (iglesia)-La Central (Ingenio Florencia)), Zona 1-8.	23/06/2016	18/10/2016				30%	Se trasladó la fecha de apertura para el 18-10-16. Se está a la espera de que se resuelva el recurso de objeción presentado por Constructora RAASA S.A.
2016LA-000010-0006000001	Servicio de mantenimiento y aseo de las estructuras construidas en la Licitación Abreviada No. 2012LA-000074-ODI00	15/07/2016	18/08/2016				45%	Mediante oficio No. DCO 25-16-0735 del 30-08-16 se concluyó que la oferta de Casa Confort S.A. por ₡100 088 242,72 es elegible desde el punto de vista técnico.
2016LA-000011-0006000001	Servicio de mantenimiento y aseo de las estructuras construidas en la Licitación Abreviada No. 2012LA-000057-ODI00	15/07/2016	18/08/2016				45%	Mediante oficio No. DVP 05-16-0564 del 02-09-16 se concluyó que la oferta de Casa Confort S.A. por ₡139 947 257,03 es elegible desde el punto de vista técnico.
2016LA-000012-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 170 (en lastre), secciones de control Nos. 50250 y 21041/21042 (Santa Cecilia-La Virgen y Límite Provincial Guanacaste/Alajuela-Fátima, Zona 2-1	01/07/2016	23/08/2016				40%	Mediante oficio No. DCVP 13-16-0632 del 23-09-16 se solicitó subsane a Constructora DINAJU S.A.
2016LA-000013-0006000001	Trabajos para la atención de la Rutas Nacionales No. 745, secciones Nos. 21401, 21402 y 40581 Veracruz-Pangola y 746, sección de control No. 20970 (El Pegón/La Legua-Veracruz), Zona 6-1.	01/07/2016	30/08/2016	22/09/2016			55%	Mediante oficio No. DCO 07-16-0789 del 22-09-16 se concluye que la oferta del Consorcio Also Caribe es elegible desde el punto de vista técnico. Mediante oficio No. DCVP 43-16-0649 del 22-09-16 se estableció que el precio de la oferta por ₡266 150 924,04 tiene un precio razonable.
2016LA-000014-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 301 (en lastre), secciones de control Nos. 10660, 10720, 10731 y 10732 (San Ignacio de Acosta-Quebrada Bijagual), Zona 1-3	05/08/2016	14/10/2016				30%	Se trasladó la fecha de apertura para el 14-10-16. Se presentó recurso de objeción el 14-08-16 por parte de Constructora RAASA S.A.
2016LA-000015-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 313 (en lastre), secciones de control Nos. 10640 y 11320 (La Legua (iglesia)-Llano Bonito (escuela)), Zona 1-3.	04/08/2016	14/10/2016				30%	Se trasladó la fecha de apertura para el 14-10-16. Se presentó recurso de objeción el 17-08-16 por parte de Constructora RAASA S.A.
2016LA-000016-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 761 (en lastre), secciones de control Nos. 21880, 21960, 21971 y 21972 San Humberto (R. 35)-Tiricias (R. San Juan) (Frontera), Zona 6-2	03/08/2016	13/09/2016				40%	Se recibieron ofertas el 13-09-16.
2016LA-000017-0006000001	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 315 (en lastre), sección de control No. 10611 (Cañón-Copey (plaza/iglesia)), Zona 1-3.	03/08/2016	14/09/2016				40%	Se recibieron ofertas el 14-09-16.

Tabla No. 6. Licitaciones públicas para conservación de vías del año 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LN-000008-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 138 (en lastre), secciones de control Nos. 21170, 21602, 21611 y 21612; Zona 6-2.	11/09/2015	14/01/2016	05/08/2016			55%	Mediante oficio No. DVP 33-16-0473 del 03-08-16 se concluyó que la oferta de Constructora El Bajo del León S.A. es elegible desde el punto de vista técnico. Mediante oficio No. DCVP 13-16-0520 del 05-08-16 se estableció que el precio de la oferta por \$611 628 275 es razonable.
2015LN-000010-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 715 (en lastre), secciones de control Nos. 21680 y 20531: Zaragoza-Río Grande-El Rosario; Zona 1-5.	29/09/2015	06/01/2016	02/02/2016	26/05/2016		85%	Mediante oficio No. DVP 40-16-0479 del 04-08-16 se concluyó que Constructora Albosa S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
2015LN-000011-0GCTT	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 405 y Travesía No. 30703 (en lastre), La Fuente-Boquerón; Zona 1-7.	21/09/2015	02/02/2016	02/05/2016			55%	Mediante oficio No. PRO 10-2016-1049 del 05-08-16 se solicitó indicar si los análisis técnico y de razonabilidad de precios se mantenían invariables. Mediante oficio No. DCO 22-16-0724 del 23-08-16 se consultó a Constructora Hermanos Brenes S.A. si había concluido con la inscripción de la compactadora.

Tabla No. 7. Contrataciones por emergencia para mitigación de polvo del año 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
001-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 160, Marbella-Río Montaña, para el control de la contaminación por polvo	21/08/2015	08/10/2015	23/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 35-15-1271 del 07-12-15 se concluyó que Consorcio Albosa Mapache cumple con los requisitos técnicos del adjudicatario.
002-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 909, Portegolpe-Caimito, para el control de la contaminación por polvo	21/08/2015	08/10/2015	16/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 17-15-1247 del 02-12-15 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos técnicos del adjudicatario.
003-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 910, Cartagena-Tempate, para el control de la contaminación por polvo	21/08/2015	08/10/2015	16/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 25-16-0213 del 01-03-16 se estableció que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
004-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 920, Filadelfia-Santa Bárbara, para el control de la contaminación por polvo	21/08/2015	07/10/2015	19/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 22-15-1252 del 02-12-15 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos técnicos del adjudicatario.
005-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 150, Talolinga-San Lázaro-Pozos-El Piave, para el control de la contaminación por polvo	24/08/2015	06/10/2015	15/10/2015	23/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 35-15-1315 del 17-12-15 se concluyó que Consorcio ALSO Caribe cumple con los requisitos técnicos del adjudicatario.
006-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 901, Santa Marta-San Ramón de Río Ora-Finca Florida, por el control de la contaminación por polvo	24/08/2015	07/10/2015	20/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 40-16-0338 del 13-04-16 se verificó el cumplimiento de los requisitos del adjudicatario.
007-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 903, Jabillos-Quebrada Grande-Vista de Mar, por el control de la contaminación por polvo	24/08/2015	07/10/2015	20/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 33-15-1279 del 08-12-15 se concluyó que Consorcio Albosa Mapache cumple con los requisitos técnicos del adjudicatario.
008-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 907, Quebrada Honda-Corralillo, por el control de la contaminación por polvo	24/08/2015	06/10/2015	13/10/2015	16/11/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 33-15-1277 del 08-12-15 se concluyó que Constructora RAASA S.A. cumple con los requisitos técnicos del adjudicatario.
009-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 929, San Martín-Pozo de Agua-Puerto Humo, por el control de la contaminación por polvo	24/08/2015	06/10/2015	13/10/2015	16/11/2015		100%	Adjudicado mediante Artículo XIV de la Sesión No. 1264-15 del 16-11-15. Se notificó la adjudicación el 19-11-15. Mediante oficio No. DCO 17-15-1235 del 26-11-15 se solicitó la documentación del adjudicatario.
010-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 4, Río Haciendas-Santa Cecilia, por el control de la contaminación por polvo	01/09/2015	26/10/2015	05/11/2015			100%	Mediante oficio No. DCO 17-16-0151 del 15-02-16 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
011-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 145, Marsellesa-Quebrada Grande, por el control de la contaminación por polvo	01/09/2015	27/10/2015	04/11/2015	03/12/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 22-16-0051 del 15-01-16 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
012-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 929, San Martín-Pozo de Agua-Puerto Humo, por el control de la contaminación por polvo	01/09/2015	27/10/2015	04/11/2015	11/05/2016		100%	Mediante oficio No. DCO 35-16-0569 del 22-06-16 se concluyó que la oferta de Consorcio ALSO Caribe S.A. cumple los requisitos del adjudicatario.
013-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 606, Quebrada Berros-Quebrada Tornos-El Dos de Tilarán, por el control de la contaminación por polvo	02/09/2015	27/10/2015	04/11/2015			100%	Mediante oficio No. DCO 33-16-0132 del 08-02-16 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
014-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 734, Arenal-Santa Lucía, por el control de la contaminación por polvo	02/09/2015	26/10/2015	04/11/2015			100%	Mediante oficio No. DCO 40-16-0455 del 18-05-16 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.
015-2015 CONAVI-CNE	Atención de la Ruta Nacional con superficie de lastre No. 925, Jabilla Abajo-Libano, por el control de la contaminación por polvo	02/09/2015	26/10/2015	03/11/2015	03/12/2015		100%	Mediante oficio No. DCO 25-16-0015 del 06-01-16 se concluyó que Constructora Hermanos Brenes S.A. cumple con los requisitos del adjudicatario.

Tabla No. 8. Contrataciones para diseño de carreteras.

Contratación		Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación	Orden de inicio	OBSERVACIONES	
2012LA-000106-ODI00	Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimento, elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del proyecto: "Carretera 1856 Juan Rafael Mora Porras", sección No. 1: Los Chiles-Río Pocosol	14/12/2012	08/01/2013	20/02/2013	31/10/2013	17/12/2013	21/01/2014	Mediante oficio No. DVT-DGIT-R-2016-1055 del 29-09-16 la Dirección General de Ingeniería de Tránsito aprobó los planos. Por tanto, el Informe Final (No. 4) está aprobado.	
2013CD-000148-ODI00	Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, pavimento y elaboración de planos de la Ruta Nacional No. 856, secciones 2, 3, 4A, 4B y 5.	18/12/2013	17/02/2014	17/03/2014	04/04/2014	25/04/2014			
	1						Sección 2: Río Pocosol-Río Infiernito	14/05/2014	Mediante oficio No. 0537-2016 del 20-07-16 se presentaron las correcciones al Informe de Avance No. 3. Orden de Servicio No. 10 suspende actividades a partir del 21-07-16.
	2						Sección 3: Río Infiernito-Río San Carlos	14/05/2014	Mediante DCO 22-16-0717 del 18-08-16 se emitió la Orden de Servicio No. 8, que reanuda actividades a partir del 22-08-16 y solicita la presentación del Informe de Avance No. 2.
	3						Sección 4A: Río San Carlos-Remolinito	14/05/2014	Mediante oficio No. 0501-2016 del 11-07-16 el contratista presentó correcciones al Informe de Avance No. 3. Mediante Orden de Servicio No. 9 se aplicó suspensión de actividades a partir del 13-07-16.
	4						Sección 4B: Remolinito-Río Sarapiquí	14/05/2014	Mediante oficio No. DCO 22-16-0709 del 12-08-16 se emitió Orden de Servicio No. 12 que reanudó las actividades. Mediante oficio No. 0616-2016 del 16-08-16 el contratista presentó las correcciones.
5	Sección 5: Río Sarapiquí-Delta	29/05/2014	Mediante oficio No. OF-IM-2016-227 del 13-07-16 el contratista presentó correcciones para el Informe de Avance No. 3.						
2014LA-000003-ODI00	Diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del mejoramiento de la Ruta Nacional No. 624, sección Cóbano-Montezuma.	28/02/2014	05/05/2014	27/06/2014	07/08/2014	11/11/2014	01/12/2014	Se solicitó aumento de asignación presupuestaria por \$550 000 para pagar factura de reajuste del Informe Final.	
2014LA-000004-ODI00	Diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del mejoramiento de la Ruta Nacional No. 707, sección San Pablo de Turubares - Ruta -Nacional No. 27.	17/02/2014	02/05/2014	19/06/2014	04/08/2014	13/10/2014	11/11/2014	La Orden de Servicio No. 4 suspendió actividades a partir del 17-06-16.	
2014LA-000071-ODI00	Diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto de la ampliación de las Rutas Nacionales Nos. 3 y 106, sección Barreal-Lagunilla-Valencia.	22/10/2014	10/04/2015	02/10/2015	11/07/2016			Adjudicado a IMNSA Ingenieros Consultores S.A. mediante Artículo VIII de la Sesión No. 1327-16 del 11-07-16.	
2015LA-000060-OGCTT	Diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del mejoramiento de la Ruta Nacional No. 17, sección El Roble-Angostura-Cocal	13/10/2015						El proceso licitatorio se encuentra suspendido por decisión del Consejo de Administración.	



Tabla No. 9. Contrataciones para diseño de puentes.

Contratación		Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación	Orden de inicio	OBSERVACIONES
<b>Diseño y construcción de estructura mayor de drenaje Estero de Quepos</b>		22/10/2008	27/01/2009	25/03/2009		14/06/2010	13/07/2010	El diseño fue aprobado y el puente está siendo ejecutado por la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes.
2012LN-000009-0DI00	Diseño y construcción de 15 puentes en la Ruta Nacional No. 121: sección San Rafael de Escazú-Ciudad Colón	04/07/2012	18/10/2012	14/06/2013	01/08/2013	19/02/2014		
	1 Agres, Chiquero, Cruz y Convento						17/03/2014	Mediante oficio No. DCO 22-16-0619 del 07-07-16 se solicitaron correcciones. Mediante oficio No. MECO GPE 2107-2016-001 del 21-07-16 el contratista presentó las correcciones.
	2 Corrogres, Uruca, Azul, Cubillo, Oro, Caraña						17/03/2014	Mediante oficio No. DCO 22-16-0715 de 18-08-16 se solicitaron correcciones.
3 Guapinol, Cruz, San Marcos, Muerte I y Muerte II	17/03/2014	Mediante oficio No. DCO 22-16-0750 del 05-09-16 se remitió factura por un monto bruto de ₡83 953 798,25.						
2012LA-000056-0DI00	Diseño y construcción de puente sobre la Quebrada Guaría en la Ruta Nacional No. 106.	25/09/2012	02/11/2012	25/01/2013	01/04/2013	15/07/2013	16/09/2013	Mediante oficio No. DCO 02-16-0762 del 08-09-16 se respondió a las consultas de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos con respecto a la Orden de Modificación del contrato.
2012LA-000058-0DI00	Diseño para la rehabilitación del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107.	07/08/2012	17/09/2012	30/11/2012	20/12/2012	07/03/2013	06/05/2013	
2014CD-000082-0DI00	Reforzamiento del puente sobre el río Virilla, Ruta Nacional No. 32, sección Tibás-San Miguel de Santo Domingo de Heredia.	24/07/2014	14/08/2014	23/09/2014	20/10/2014	19/12/2014	23/02/2015	Mediante oficio No. DCVP 13-16-0544 del 17-08-16 se concluyó que el presupuesto preliminar es aceptable como referencia. Mediante oficio No. DCO 02-16-0740 del 31-08-16 se solicitaron correcciones del Informe Final.
2014LA-000006-0DI00	Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en Quebrada Cima, Ruta Nacional No. 148, Palmares.	01/10/2014	13/11/2014	01/04/2016				Mediante oficio No. PRO 15-16-0894 del 23-06-16 se concluyó que a pesar de que el monto de la certificación de fondos es insuficiente para cubrir la totalidad, se tiene el compromiso de la Dirección Financiera de otorgar los fondos oportunamente y la unidad ejecutora no estima que se requieran fondos adicionales. Por ello, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones puede revisar el caso y recomendar su posible adjudicación.
2014LA-000023-0DI00	Contratación de servicios profesionales de un consultor para el diseño de planos tipo en concreto para puentes menores.	03/07/2014	20/08/2014	24/10/2014	10/11/2014	21/01/2015	18/02/2015	Mediante oficio No. DCO 17-16-0469 del 19-05-16 se indicó que no se ha realizado el finiquito porque no se ha resuelto un proceso sumario.
2014LA-000077-0DI00	Diseño y construcción del puente sobre la Quebrada Cruz, Ruta Nacional No. 303.	16/12/2014	02/02/2015	30/03/2016	11/07/2016			Adjudicado a Puente Prefa Ltda. mediante Artículo VII de la Sesión No. 1327-16 del 11-07-16.
2015CD-000066-0GCTT	Consultoría para la rehabilitación del puente sobre el río Barranca, Ruta Nacional No. 23.	16/09/2015	13/01/2016	13/07/2016				Mediante oficio No. DCVP 32-16-0461 del 13-07-16 se estableció que ambas ofertas tienen un precio razonable.
2015LN-000009-0GCTT	Diseño y construcción del puente sobre el Río Pedregoso, Ruta Nacional No. 243.	23/09/2015	05/11/2015	19/02/2016	13/07/2016	25/08/2016	14/09/2016	La Orden de Servicio No. 1 establece el inicio de actividades a partir del 14-09-16.
2016LA-000020-0006000001	Diseño y construcción del puente sobre Quebrada Grande, Ruta Nacional No. 505	02/09/2016	19/10/2016					La apertura de ofertas está programada para el 19-10-16.
2014LA-000005-0DI00	Diseño y construcción de puente peatonal sobre el río Santa Clara en la Ruta Nacional No. 810	28/02/2014	24/04/2014	10/06/2014	07/07/2014	23/09/2014	10/11/2014	Mediante oficio No. DCO 22-16-0698 del 03-08-16 se respondió a las consultas de la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos.

Tabla No. 10. Contrataciones para otras consultorías (diseños de taludes, estudios de factibilidad y elaboración de planos de catastro).

Contratación		Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación	Orden de inicio	OBSERVACIONES
2012LA-000043-ODI00	Servicios de agrimensura para la confección de planos de catastro para efectos de expropiación en varios proyectos viales:	15/06/2012	06/07/2012	20/08/2012	08/11/2012			Mediante oficio No. DVP 06-16-0367 del 13-06-16 se devolvieron las facturas debido a falta de documentación.
	1 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección Sámara-Nosara						20/05/2013	
	2 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 606, sección Guacimal-Santa Elena					27/06/2013	10/07/2013	
	Mejoramiento de las Rutas 5 Nacionales Nos. 218 y 401, sección Rancho Redondo-Llano Grande					27/06/2013	10/07/2013	
2015LA-000037-0GCTT	Diseño y construcción de las obras de estabilización de talud en las cercanías del Río Balsa, Ruta Nacional No. 739.	02/09/2015	12/11/2015	17/08/2016				Mediante oficio No. PRO 03-2016-1167 del 07-09-16 la Dirección de Proveeduría Institucional le explicó el estado del proceso a la Dirección Ejecutiva. A revisar en Comisión de Recomendación de Adjudicaciones para el 13-09-16.
2015LA-000066-0GCTT	Diseño de estabilización de taludes en la Ruta Nacional No. 301, sección San Luis-Cruce a Las Ceibas.	07/10/2015	08/12/2015	01/03/2016	18/07/2016			Se emitió la Orden de Compra No. 4677 del 30-08-16, la cual fue remitida a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes debido a que la resolución de inicio erróneamente indicaba esa dependencia como unidad supervisora. Mediante oficio No. GCTT-01-16-0923 del 27-09-16 se solicitó a la Dirección Ejecutiva autorización para que la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes asuma la administración del contrato.
2012LA-000073-ODI00	Estudio de factibilidad para el mejoramiento de la Ruta Nacional No. 415, sección Turrialba - La Alegría	29/10/2012	12/12/2012	24/01/2013	01/08/2013	24/09/2013	14/10/2013	En espera de que se resuelvan los procesos sumarios para efectuar el finiquito.
2012LN-000012-ODI00	Estudios de factibilidad para varias rutas nacionales. Línea No. 1. Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 10, sección Turrialba-Siquirres.	06/07/2012	06/09/2012	20/12/2013	07/04/2014	30/05/2014	19/06/2014	El contratista presentó correcciones al Informe de Avance No. 2 mediante oficio No. OF-IM-2016-235 del 19-07-16. Mediante la Orden de Servicio No. 17 se suspendieron actividades a partir del 21-07-16.
2015LA-000070-0GCTT	Estudios de factibilidad para la radial entre la Ruta Nacional No. 1 y Sarchí Norte (Ruta Nacional No. 1).	16/10/2015	29/03/2016	31/08/2016				Mediante oficio No. DCO 25-16-0734 del 30-08-16 se estableció que la oferta del Consorcio GECCSA-Camacho y Mora es elegible desde el punto de vista técnico. Mediante oficio No. DCVP 11-16-0591 del 31-08-16 se concluyó que el precio de la oferta por \$54 674 622 es razonable.

Tabla No. 11. Contrataciones para mejoramiento o construcción de carreteras, con revisión de ofertas posterior al 15 de abril de 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LN-000006-0GCTT	Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de las Rutas Nacionales Nos. 112 y 503, sección La Suiza-Uriche-Bermúdez.	08/09/2015	07/12/2015				40%	Mediante oficio No. DCO 35-16-0604 del 04-07-16 se hizo consulta a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos sobre la existencia de un decreto de embargo para la empresa DINAJU. Mediante oficio No. DCO 35-16-0745 del 02-09-16 se hizo recordatorio al respecto.
2016CD-000014-0006000001	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 606, sección Guacimal-Santa Elena.	27/07/2016	25/08/2016	13/09/2015			55%	Mediante oficio No. DCO 22-16-0775 del 13-09-16 se concluyó que la oferta de Constructora MECO S.A. por un monto de \$6 871 013 307,70 es elegible desde el punto de vista técnico. Mediante oficio No. DCVP 43-16-0623 del 13-09-16 se determinó que el precio de la oferta es razonable.
2016LA-000018-0006000001	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección Cóbano-Los Mangos	23/08/2016	20/10/2016				30%	El 09-09-16 Constructora RAASA S.A. interpuso recurso de objeción al cartel. Se pospuso la apertura de ofertas para el 20-10-16 debido a que no se ha resuelto el recurso de objeción.
2016LA-000019-0006000001	Mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial de las Rutas Nacionales Nos. 114 y 126, sección: Barva-San José de la Montaña	02/09/2016	07/10/2016				30%	La apertura de ofertas está programada para el 07-10-16.

Tabla No. 12. Contrataciones para demarcación, con revisión de ofertas posterior al 15 de abril de 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015CD-000050-0GCTT	Demarcación vial (horizontal y vertical) y colocación de captaluces de la Ruta Nacional No. 911, sección Flamingo-Playa Potrero	11/06/2015	06/07/2015	04/08/2015	11/08/2015	19/08/2015	100%	
2015LA-000054-0GCTT	Demarcación vial (horizontal y vertical) y colocación de captaluces de la Ruta Nacional No. 34, sección Dominical-Palmar Norte.	28/07/2015	09/11/2015	19/02/2016	31/03/2016		100%	

Tabla No. 13. Contrataciones para suministro de puentes, con revisión de ofertas posterior al 15 de abril de 2015.

Contratación	Descripción	Remisión del cartel	Apertura de ofertas	Análisis de ofertas	Adjudicación**	Contratación u orden de compra	% de avance en contratación	OBSERVACIONES
2015LN-000005-0GCTT	Suministro de 12 (doce) puentes metálicos modulares lanzables (tipo Bailey) de 54,86 m (18 pies) de longitud.	19/10/2015	03/02/2015	08/06/2016			55%	Mediante oficio No. DCO 25-16-0526 del 08-06-16 se estableció que ninguna de las ofertas es elegible, de conformidad con lo indicado por la Dirección de Puentes del MOPT mediante oficio No. DVOP-DP-2016-312 del 03-06-16, recibido el 06-06-16.

**G. Administración de recursos financieros**

De acuerdo con lo consultado en el sistema B.O. SIFCO, el 30 de setiembre de 2016, se presentan los montos de ejecución presupuestaria indicados en la Tabla No. 14.

Tabla No. 14. Ejecución presupuestaria entre enero y setiembre de 2016.

DESCRIPCION	Presupuesto	Ejecutado	% de Ejecución
Sueldos para cargos fijos	₡ 304.802.621	₡174.201.909	57,15%
Tiempo extraordinario	₡ 30.000.000	₡ 10.531.012	35,10%
Incentivos salariales	₡ 347.710.961	₡186.370.902	53,60%
Contribuciones patronales seguridad social	₡ 61.875.823	₡ 33.952.452	54,87%
Contribuciones patronales pensiones	₡ 90.796.963	₡ 48.703.326	51,76%
Remuneraciones diversas	₡ 3.000.000	₡ 182.813	6,09%
Alquileres	₡ 154.030.000	₡105.308.421	68,37%
Servicios básicos	₡ 15.400.000	₡ 5.292.803	34,37%
Servicios comerciales y financieros	₡ 3.440.000	₡ 1.640.000	47,67%
Servicios de gestión y apoyo	₡2.303.431.506	₡165.699.886	7,19%
Gastos de viaje y transporte	₡ 14.000.000	₡ 3.767.011	26,91%
Seguros	₡ 24.000.000	₡ 3.659.051	15,25%
Capacitación y protocolo	₡ 4.200.000	₡ 2.674.458	27,71%
Mantenimiento y reparación	₡ 9.400.000	₡ 218.093	2,32%
Servicios diversos	₡ 2.500.000	₡ -	0,00%
Productos químicos (combustible y otros)	₡ 25.392.520	₡ 685.917	2,70%
Alimentos y bebidas	₡ 500.000	₡ 160.167	32,03%
Materiales y productos de construcción	₡ 3.109.148	₡ 40.552	1,30%
Herramientas, respuestos y accesorios	₡ 10.291.660	₡ 501.078	4,87%
Útiles, materiales y suministros diversos	₡ 15.422.635	₡ 606.947	3,94%
Maquinaria equipo y mobiliario	₡ 6.170.000	₡ 366.668	5,94%
Bienes intangibles	₡ 7.000.000	₡ -	0,00%
Prestaciones	₡ 40.000.000	₡ 1.022.976	2,56%
Otras transferencias corrientes al sector privado	₡ 3.000.000	₡ -	0,00%

En el Gráfico No. 5 se presentan los rubros más significativos dentro del presupuesto de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes. La partida “Servicios de gestión y apoyo”, destinada al pago de consultorías, compone el 66% (sesenta y seis) por ciento del presupuesto total y presenta un porcentaje de ejecución presupuestaria del 7,2% (siete coma dos) por ciento.


Al sumar sueldos, tiempo extraordinario, incentivos salariales, contribuciones patronales, remuneraciones diversas y prestaciones; se obtiene que el rubro relacionado a salarios y prestaciones abarca el 25% (veinticinco) por ciento del presupuesto total asignado.



Al respecto a la fecha, se tiene una ejecución presupuestaria del 51,8% (cincuenta y uno coma ocho) por ciento.

El siguiente componente relevante dentro del presupuesto corresponde a “Alquileres”, que conforma el 4,4% (cuatro coma cuatro por ciento) del total y tiene una ejecución presupuestaria de 68,4% (sesenta y ocho coma cuatro por ciento).

Gráfico No. 5. Ejecución presupuestaria de enero a setiembre de 2016.

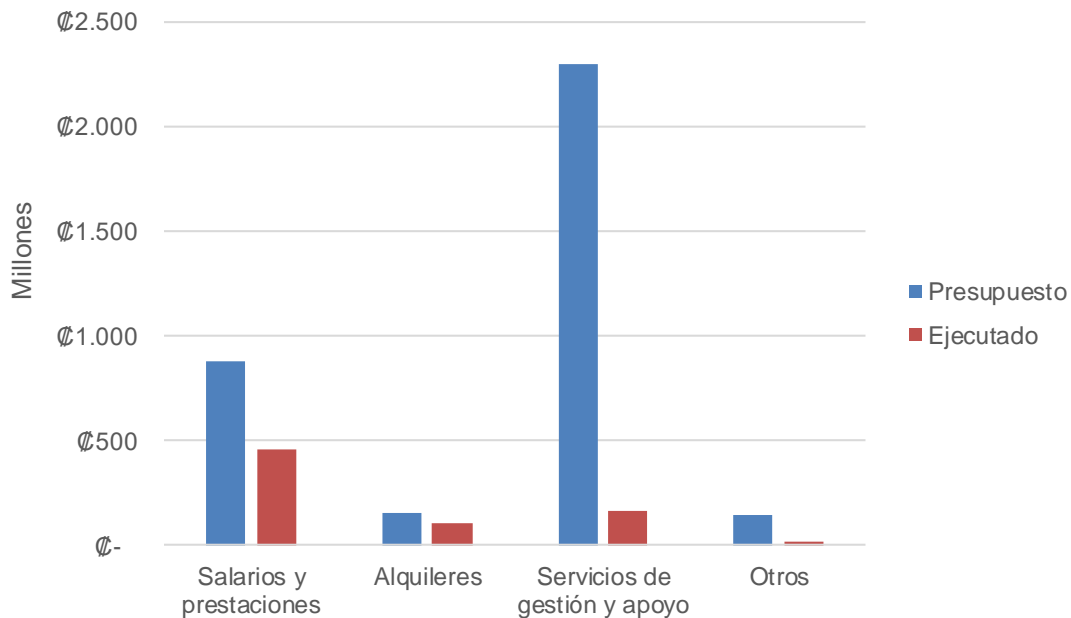

## H. Sugerencias.

Realmente al cabo de más de 37 (treinta y siete) años de labor, de experimentar innumerables cambios en cuanto a la gestión institucional, no sólo por cambios en la estructura sino también por cambios en las personas responsables de la Administración, el suscrito podría considerar que tiene legitimación y propiedad para realizar recomendaciones en cantidad de temas; acción que no se realizará por considerar que resulta improductiva.

No considero conveniente indicarle que se debe actuar en cuanto a los plazos de respuesta de algunas dependencias del CONAVI, ni en cuanto a la necesidad de garantizar la aplicación correcta de la legislación (por ejemplo, en cuanto a contratación administrativa); pues la intervención en estos y otros temas, no es optativa sino una responsabilidad intrínseca con el cargo que Usted ocupa; sino no se toman medidas de este tipo, se incumple con las obligaciones y responsabilidades que de manera voluntaria ha aceptado, al ser Director Ejecutivo a.i.-CONAVI.

Dicho lo anterior, en lo único que me interesa hacer una recomendación es en la importancia que se dote a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes, del recurso humano necesario para realizar de manera holgada las funciones que le han sido asignadas. Particularmente en este tema, deberá realizarse la inmediata restitución del personal que por una u otra razón, ha salido de la Gerencia.

El contar con el personal necesario y suficiente, no sólo genera condiciones de trabajo agradables y sanas, sino que permite el desarrollo del ser humano en el campo de su profesión, con lo que se plantean soluciones a los problemas existentes, de mayor amplitud y cobertura.

#### I. Cumplimiento de disposiciones.

A la fecha y según los registros existentes en esta Gerencia, no existen disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Auditoría Interna, Contraloría de Servicios u otra dependencia de control, pendientes de atención. Todos estos trámites, así como aquellos originados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, han sido atendidos de manera oportuna (en el plazo indicado) y se encuentran en el trámite correspondiente.

Sin más por el momento, se despide.

Cordialmente,



**Ing. Johnny Barth Ramírez**  
**Gerente de Contratación de Vías y Puentes**



cc: Ing. Edgar Salas Solís (físico).  
MBA. Nora García Arias (físico).  
Lic. Ricardo Sandí Guillén (físico).  
Archivo.  
Copiador  
Archivo No. GCTT-01-16-0965

Director Contratación de Vías y Puentes –CONAVI  
Directora Gestión Recurso Humano-CONAVI  
Director Tecnologías de Información-CONAVI
