
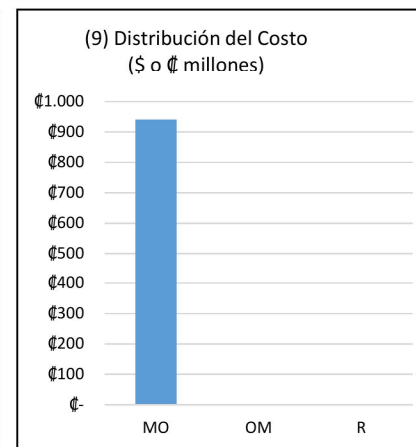


**(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-000600001.**

<b>(5) Unidad encargada</b>	<b>Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)</b>
<b>Encargado</b>	Ing. José Mena Carmona
<b>Teléfono / Correo</b>	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr
<b>Fuente Financiamiento</b>	Fondo Vial
<b>Contratista/Supervisora</b>	CODOCSA S.A / GCVP

**(6) Descripción:** Realizar la construcción del puente sobre el Río Poás y sus accesos, en la Ruta Nacional No. 107, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantones: 01 Alajuela y 08 Poás; Distritos: 07 Sabanilla (Alajuela) y 01 San Pedro (Poás). Sección: 20380 y 20390.  
 Obras a realizar:  
 -Desarmar, trasladar y descargar el puente metálico lanzable existente y depositarlo en el Plantel Colima, en Santo Domingo de Heredia.  
 -Demoler la estructura del puente existente.  
 -Construir la subestructura y superestructura, del puente sobre el río Poás.  
 -Construir los accesos de aproximación.  
 -Colocar el señalamiento vial correspondiente.  
 La intervención total comprende aproximadamente 0,045 kilómetros.

<b>(7) PLAZO</b>	Orden de Inicio	4/9/2020	<b>1%</b>
	Plazo contractual (PC)	180 días	
	Eventos compens. (EC)	0 días	
	Plazo por suspensión (PS)	514 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	180 días	
	Última suspensión	5/9/2020	
	Plazo utilizado	1 días	<b>% Avance</b>
Fecha de Finalización	INDEFINIDA		

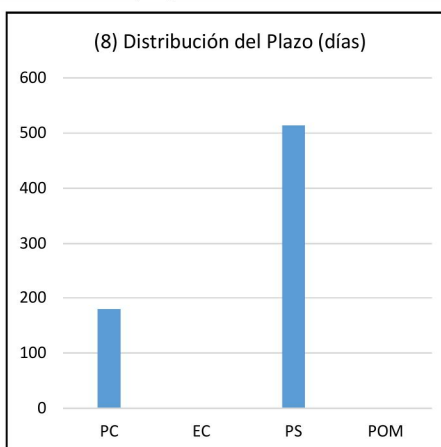

<b>(8) COSTO</b>	Monto de oferta (MO)	₡ 940.552.331,32	<b>0%</b>
	Orden Modificación (OM)	₡ -	
	Reajustes (R)	₡ -	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 940.552.331,32	
	Financiero Ejec.	₡ -	
	Pendiente de pago (PP)	₡ -	<b>% Ejec.</b>

**(9) Consideraciones relevantes**

Se continúa a la espera de la respuesta por parte de IMSA, al oficio DVP 34-2021-0308 de fecha 15 de julio de 2021 emitido por la Gerencia de Contratación, sobre inconsistencias presentadas en las cantidades y planos enviados por IMSA.

Se realizan trámites relacionados a razonabilidades de precios que corresponden al diseño de la solución del deslizamiento que se presentó en el sector del mirador.

Se está a la espera de que el Mopt envíe informe relacionado a los árboles que podrían requerir Decreto de Conveniencia nacional para su tala.

Una vez que se defina el diseño por parte de la Gerencia de Contrataciones, se procederá a realizar la orden de modificación para incluir los cambios e ítems nuevos del rediseño, con el fin de contar con todo lo requerido para el reinicio de la obra.

**(10) Elaborado y aprobado por:**



Ingeniero (a) de Proyecto:  
 Ing. José Mena Carmona

Gerente:  
 Ing. Pablo Contreras Vásquez

(1) Fecha informe: 02/02/2022  
Periodo que reporta: Enero 2022


(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

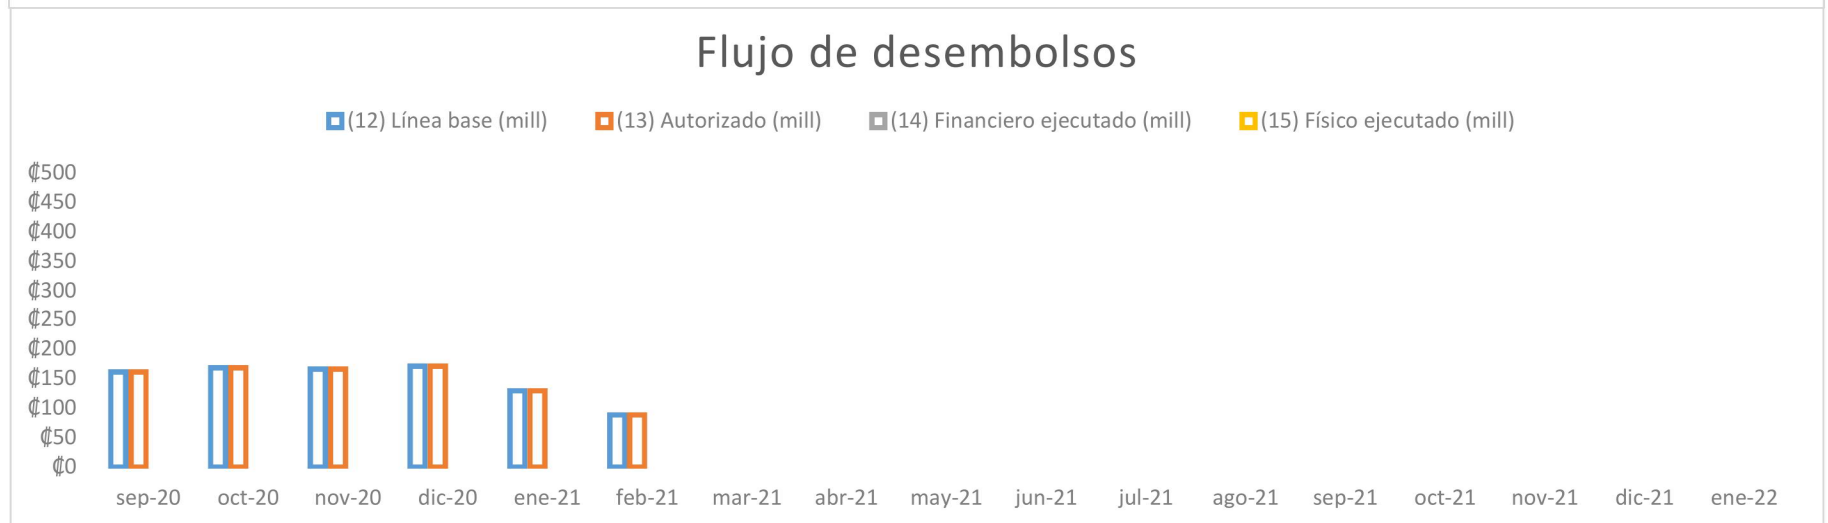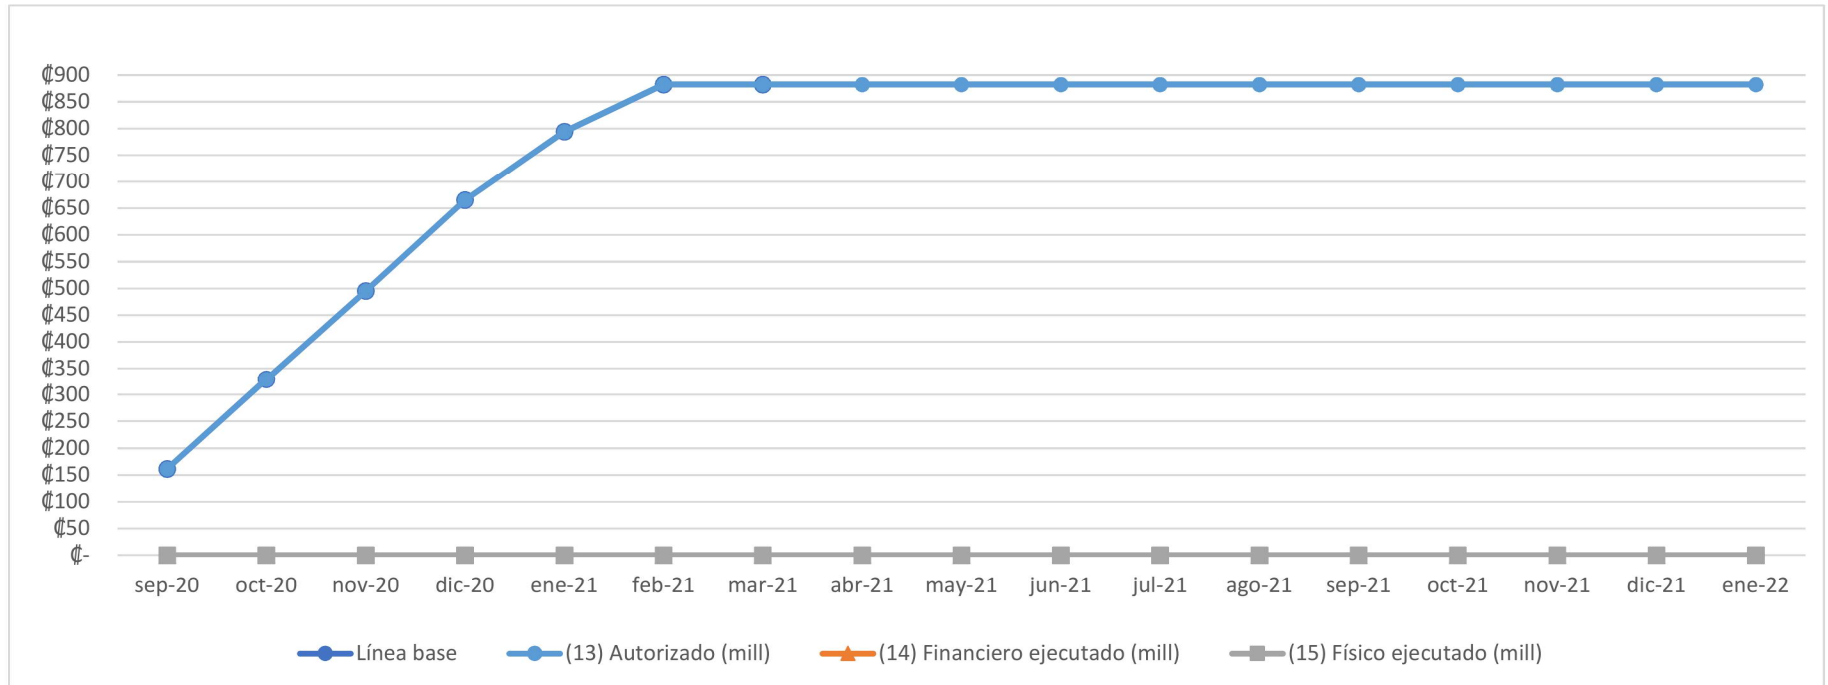

(6) Estado del proyecto: Suspendido

## Escala de tiempo del proyecto

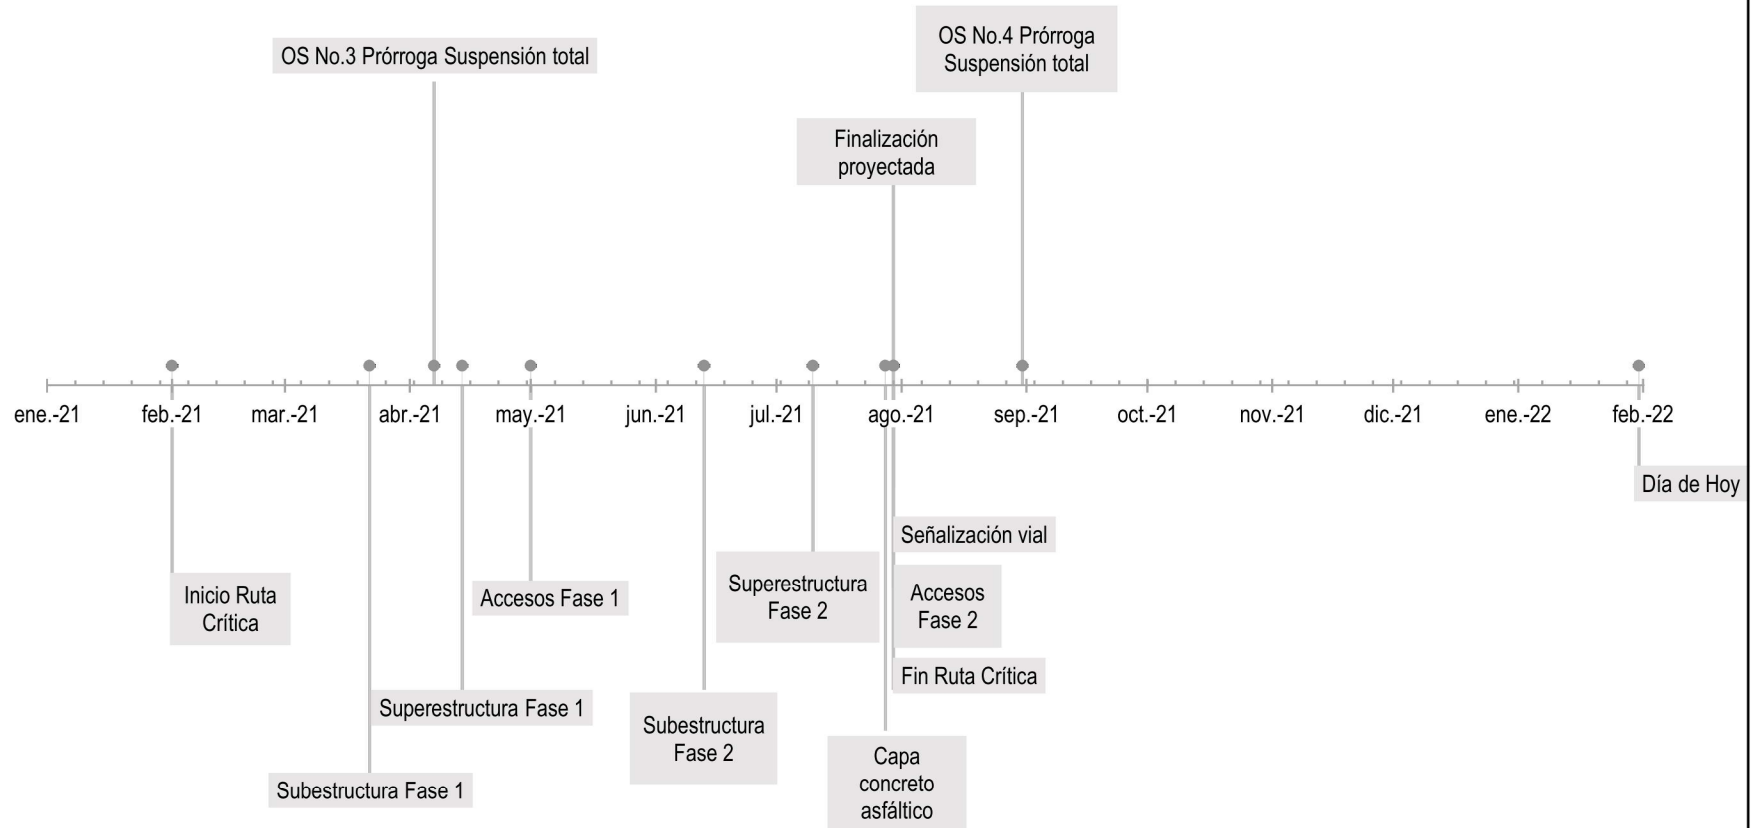

## Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 02/02/2022  
Periodo que reporta: Enero 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3)Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

### Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
O.S. No.1 (Inicio de labores) 04/09/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.2 (Suspensión total de labores) 04/09/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.3 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2) 07/04/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.4 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2 y prorrogada con O.S. No.3) 31/08/2021	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 02/02/2022  
Periodo que reporta: Enero 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

**Registro fotográfico**

No se adjunta registro fotográfico debido a que el proyecto se encuentra suspendido.

(6) Estado del proyecto: Suspendido
