
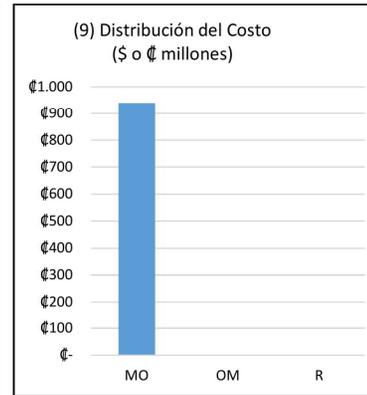


**(3) Proyecto:** "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

<b>(5) Unidad encargada</b>	<b>Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)</b>
<b>Encargado</b>	Ing. José Mena Carmona
<b>Teléfono / Correo</b>	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr
<b>Fuente Financiamiento</b>	Fondo Vial
<b>Contratista/Supervisora</b>	CODOCSA S.A / GCVP

**(6) Descripción:** Realizar la construcción del puente sobre el Río Poás y sus accesos, en la Ruta Nacional No. 107, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantones: 01 Alajuela y 08 Poás; Distritos: 07 Sabanilla (Alajuela) y 01 San Pedro (Poás). Sección: 20380 y 20390.  
 Obras a realizar:  
 -Desarmar, trasladar y descargar el puente metálico lanzable existente y depositarlo en el Plantel Colima, en Santo Domingo de Heredia.  
 -Demoler la estructura del puente existente.  
 -Construir la subestructura y superestructura, del puente sobre el río Poás.  
 -Construir los accesos de aproximación.  
 -Colocar el señalamiento vial correspondiente.  
 La intervención total comprende aproximadamente 0,045 kilómetros.

<b>(7) PLAZO</b>	Orden de Inicio	4/9/2020	<b>1%</b>
	Plazo contractual (PC)	180 días	
	Eventos compens. (EC)	0 días	
	Plazo por suspensión (PS)	572 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	180 días	
	Última suspensión	6/3/2022	<b>% Avance</b>
	Plazo utilizado	2 días	
Fecha de Finalización		INDEFINIDA	

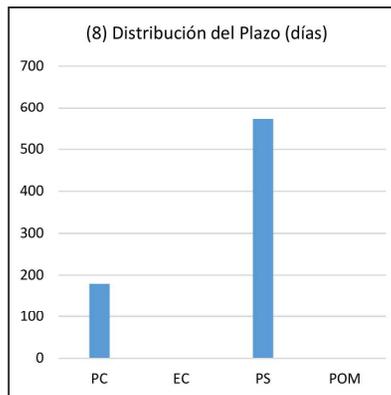

<b>(8) COSTO</b>	Monto de oferta (MO)	₡ 940.552.331,32	<b>0%</b>
	Orden Modificación (OM)	₡ -	
	Reajustes (R)	₡ -	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 940.552.331,32	
	Financiero Ejec.	₡ -	<b>% Ejec.</b>
	Pendiente de pago (PP)	₡ -	

**(9) Consideraciones relevantes**

**(10) Elaborado y aprobado por:**

Se continúa a la espera de la respuesta por parte de IMSA, al oficio DVP 34-2021-0308 de fecha 15 de julio de 2021 emitido por la Gerencia de Contratación, sobre inconsistencias presentadas en las cantidades y planos enviados por IMSA.

Con respecto al deslizamiento que se presentó en el sector del mirador. Se realizaron las ordenes de servicio 5, 6 y 7, por medio de las cuales se reinicia, suspende parcialmente y se autoriza trabajo del ítem CR.110.06 Trabajos a costo más porcentaje. Las mismas fueron autorizadas mediante oficios GCTR-31-22-0158 (1138), GCTR-31-22-0159 (1138) y GCTR-31-22-0160 (1138) respectivamente, todos de fecha 04 de marzo de 2022. Los trabajos adicionales se encuentran en proceso, para brindar un diseño que genere estabilidad al deslizamiento presentado.

El 10 de marzo de 2022 se recibió el oficio DSEC-2022-58, por medio del cual se remite el "Informe Inventario Forestal para obras de construcción de puente sobre ruta 107, Sabanilla de Alajuela", que concluye textualmente lo siguiente: "Como los árboles se encuentran dentro de áreas de protección de ríos y quebradas, es necesario que se elabore un decreto de conveniencia nacional que respalde dicha corta, según se establece en el artículo 34 de la ley forestal 7575". Razón por la cual mediante oficio GCTI-15-22-0186 (1138) de fecha 14 de marzo de 2022 la ingeniería de proyecto solicita a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes los trámites correspondientes para obtener el Decreto de Conveniencia Nacional requerido.

Con respecto a la contratación de servicios de verificación de calidad requerido para el proyecto, el pasado 30 de marzo de 2022 se realizó la Resolución de Inicio N°R-GCTT-0033-2022.

Una vez que se defina el diseño por parte de la Gerencia de Contrataciones, se procederá a realizar la orden de modificación para incluir los cambios e ítems nuevos del rediseño, con el fin de contar con todo lo requerido para el reinicio de la obra.


Ingeniero (a) de Proyecto:  
 Ing. José Mena Carmona

Gerente:  
 Ing. Pablo Contreras Vásquez

(1) Fecha informe: 05/04/2022  
Periodo que reporta: Marzo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

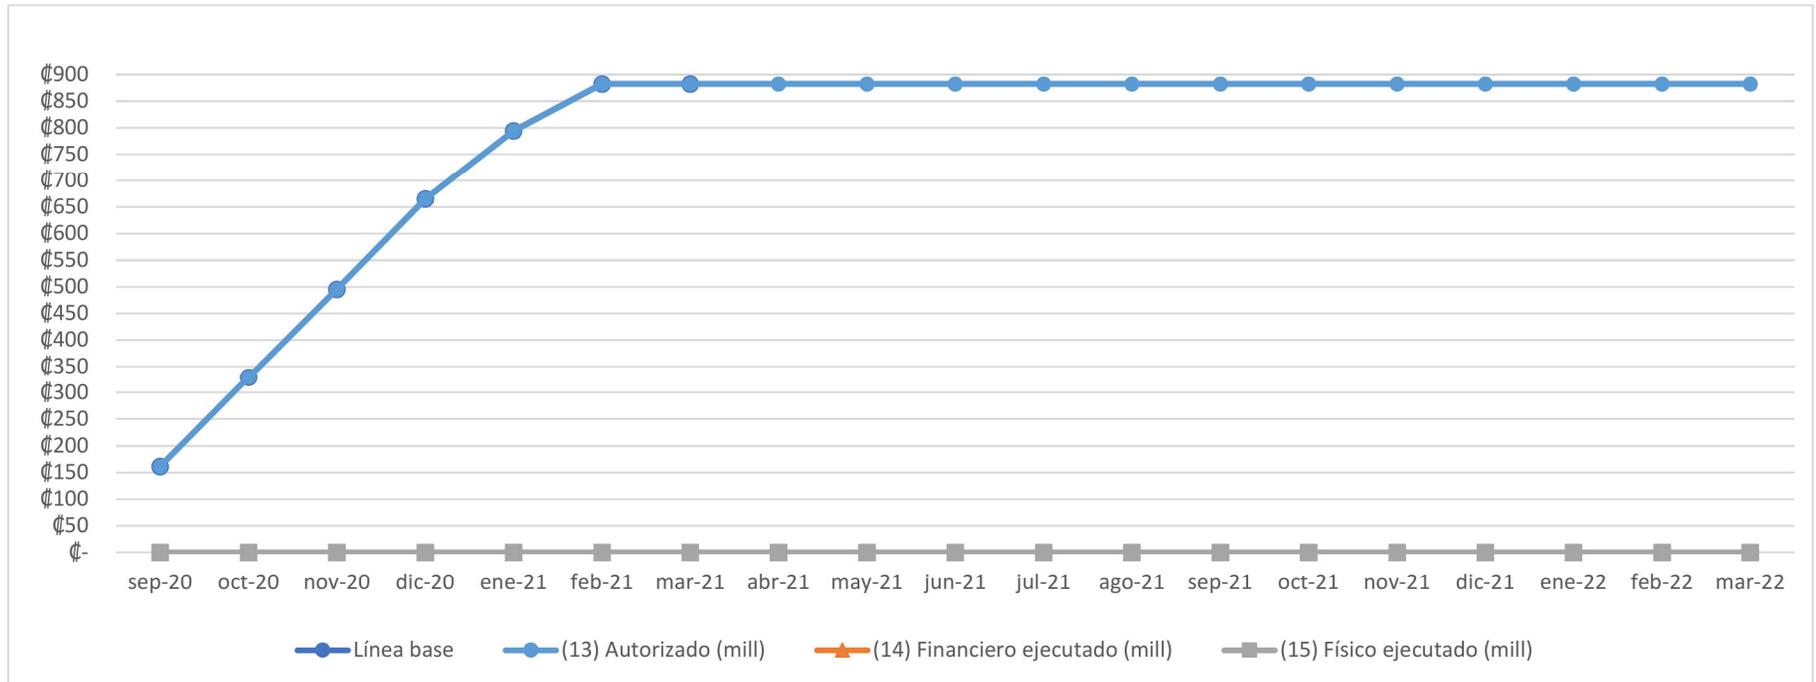


### Flujo de desembolsos



(6) Estado del proyecto: Suspendido

## Escala de tiempo del proyecto

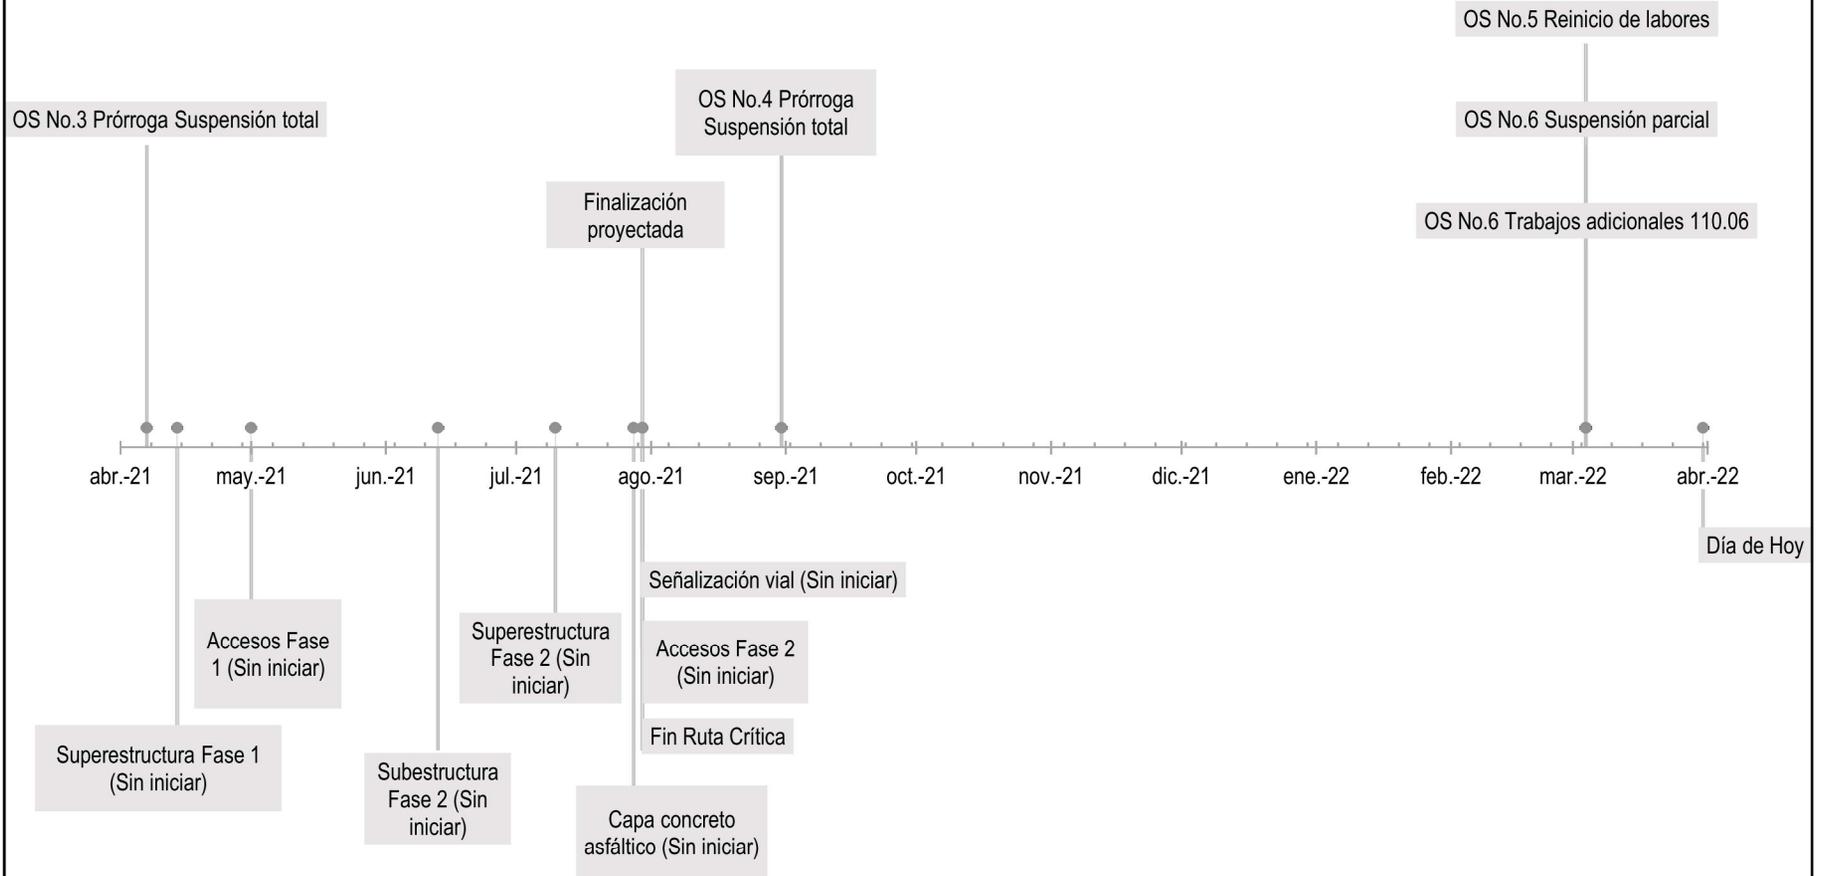

## Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 05/04/2022  
Periodo que reporta: Marzo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3)Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

### Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
O.S. No.1 (Inicio de labores) 04/09/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.2 (Suspensión total de labores) 04/09/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.3 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2) 07/04/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.4 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2 y prorrogada con O.S. No.3) 31/08/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.5 (Reinicio de labores) 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.6 (Suspensión parcial de labores) 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 05/04/2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Periodo que reporta: Marzo 2022

O.S. No.7 (Trabajos adicionales CR.110.06) 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada
---	---	---	---	---	----------

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 05/04/2022  
Periodo que reporta: Marzo 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

### **Registro fotográfico**

No se adjunta registro fotográfico debido a que el proyecto se encuentra suspendido.

(6) Estado del proyecto: Suspendido
