
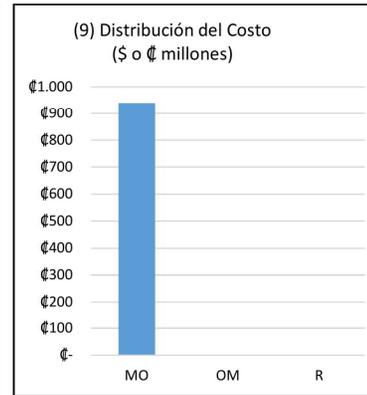


(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

(5) Unidad encargada	Gerencia de Construcción de Vías y Puentes (GCVP)
Encargado	Ing. José Mena Carmona
Teléfono / Correo	8701-5578; jose.mena@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Fondo Vial
Contratista/Supervisora	CODOCSA S.A / GCVP

(6) Descripción: Realizar la construcción del puente sobre el Río Poás y sus accesos, en la Ruta Nacional No. 107, ubicado en la Provincia: 2 Alajuela; Cantones: 01 Alajuela y 08 Poás; Distritos: 07 Sabanilla (Alajuela) y 01 San Pedro (Poás). Sección: 20380 y 20390.
 Obras a realizar:
 -Desarmar, trasladar y descargar el puente metálico lanzable existente y depositarlo en el Plantel Colima, en Santo Domingo de Heredia.
 -Demoler la estructura del puente existente.
 -Construir la subestructura y superestructura, del puente sobre el río Poás.
 -Construir los accesos de aproximación.
 -Colocar el señalamiento vial correspondiente.
 La intervención total comprende aproximadamente 0,045 kilómetros.

(7) PLAZO	Orden de Inicio	4/9/2020	1%
	Plazo contractual (PC)	180 días	
	Eventos compens. (EC)	0 días	
	Plazo por suspensión (PS)	602 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	180 días	
	Última suspensión	6/3/2022	% Avance
	Plazo utilizado	2 días	
Fecha de Finalización		INDEFINIDA	

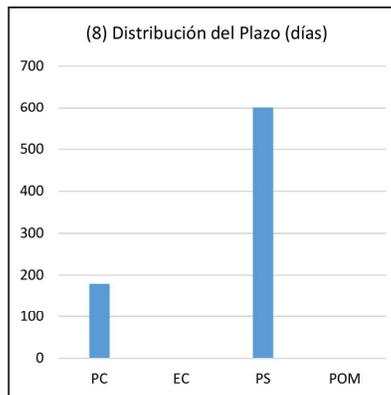

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	₡ 940.552.331,32	0%
	Orden Modificación (OM)	₡ -	
	Reajustes (R)	₡ -	
	Monto total (MO+OM+R)	₡ 940.552.331,32	% Ejec.
	Financiero Ejec.	₡ -	
	Pendiente de pago (PP)	₡ -	

(9) Consideraciones relevantes


(10) Elaborado y aprobado por:

<p>Se continúa a la espera de la respuesta por parte de IMSA, al oficio DVP 34-2021-0308 de fecha 15 de julio de 2021 emitido por la Gerencia de Contratación, sobre inconsistencias presentadas en las cantidades y planos enviados por IMSA.</p> <p>Con respecto al deslizamiento que se presentó en el sector del mirador. El contratista mediante nota CODO-OF-20-2022 de fecha 8 de abril de 2022, remite el informe y los planos de la obra de retención para la estabilización del deslizamiento ocurrido en la aproximación de la margen derecha del río Poás. El mismo se remitió a la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes para su respectiva revisión por medio del oficio GCTI-15-22-0262 (1138) de fecha 20 de abril de 2022. Mediante oficio DVP-20-2022-0197 de fecha 27 de abril de 2022 la Dirección de diseño de vías y Puentes indica que "...respecto a las memorias de la revisión estructural, tanto para los anclajes como la de la pantalla de concreto lanzado que le acompañará, no fue incluida en lo provisto para valoración, por lo que no se podrá validar técnicamente su incorporación al proyecto, hasta que se subsane lo correspondiente y aún cuando lo planteado, sea consistente con las prácticas usuales en la materia...". Por lo cual, se remitió al contratista mediante oficio GCTI-15-22-0281 (1138) de fecha 29 de abril de 2022 para el subsane correspondiente.</p> <p>El trámite correspondiente al Decreto de Conveniencia Nacional necesario para realizar la corta de árboles respectiva en el proyecto, se encuentra en trámite a cargo de la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes</p> <p>Con respecto a la contratación de servicios de verificación de calidad requerido para el proyecto, la misma se encuentra en proceso.</p> <p>Una vez que se defina el diseño por parte de la Gerencia de Contrataciones, se procederá a realizar la orden de modificación para incluir los cambios e ítems nuevos del rediseño, con el fin de contar con todo lo requerido para el reinicio de la obra.</p>	<p>_____</p> <p>Ingeniero (a) de Proyecto: Ing. José Mena Carmona</p> <p>_____</p> <p>Gerente: Ing. Pablo Contreras Vásquez</p>
--	---

(1) Fecha informe: 04/05/2022
Periodo que reporta: Abril 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3) Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

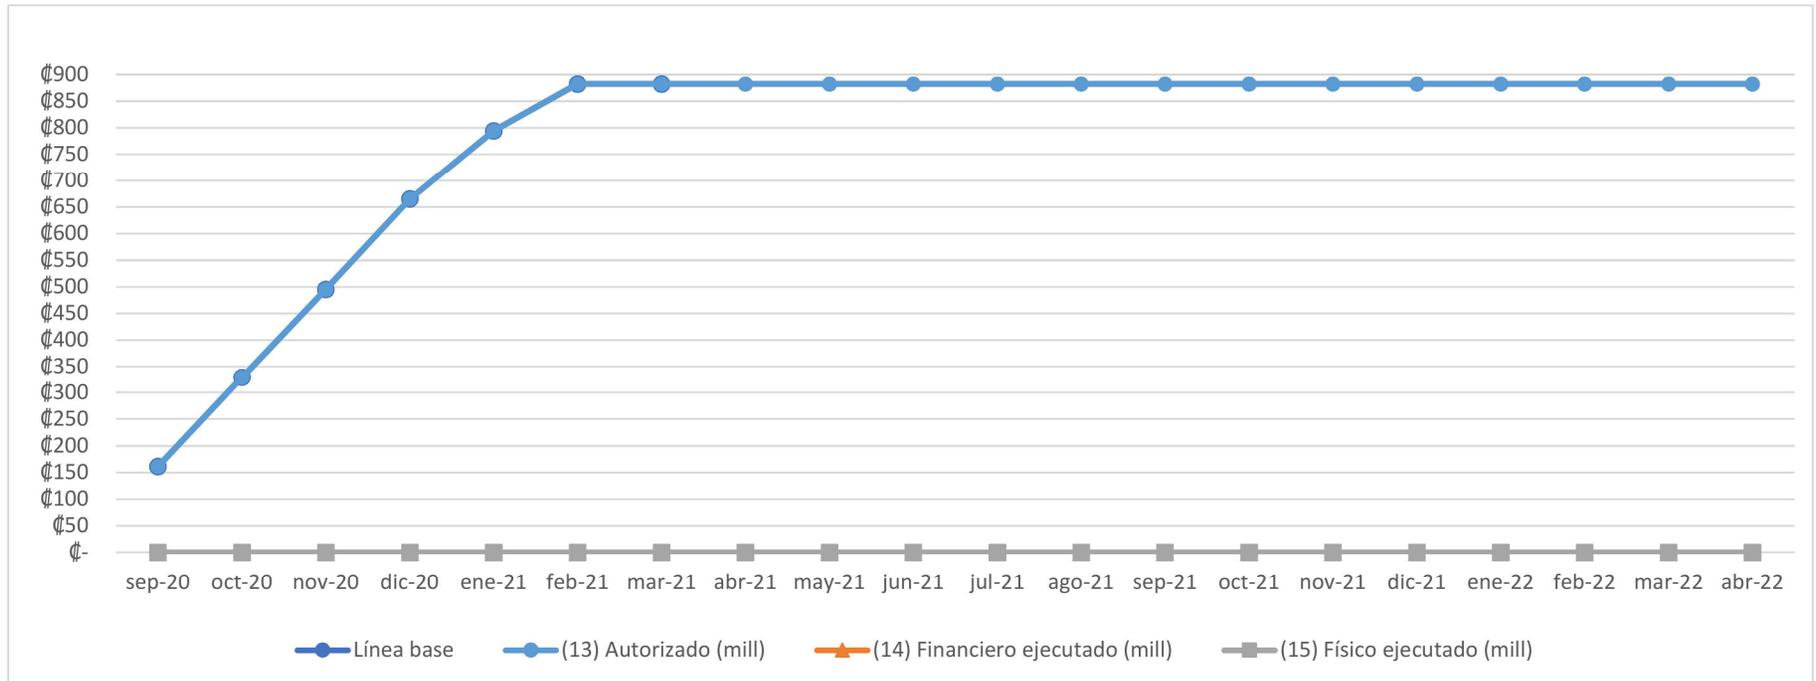


Flujo de desembolsos



(6) Estado del proyecto: Suspendido

Escala de tiempo del proyecto

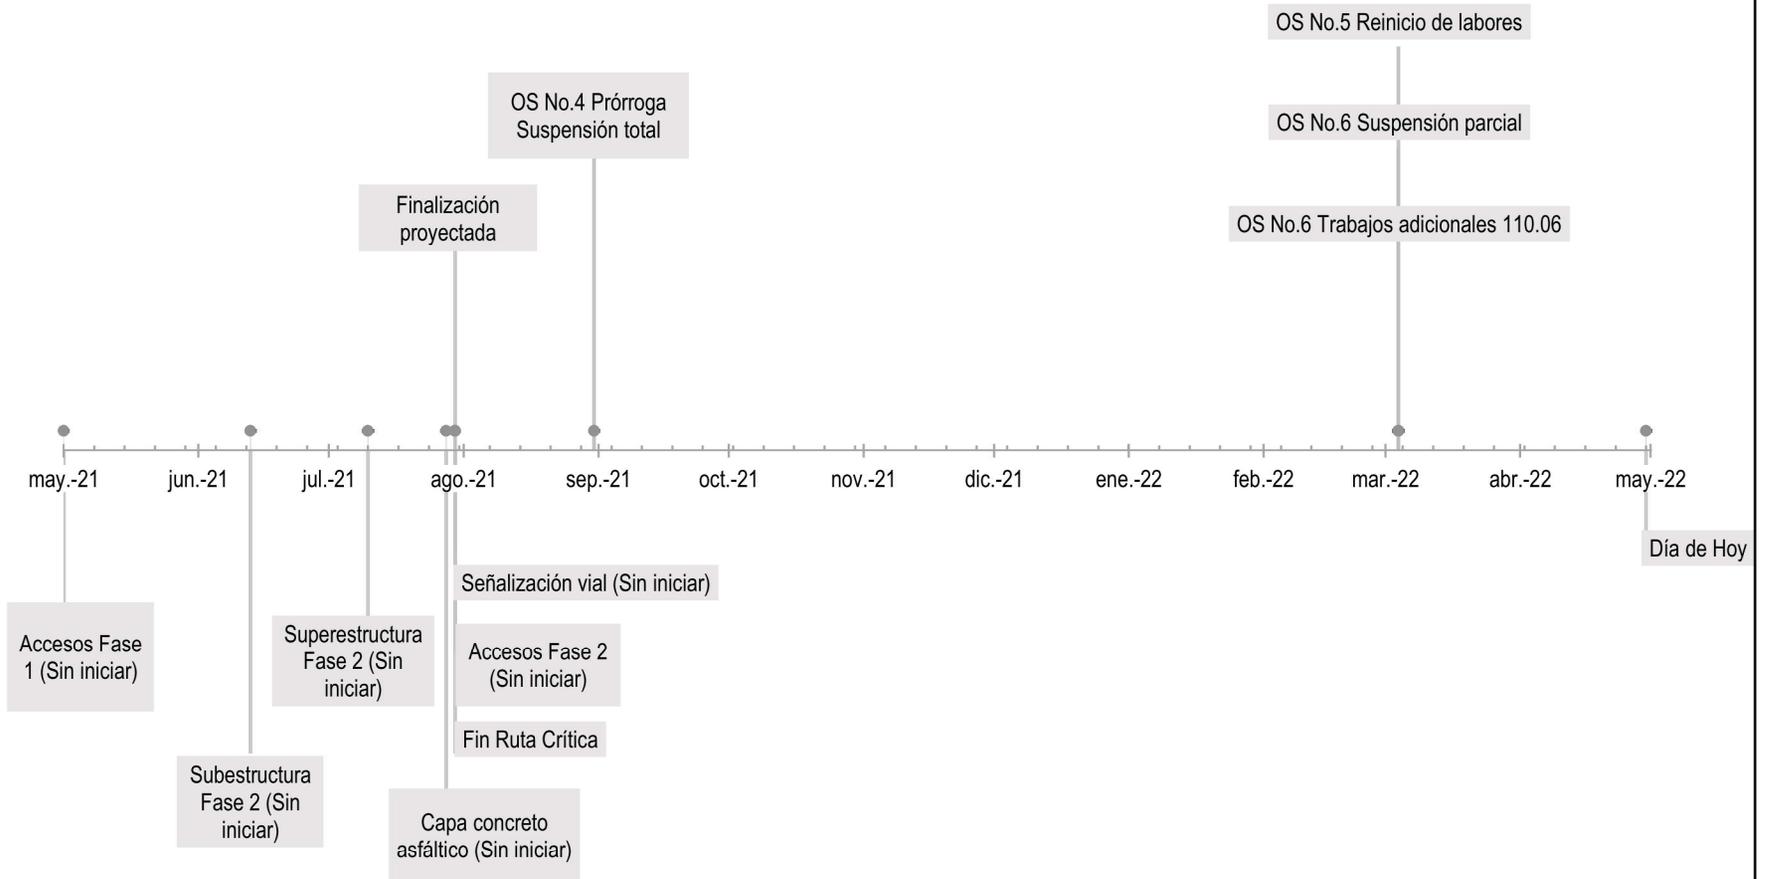

Ruta Crítica del proyecto

(1)Fecha informe: 04/05/2022
Periodo que reporta: Abril 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

(3)Proyecto: "Construcción del puente sobre el Río Poás, Ruta Nacional No. 107". Licitación Pública No. 2019LN-000008-0006000001.

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
O.S. No.1 (Inicio de labores) 04/09/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.2 (Suspensión total de labores) 04/09/2020	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.3 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2) 07/04/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.4 (Prórroga Suspensión total de labores de O.S. No.2 y prorrogada con O.S. No.3) 31/08/2021	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.5 (Reinicio de labores) 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada
O.S. No.6 (Suspensión parcial de labores) 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 04/05/2022
Periodo que reporta: Abril 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

O.S. No.7 (Trabajos adicionales CR.110.06) 04/03/2022	-	-	-	-	Aprobada
---	---	---	---	---	----------

(6) Estado del proyecto: Suspendido

(1) Fecha informe: 04/05/2022
Periodo que reporta: Abril 2022

(2) Tipo de trabajo: Obra nueva

Registro fotográfico

No se adjunta registro fotográfico debido a que el proyecto se encuentra suspendido.

(6) Estado del proyecto: Suspendido
