

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 70


MES: JUNIO 2024






|         |  |                     |   |
|---------|--|---------------------|---|
| OBRA    | Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo | CONTRATISTA         | China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.                |
| SECCION | Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón                              | GESTOR DEL PROYECTO | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS). |

| DATOS DEL CONTRATO  |                  |  |                           |
|---|------------------|--|---------------------------|
| Contrato No.  | CONAVI-CHEC-001  | Fecha Orden de Inicio diseño                 | 14 de diciembre 2016      |
| Total Contrato (Diseño + Construcción)  | \$465,593,387.06 | Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)       | 30 de septiembre 2017     |
| Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos  | \$44,000,000.00  | Fecha Orden de Inicio construcción           | 20 de noviembre 2017      |
| Inversión para la Administración del Contrato   | \$45,955,507.00  | Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 19) | <b>28 de mayo de 2025</b> |
| Reclamos  | \$24,583,915.64  | Plazo Original de Contrato D + C             | 1291 días                 |
| Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos) | \$580,132,809.70 |  |                           |

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

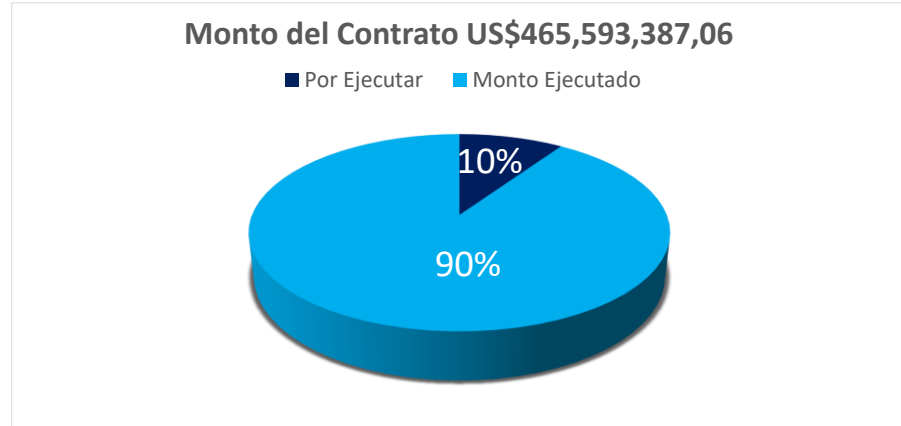

AVANCE FÍSICO

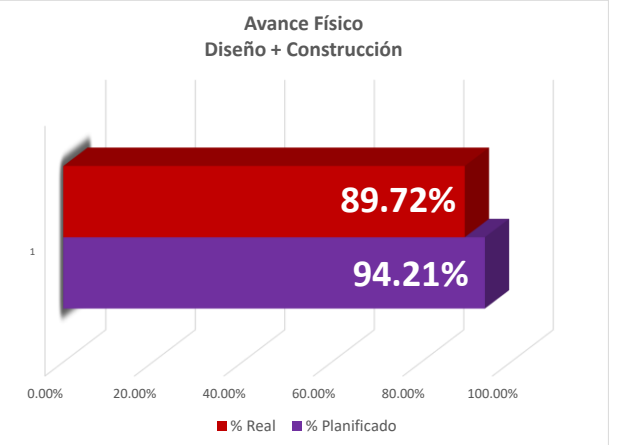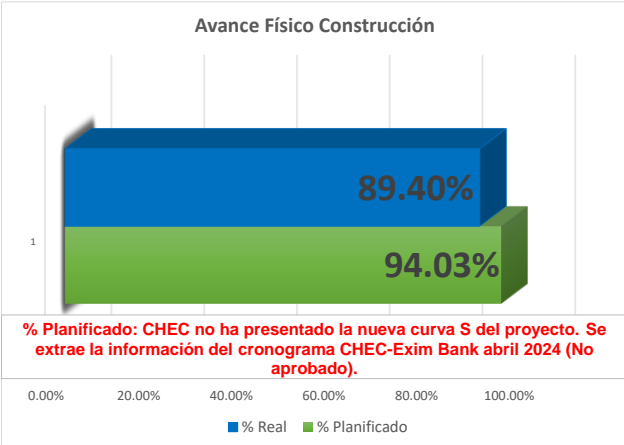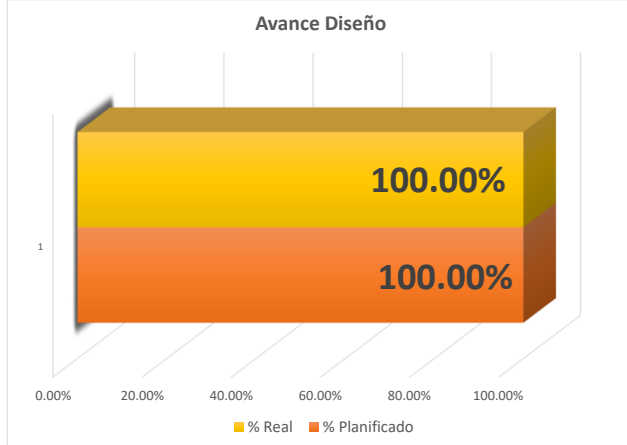


INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 70

MES: JUNIO 2024




|         |  |                     |   |
|---------|--|---------------------|---|
| OBRA    | Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo | CONTRATISTA         | China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.                |
| SECCION | Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón                              | GESTOR DEL PROYECTO | Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS). |

EXPROPIACIONES

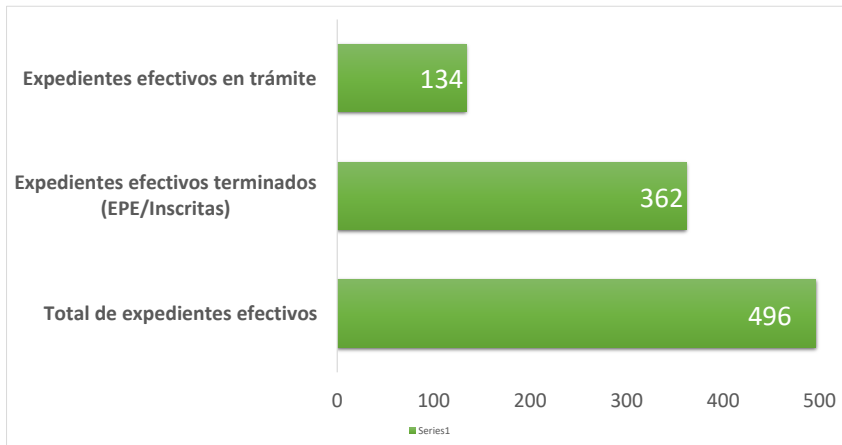


REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

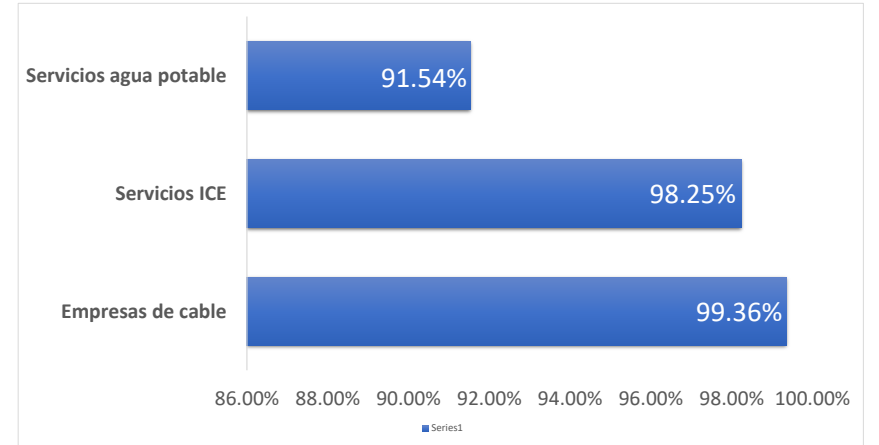

RESUMEN ESTADO GESTIÓN SOCIAL

Para el mes de junio se atendieron un total de 68 consultas nuevas y se dio seguimiento a 93 consultas anteriores. El siguiente gráfico describe el estado de las consultas.

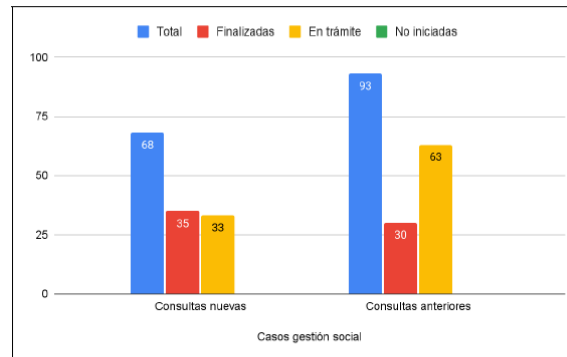

La siguiente tabla describe la distribución por cantón de las consultas.

| ID | Cantón    | Casos abordados | No iniciados | En trámite | Finalizados |
|----|-----------|-----------------|--------------|------------|-------------|
| 1  | Pococí    | 10              | 0            | 3          | 7           |
| 2  | Guácimo   | 10              | 0            | 5          | 5           |
| 3  | Siquirres | 16              | 0            | 11         | 5           |
| 4  | Matina    | 21              | 0            | 12         | 9           |
| 5  | Limón     | 11              | 0            | 1          | 9           |
