


Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón

\$ 432.66	\$ 407.50	\$ 404.66	\$ 451.63	\$ -28.00	\$ -2.84	2819 días	0.94	0.99	1.06
PV	AC	EV	BAC	SV	CV	EACt	SPI	CPI	TCPI

PLAZO	Orden de Inicio	20-nov-17	89%
	Plazo contractual (PC)	1049 días	
	Eventos compens. (EC)	1697 días	
	Plazo por suspensión (PS)	0 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	2746 días	
	Última suspensión	N.A.	
	Plazo utilizado	748 días	%
Fecha de Finalización	28-may-25	Avan.	

COSTO	Monto de oferta (MO)	\$ 451.63	90%
	Orden Modificación (OM)	\$ -	
	Reajustes (R)	\$ -	
	Monto total (MO+OM+R)	\$ 451.63	%
	Financiero Ejec.	\$ 407.50	
	Pendiente de pago (PP)	\$ -	
			Ejec.

Fuente Financiamier	Costa Rica/China
Contratista/Supervis	CHEC

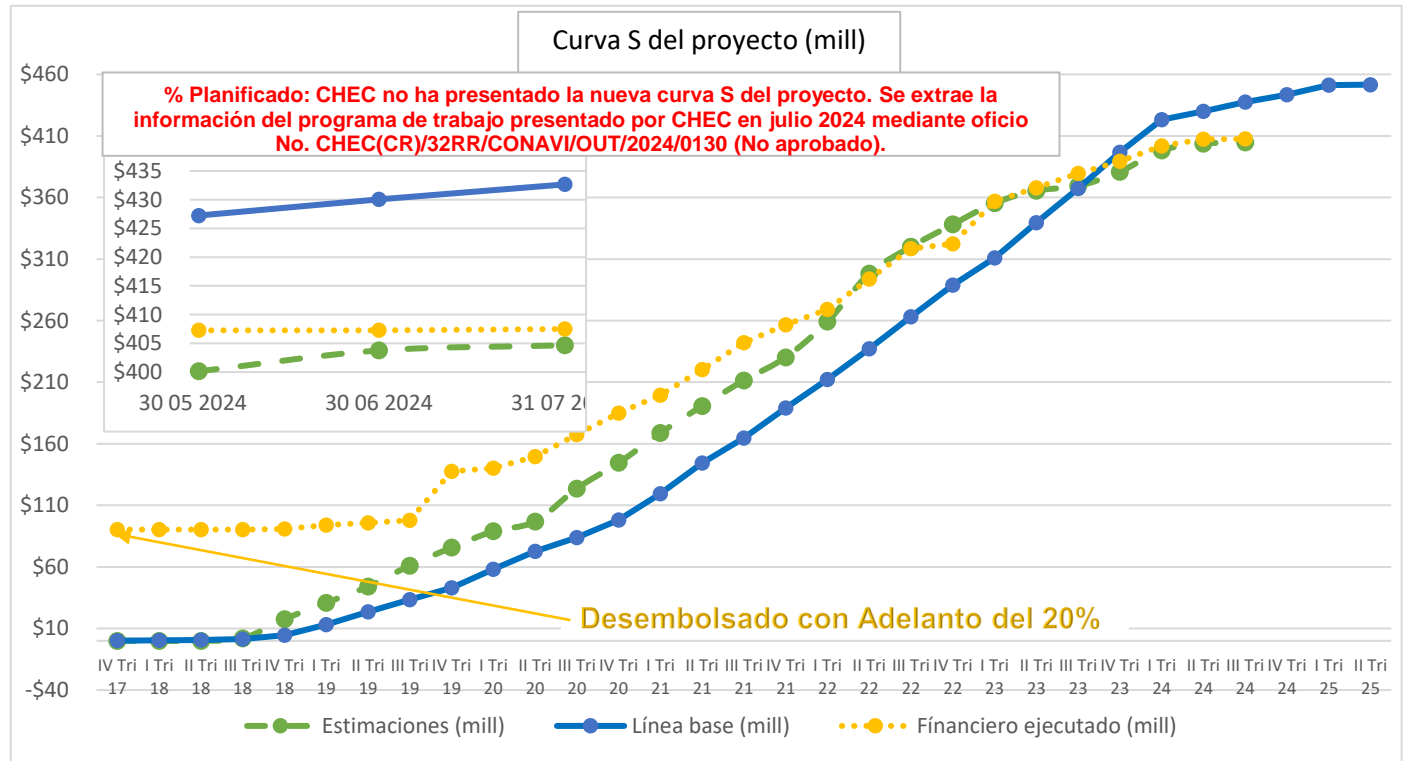

Fotografía

Consideraciones relevantes



Km 91+000, PSV La Francia

Mediante O.S. No. 19 de CHEC, se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 28 de mayo de 2025 por eventos compensables al Contratista. Sólo se va a realizar en análisis de valor ganado en ésta línea ya que es la rehabilitación y construcción de obra que es una de las etapas más fuertes del proyecto y se está ejecutando en estos momentos.

