

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 74


MES: OCTUBRE 2024






OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$44,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$45,955,507.00	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 19)	28 de mayo de 2025
Reclamos	\$24,583,915.64	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos)	\$580,132,809.70		

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

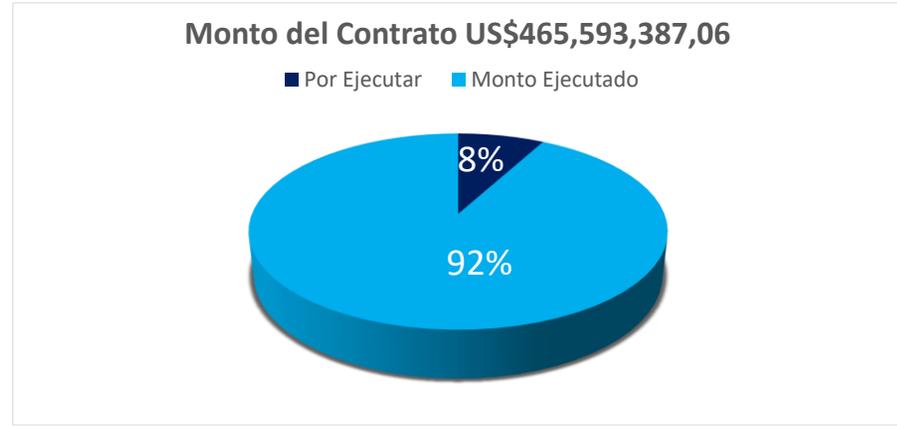

AVANCE FÍSICO

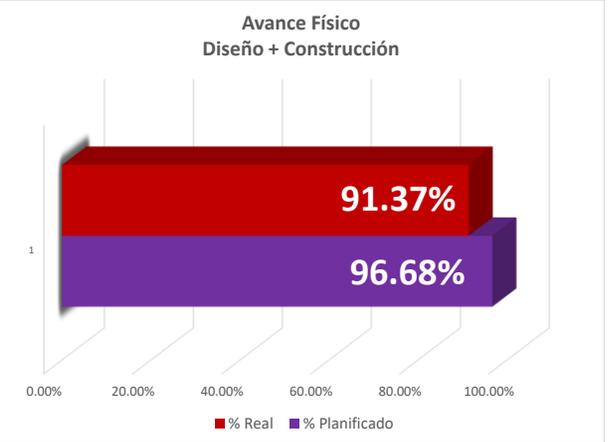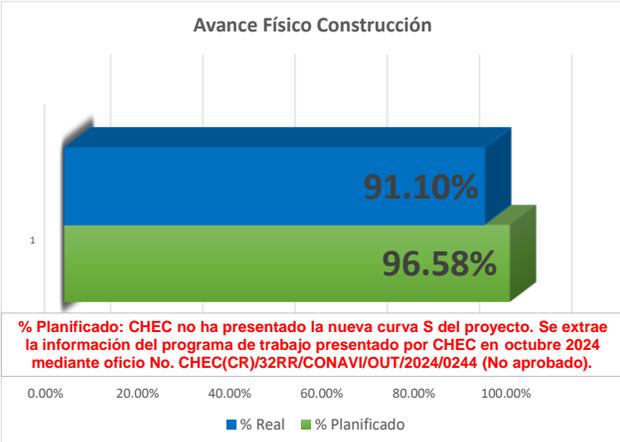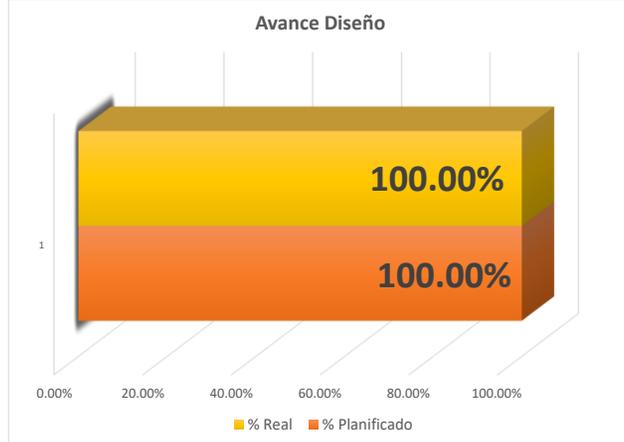


INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 74

MES: OCTUBRE 2024




OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

EXPROPIACIONES

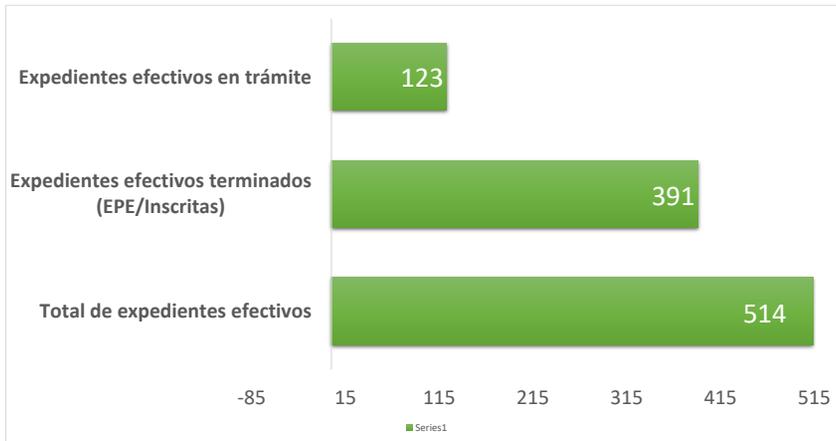

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

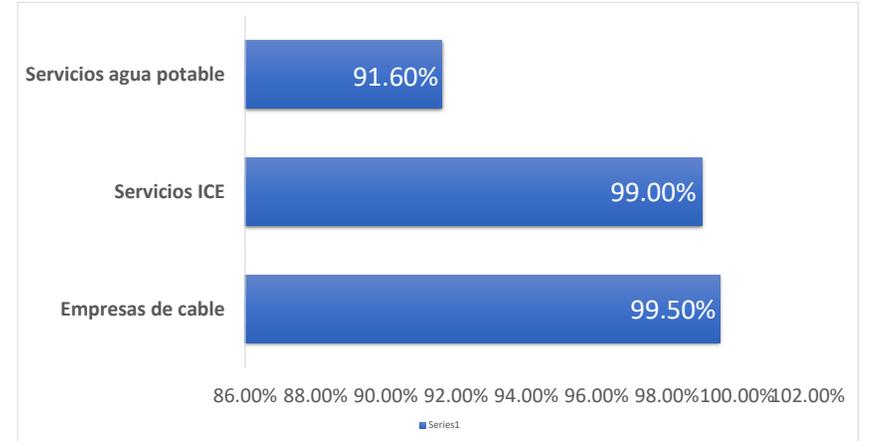

RESUMEN ESTADO GESTIÓN SOCIAL

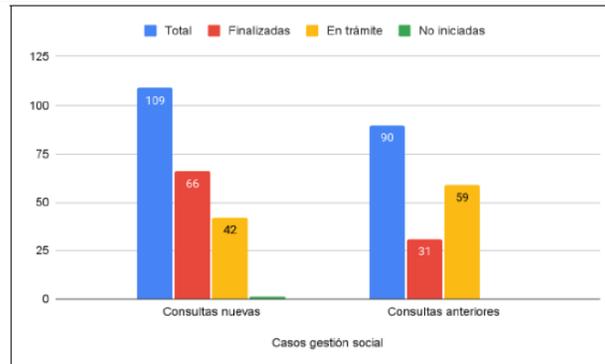


Figura 6. Casos de gestión social al mes de octubre 2024

La siguiente tabla describe la distribución por cantón de las consultas.

ID	Cantón	Casos registrados	No iniciados	En trámite	Finalizados
1	Pococí	11	0	6	5
2	Guácimo	15	0	7	8
3	Siquirres	39	1	18	20
4	Matina	30	0	9	21
5	Limón	14	0	2	12
