





(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso

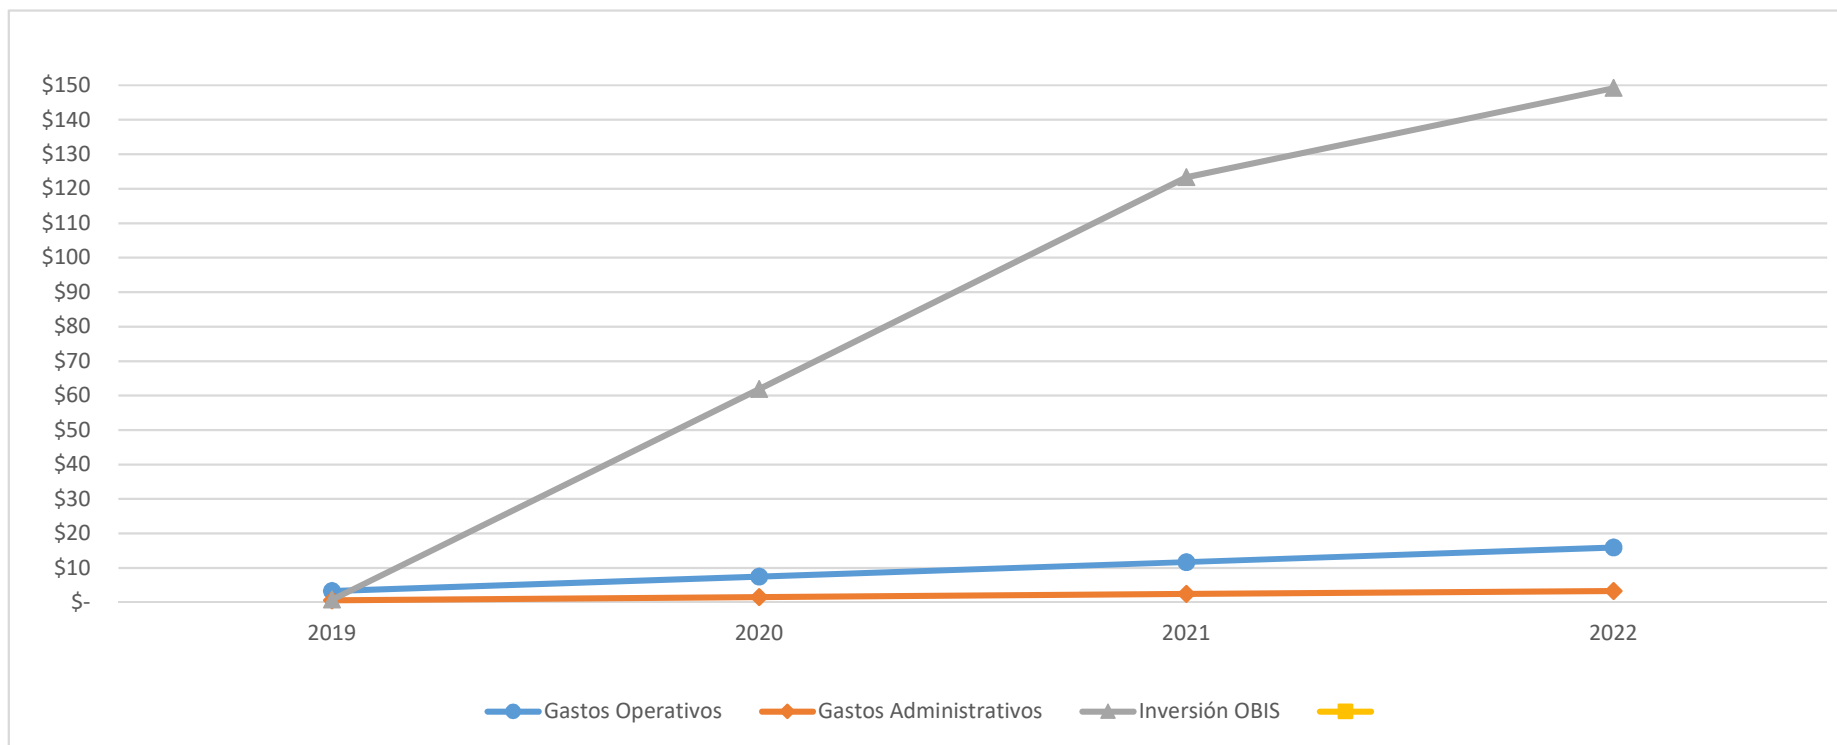

## Escala de tiempo del proyecto

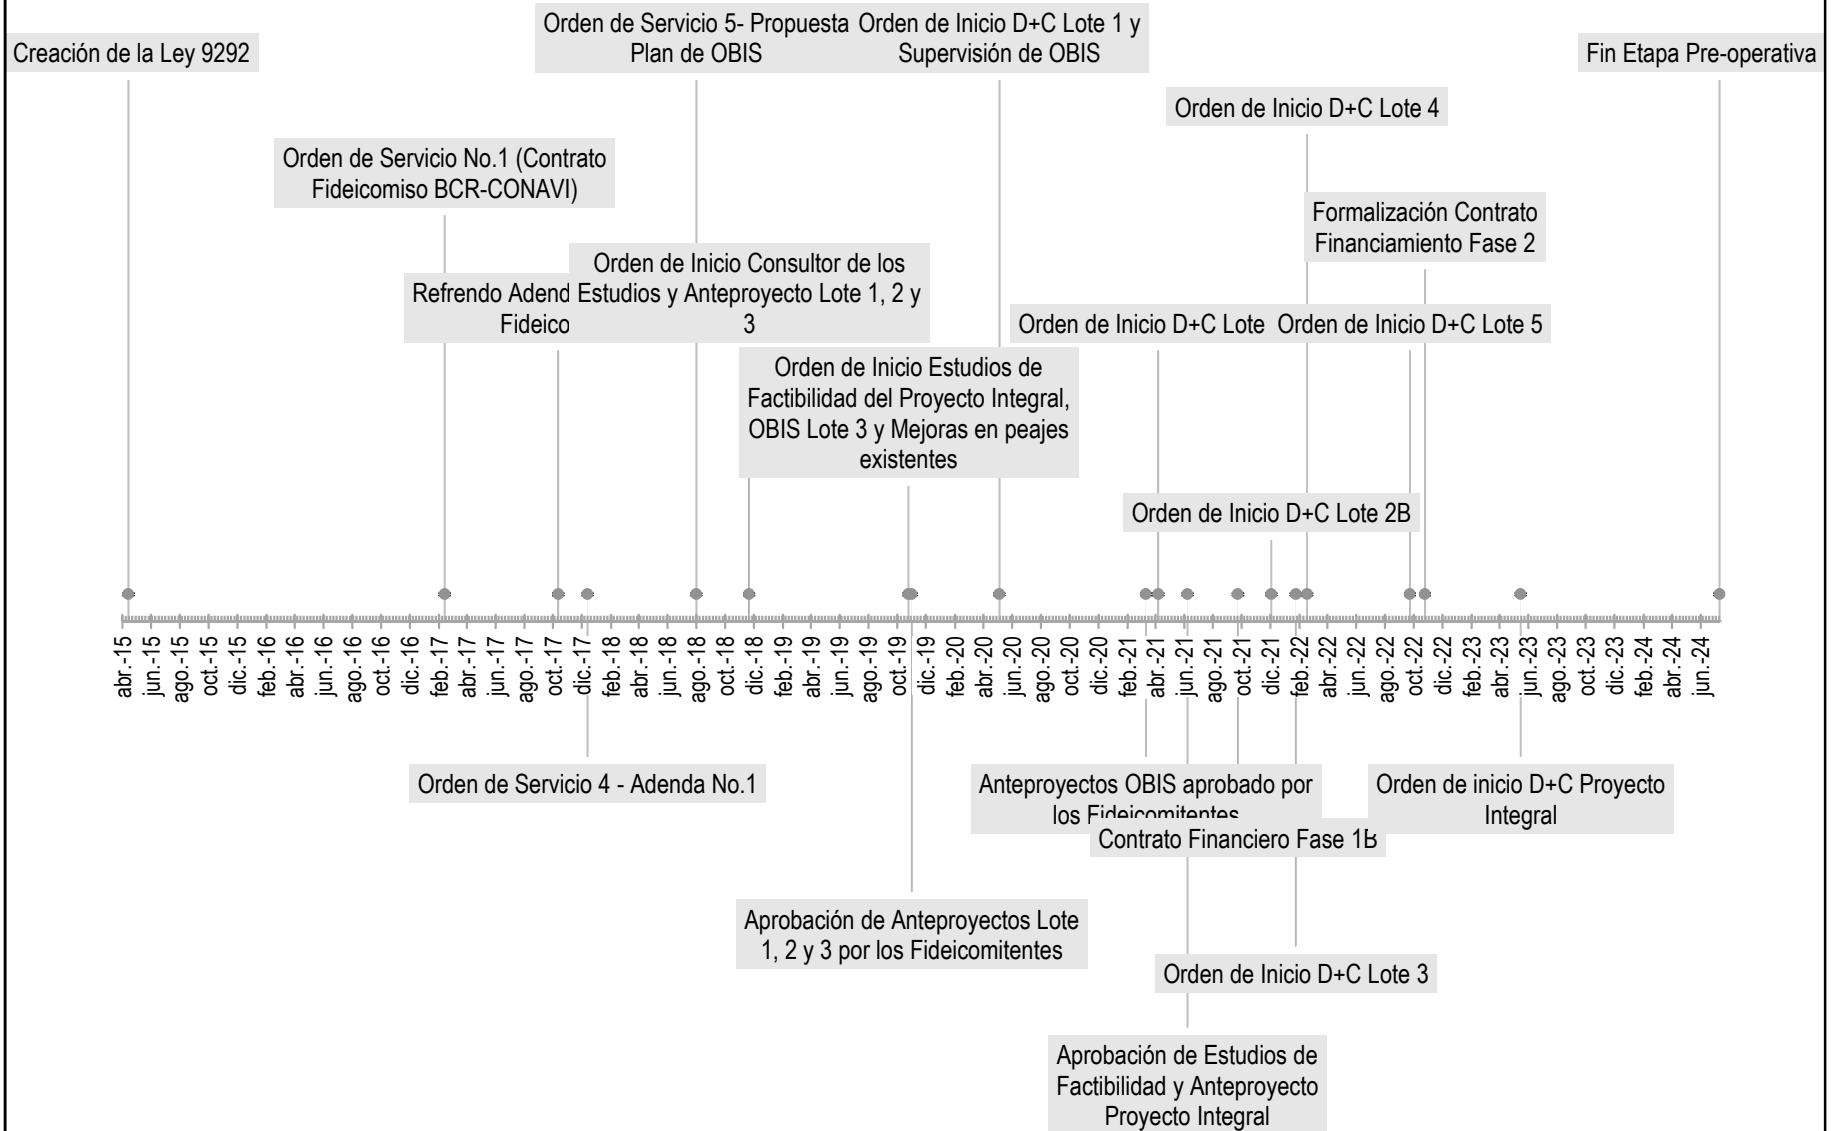

(3) Proyecto: Ley 9292 Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso

Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
Orden de Modificación No 1, 10 de abril 2018.	La orden de modificación en mención no modifica el monto ni el plazo del contrato.	Únicamente determina la metodología a seguir para el diseño y la estructuración financiera por fases y sub-fases, e incorpora los plazos de entrega de los informes de Diseño y Estructuración Financiera de las sub fases 1A y 1B.	La orden de modificación en mención no modifica el monto ni el plazo del contrato.	Únicamente determina la metodología a seguir para el diseño y la estructuración financiera por fases y sub-fases, e incorpora los plazos de entrega de los informes de Diseño y Estructuración Financiera de las sub fases 1A y 1B.	Aprobada, mediante oficio UESR-01-2018-0114 del 12 de abril del 2018
Orden de servicio No 1, 07 de febrero 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	Mediante oficio 13-17-0382 (41), se le brinda la orden de inicio al Banco de Costa Rica en su calidad de Fiduciario (administrador / ejecutor) del mandato que le dan los fideicomitentes.
Orden de servicio No 2, 15 de febrero 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	Suspensión de la orden de inicio mediante el oficio DIE-13-17-0463 (41) brindada el 07 de febrero del 2017. La razón fue el incumplimiento en el rubro estructura del precio.
Orden de servicio No 3, 30 de mayo 2017	N/A	N/A	N/A	N/A	Se brinda orden de reinicio del fideicomiso oficio DIE-13-17-1639 (41), mediante acuerdo del Consejo (ACA 01-17-0368).
Orden de servicio No 4, 12 diciembre 2017	N/A	N/A	Los montos del contrato original estaban definidos de la siguiente manera: Etapa preoperativa: \$75,000.00 Etapa Constructiva: \$70,000.00 Etapa Operativa: \$65,000.00 Los montos que se definieron y se modifican con la adenda quedan definidos de la siguiente manera: Etapa preoperativa: \$31,069.00 Etapa Constructiva: \$37,173.00 Etapa Operativa: \$38,282.00	Mediante la Adenda No1 firmada el 11 de septiembre del 2017 por las partes y refrendada por la CGR en el oficio No 11936(DCA-2420) del 11 de octubre del 2017, se aprobaron varios cambios al Contrato de Fideicomiso, entre los cuales se modificó la cláusula 8, relativa a los honorarios que percibirá el Fiduciario por la prestación de los servicios originalmente acordados y a los nuevos honorarios por servicios adicionales autorizados en la referida adenda.	Mediante oficio UESR-01-2017-0151 se da el comunicado de aprobación de la orden de servicio número 4 en la cual se le ordena al contratista iniciar a partir del 13 de diciembre del 2017 las labores definidas en la Adenda No1, relacionadas con las actividades de gestión y administración del fideicomiso, como parte del contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y sus radiales, 2016.
Orden de servicio No 5, 01 de agosto 2018	N/A	N/A	N/A	N/A	Aprobada mediante oficio UESR-01-2018-0261, donde se indica: Iniciar: a partir del 6 de agosto de 2018, la participación activa a través de la UAP, en los procedimientos de contratación administrativa para la elaboración de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto Corredor Vial San José - San Ramón, que serán financiados por el MOPT en su calidad de Fideicomitente, con los fondos de los Contratos de Prestamos No 3071/OC-CR y No 3072/CH-CR.
Orden de servicio No 6, 4 de noviembre 2020	No modifica el plazo, del contrato principal	Mediante la adenda No 2 Establecer una estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste así como de las evaluaciones de calidad del servicio, al amparo de artículo 8 de la Ley 9292	No produce incremento alguno al contrato principal	Mediante la adenda No 2 Justifica la bancabilidad y fondeo del Proyecto sobre el Corredor Vial San José - San Ramón, mediante la resolución RE-1517-RG-2020 de fecha 23 de octubre de 2020 de la ARESEP.	Se remite a la Proveeduría mediante el UESR-11-2020-665(707). Se comunica el acuerdo de firma de la adenda mediante el ACA-1-20-555 (74) el día 3 de noviembre del 2020.
