

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 67

MES: MARZO 2024



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).


DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$44,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$45,955,507.00	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 19)	28 de mayo de 2025
Reclamos	\$24,583,915.64	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos)	\$580,132,809.70		

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

Monto del Contrato US\$465,593,387,06


■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

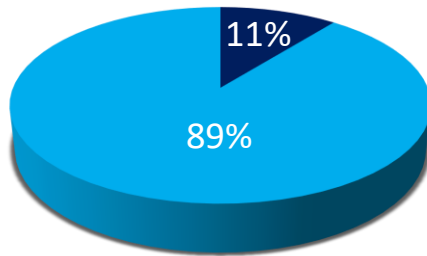


El monto ejecutado de diseño y construcción incluye el monto del desembolso con adelanto del 20% que se le pagó a CHEC al iniciar el proyecto.

AVANCE FÍSICO


Avance Diseño

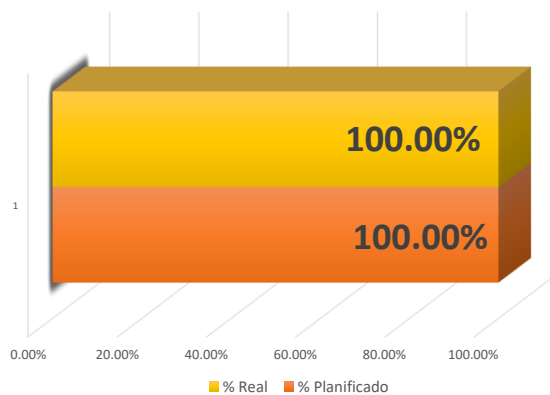

Avance Físico Construcción

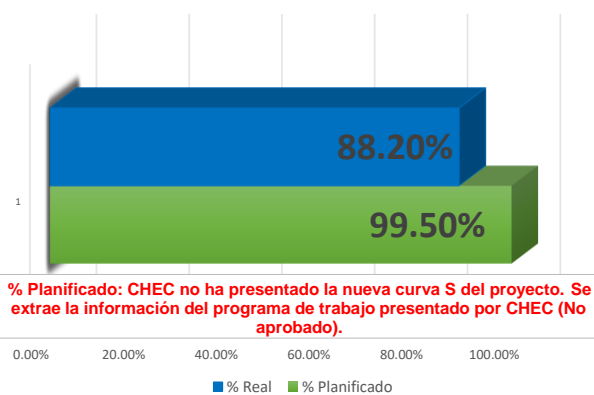

Avance Físico Diseño + Construcción

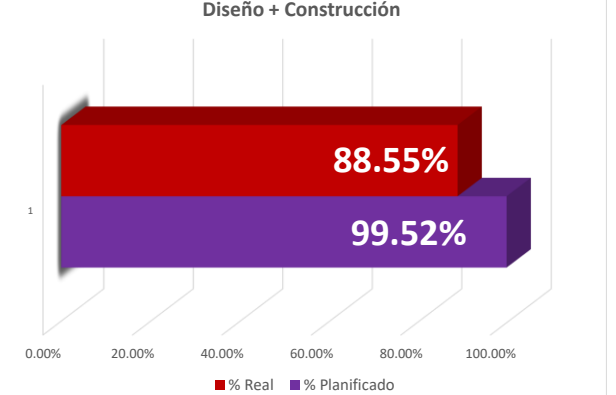


INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 67

MES: MARZO 2024




OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

EXPROPIACIONES

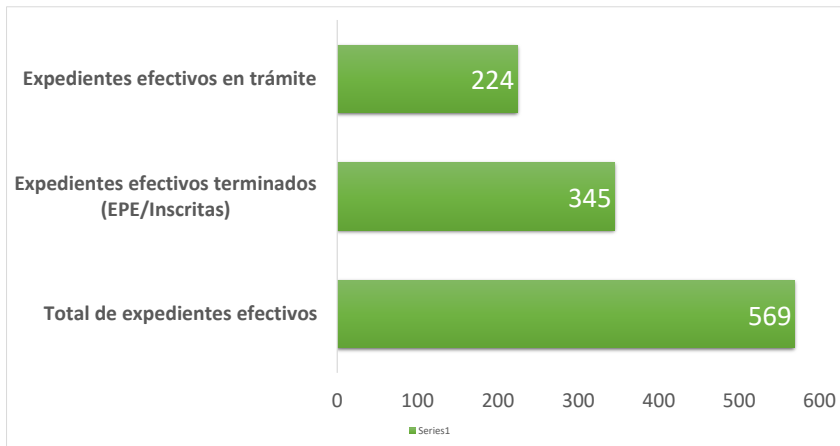

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

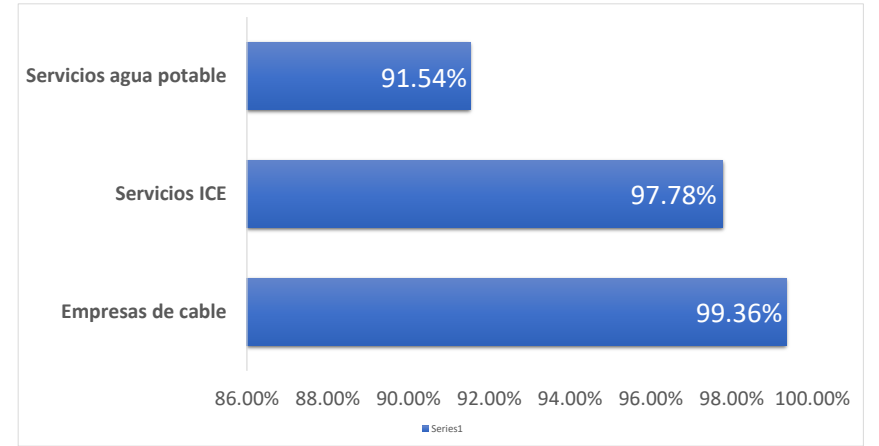

ATENCIÓN GESTIÓN SOCIAL

Para el mes de marzo se atendieron un total de 62 nuevas consultas, las cuales fueron registradas y gestionadas. De estas, 28 fueron cerradas y consideradas como finalizadas, 19 se encuentran en trámite y 11 no fueron iniciadas, de la misma manera se dio seguimientos a consultas correspondientes a meses anteriores para un total de 29, de las cuales, 15 se encuentran finalizadas y 14 en trámite.

De acuerdo a lo anterior se procederá a brindar la especificación de la atención de los casos por cantón:

Cantón de Pococi: Se abordaron y atendieron 11 casos de los cuales se encuentran 7 finalizados y 4 en trámite.

De la misma manera se brindó seguimiento a casos correspondientes a meses anteriores para un total de 2 casos, los cuales se encuentran finalizados.

Cantón de Guácimo: Se abordaron y atendieron 15 casos de los cuales se encuentran 4 finalizados, 6 en trámite y 5 no iniciados.

De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 13 casos, de los cuales se encuentran, 9 finalizados y 4 en trámite.

Cantón de Siquirres: Se abordaron y atendieron 15 casos de los cuales se encuentran 5 finalizados y 8 en trámite y 2 no iniciado

De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 4 casos , de los cuales se encuentran, 1 finalizado y 3 en trámite.

Cantón de Matina: Se abordaron y atendieron 10 casos de los cuales, se encuentran 5 finalizados, 4 en trámite y 1 no iniciado.

De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 3 casos , de los cuales se encuentra 1 finalizado y 2 en trámite.

Cantón de Limón: Se abordaron y atendieron 16 casos de los cuales se encuentran 8 finalizados, 3 en trámite y 5 no iniciados. De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 8, de los cuales se encuentran 2 se finalizados y 6 en trámite.
