

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 71


MES: JULIO 2024






OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$44,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$45,955,507.00	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 19)	28 de mayo de 2025
Reclamos	\$24,583,915.64	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos)	\$580,132,809.70		

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

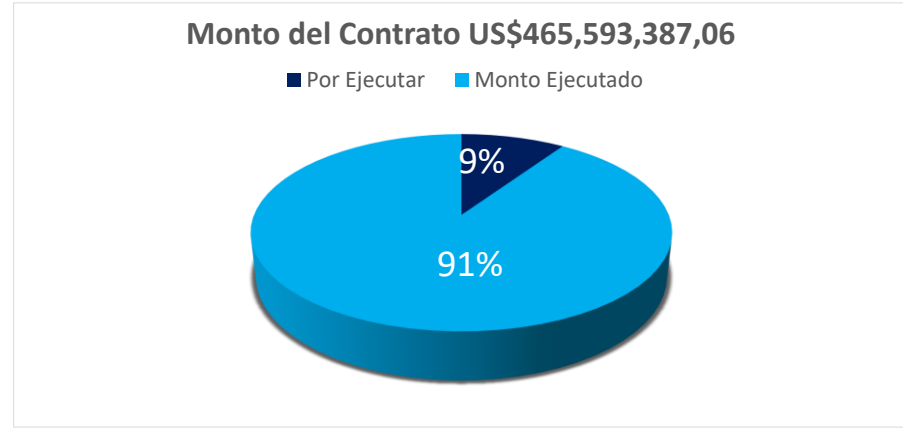

AVANCE FÍSICO

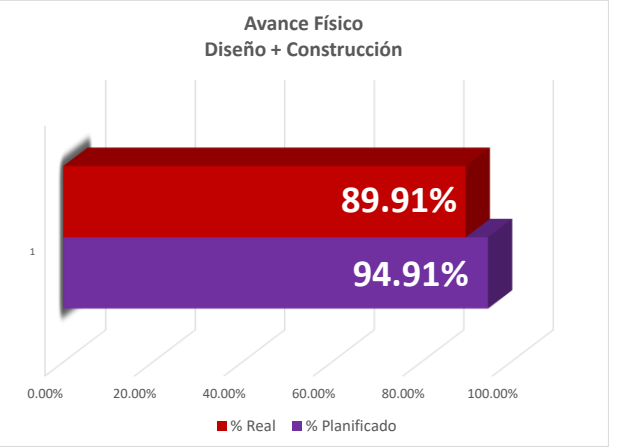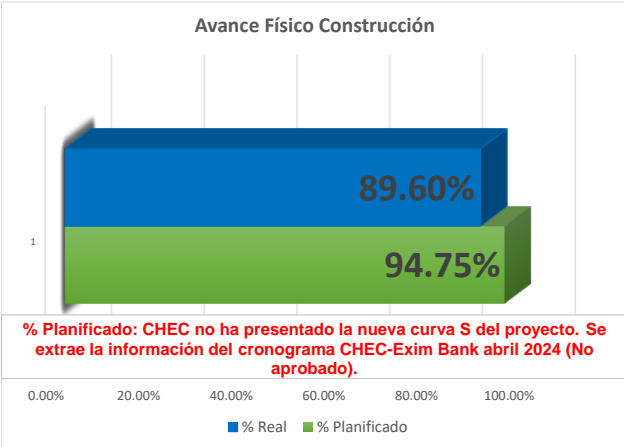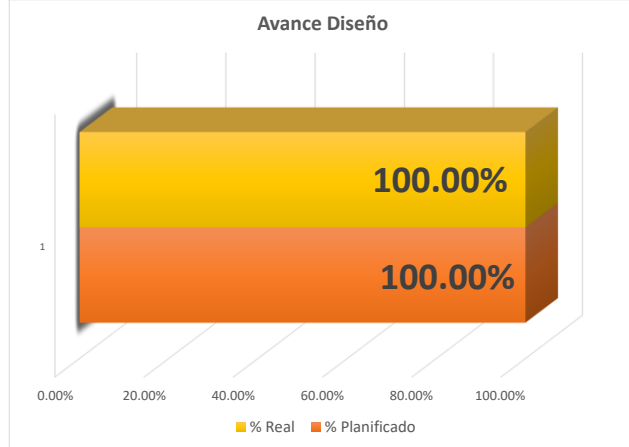

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 71


MES: JULIO 2024




OBRA: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo
 SECCION: Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

CONTRATISTA: China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
 GESTOR DEL PROYECTO: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

EXPROPIACIONES

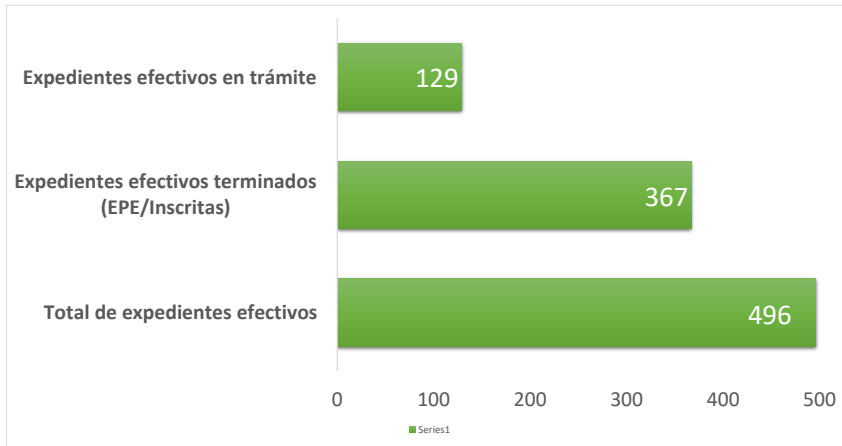

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

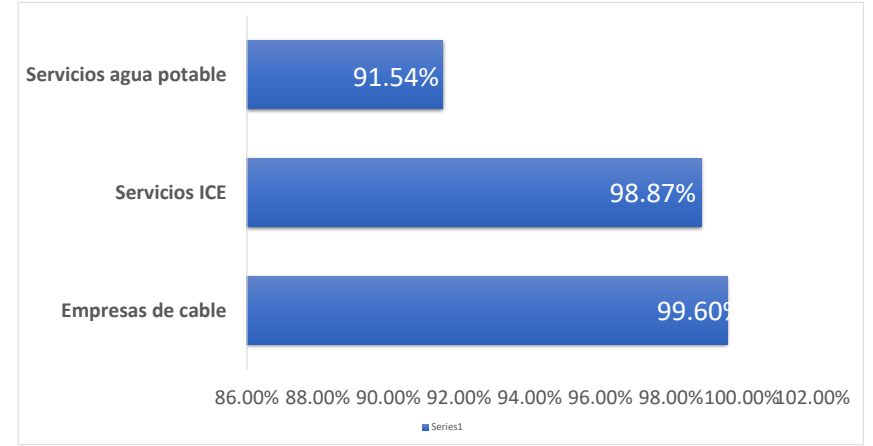

RESUMEN ESTADO GESTIÓN SOCIAL

Para el mes de julio se atendieron un total de 67 consultas nuevas y se dio seguimiento a 47 consultas anteriores. El siguiente gráfico describe el estado de las consultas.

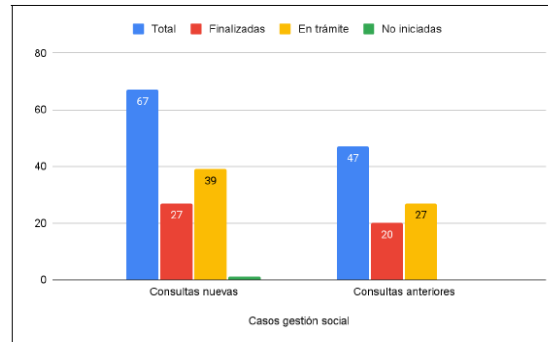


Figura 6. Casos de gestión social al mes de Julio 2024

La siguiente tabla describe la distribución por cantón de las consultas.

Cuadro 8. Distribución por cantón de las consultas					
ID	Cantón	Casos abordados	No iniciados	En trámite	Finalizados
1	Pococí	8	0	4	4
2	Guácimo	10	1	5	4
3	Siquirres	21	0	14	7
4	Matina	14	0	10	4
5	Limón	14	0	6	8
