

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 75

MES: NOVIEMBRE 2024



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).


DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$44,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$45,955,507.00	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 19)	<b>28 de mayo de 2025</b>
Reclamos	\$24,583,915.64	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos)	\$580,132,809.70		

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

Monto del Contrato US\$465,593,387,06


■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

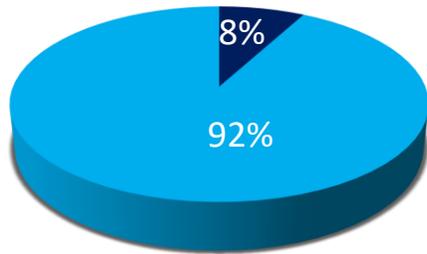


El monto ejecutado de diseño y construcción incluye el monto del desembolso con adelanto del 20% que se le pagó a CHEC al iniciar el proyecto.

AVANCE FÍSICO


Avance Diseño

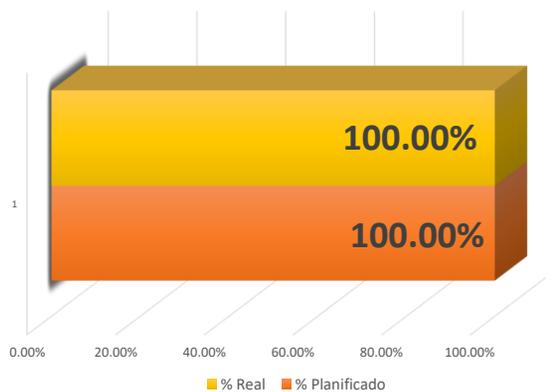

Avance Físico Construcción

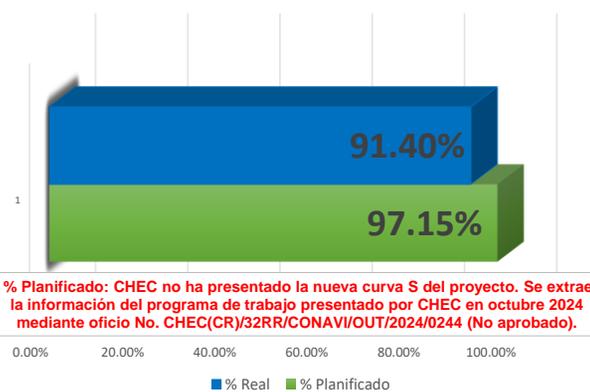

Avance Físico  
Diseño + Construcción

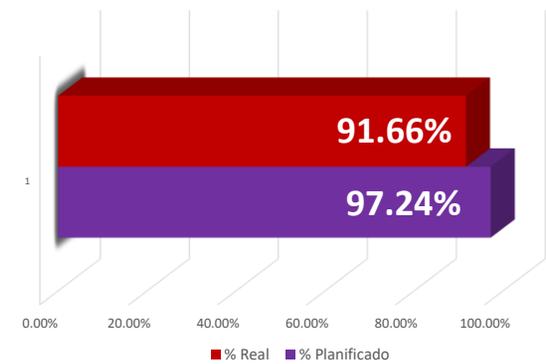


INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 75

MES: NOVIEMBRE 2024




OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

EXPROPIACIONES

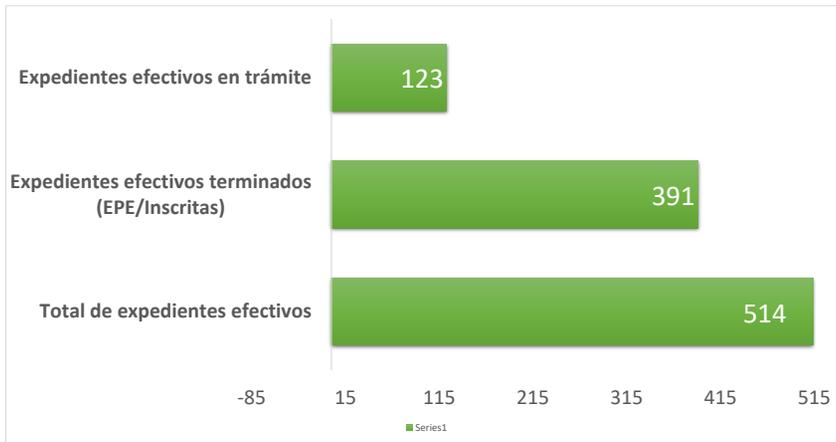

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

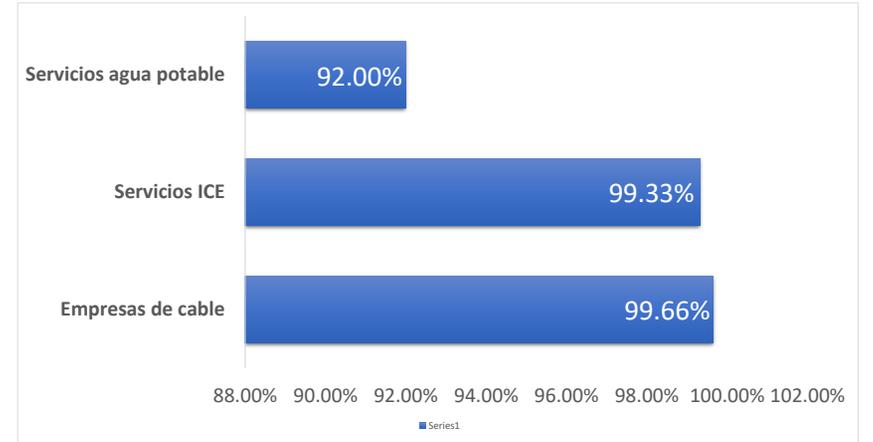

RESUMEN ESTADO GESTIÓN SOCIAL

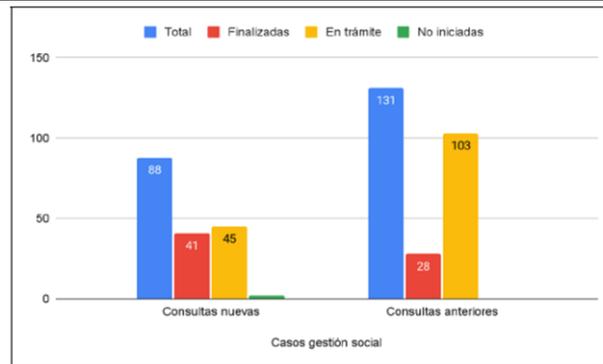


Figura 6. Casos de gestión social al mes de noviembre 2024

La siguiente tabla describe la distribución por cantón de las consultas.

ID	Cantón	Casos registrados	No iniciados	En trámite	Finalizados
1	Pococí	5	0	1	4
2	Guácimo	4	0	4	0
3	Siquirres	14	1	18	20
4	Matina	53	0	21	32
5	Limón	12	2	8	2
