INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: AGOSTO 2022

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	$22,143,950.57	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	$43,075,011.95	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	**08 de febrero de 2023**
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	$530,812,349.58	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

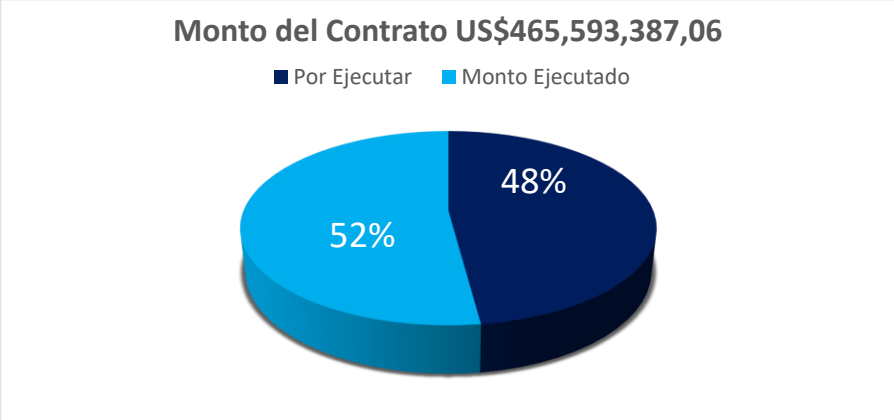

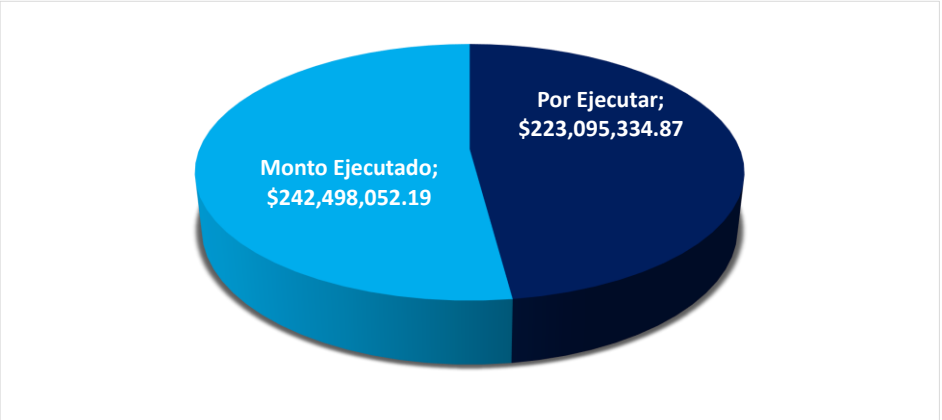

AVANCE FÍSICO

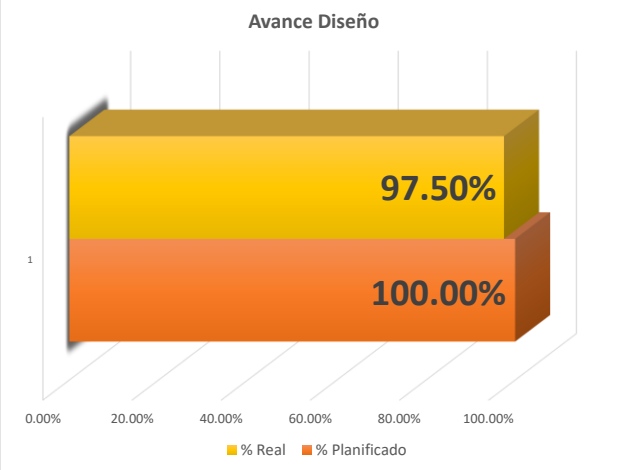

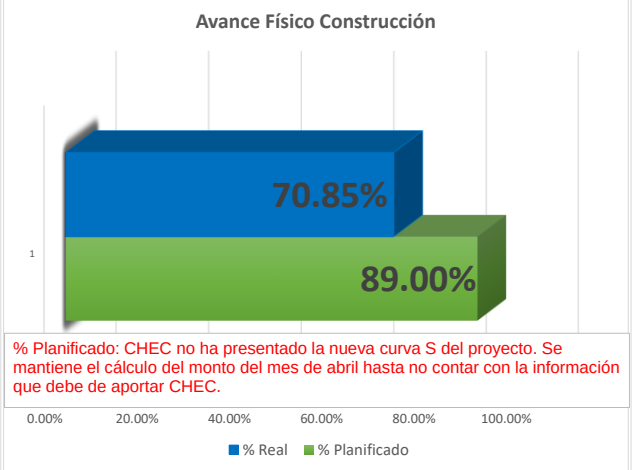

% Planificado: CHEC no ha presentado la nueva curva S del proyecto. Se mantiene el cálculo del monto del mes de abril hasta no contar con la información que debe de aportar CHEC.

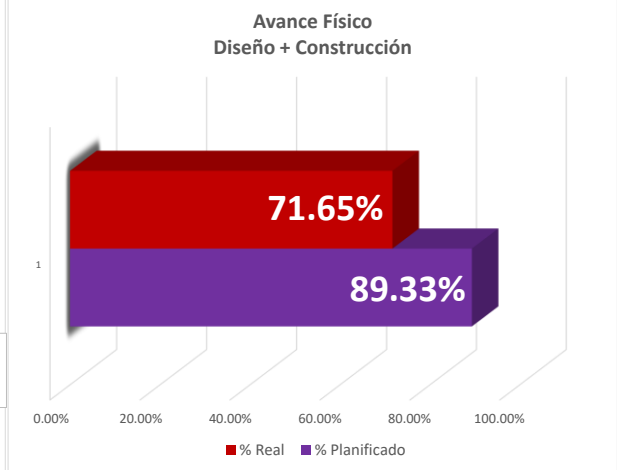

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: AGOSTO 2022

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	98.58%
En Ejecución	33	
Terminados	21	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	87.88%
En Ejecución	29	
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	17.06%
En Ejecución	11	
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	17.27%
En Ejecución	2	
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	75.00%
En Ejecución	18	
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	Avance LD: 92,21% Avance LI: 90,26%
Alc faltante x Ejecutar LI	24	
Alc faltante x Ejecutar LD	30	
Alc Terminadas LD	284	
Alc Terminadas LI	278	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	107.40	57.28%
Km en Ejecución	61.50	
Km Terminados	61.50	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial		Avance
Km Totales	107.50	65.26%
Km en Ejecución	70.09	
Km Terminados	70.09	

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	Avance LD: 87,19% Avance LI: 82+49%
Km en ejecución LD	93.70	
Km en ejecución LI	88.70	
Km terminados LD	93.70	
Km terminados LI	88.70	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	Avance LD: 85,82% Avance LI: 61,37%
Km en ejecución LD	92.30	
Km en ejecución LI	66.00	
Km terminados LD	92.30	
Km terminados LI	66.00	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	Avance LD: 72,28% Avance LI: 47,47%
Km en primera capa LD	83.80	
Km terminados LD	77.70	
Km en primera capa LI	53.10	
Km terminados LI	51.00	

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	54.37%
Km en Ejecución	53.13	
Km Terminados	0.00	

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	32.27%
En Ejecución	13.00	
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	75.10%
Km en Ejecución	20.07	
Km Terminados	19.32	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	59.85%
Km en Ejecución	19.78	
Km Terminados	3.72	

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: AGOSTO 2022

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

EXPROPIACIONES

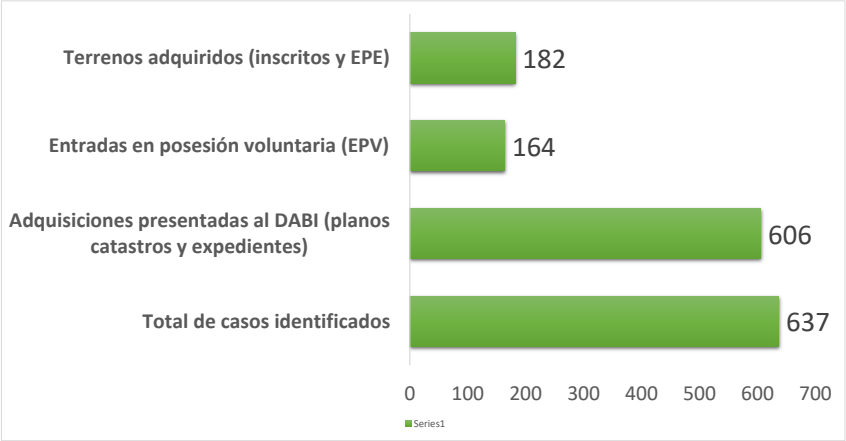

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

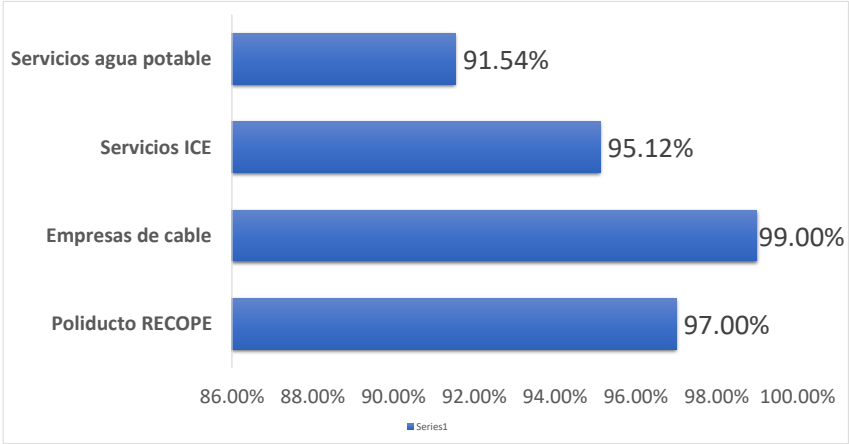

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

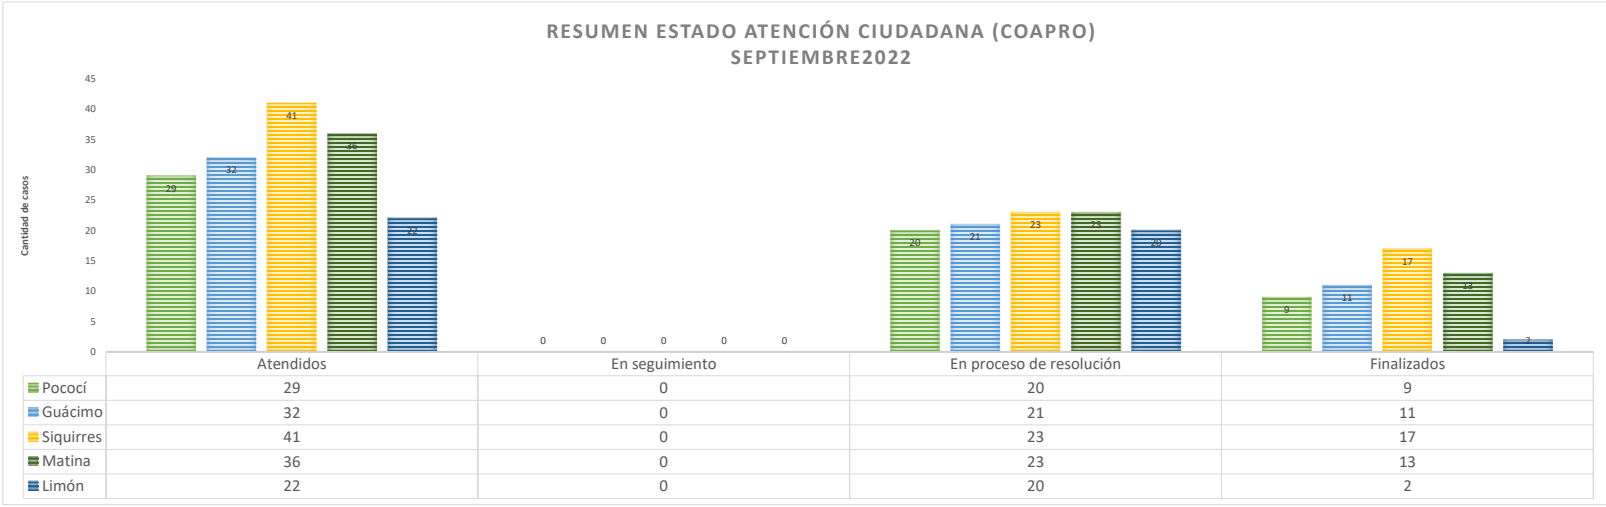

	Atendidos	En seguimiento	En proceso de resolución	Finalizados
Pococí	29	0	20	9
Guácimo	32	0	21	11
Siquirres	41	0	23	17
Matina	36	0	23	13
Limón	22	0	20	2

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
