INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 59

MES: JULIO 2023

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	$28,054,947.31	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	$41,118,512.72	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 16)	**15 de marzo de 2024**
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	$534,766,847.10	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

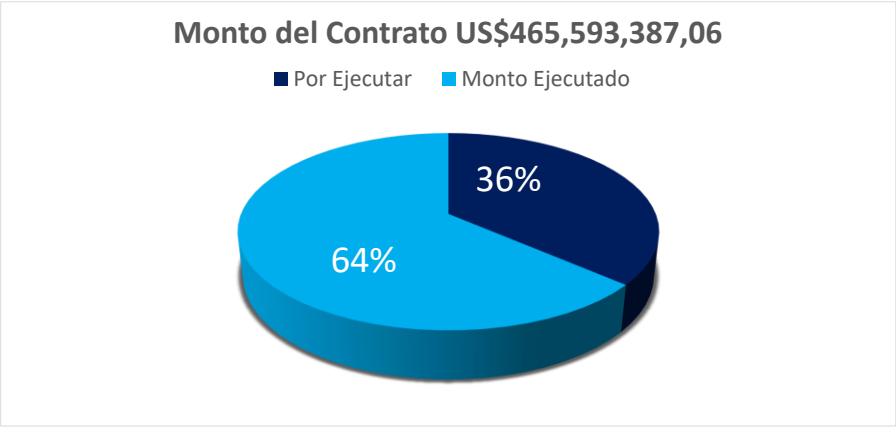

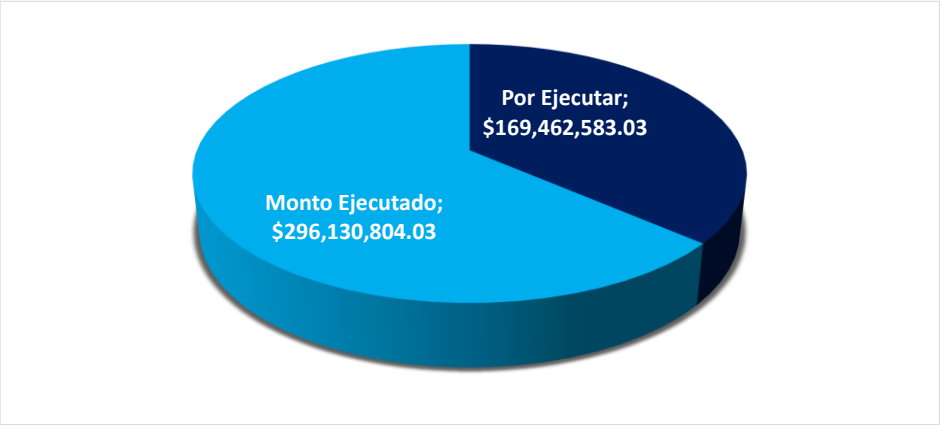

AVANCE FÍSICO

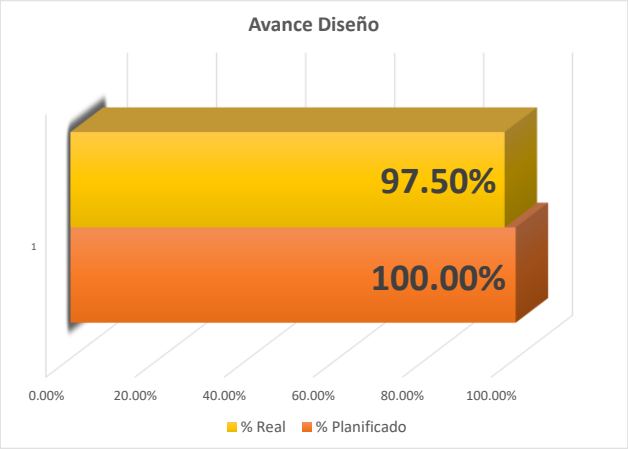

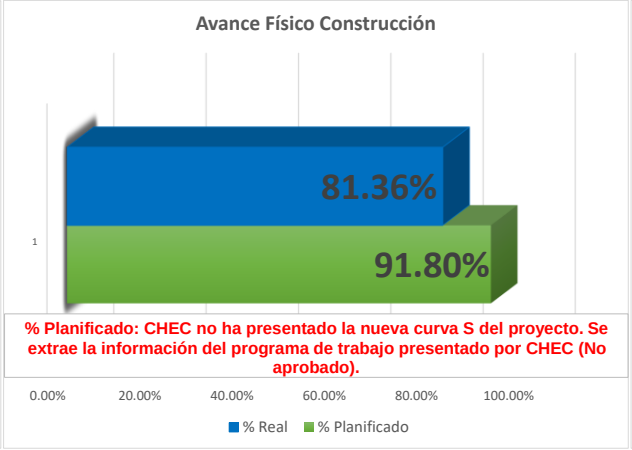

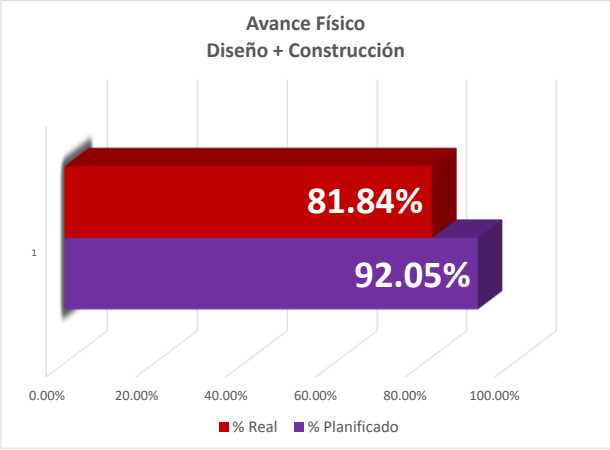

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 59

MES: JULIO 2023

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	98.85%
En Ejecución	33	
Terminados	25	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	89.84%
En Ejecución	33	
Terminados	16	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	28.47%
En Ejecución	12	
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	20.50%
En Ejecución	2	
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	83.33%
En Ejecución	20	
Terminados	1	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	Avance LD: 93,51%
Alc faltante x Ejecutar LI	20	Avance LI: 91,23%
Alc faltante x Ejecutar LD	27	
Alc Terminadas LD	288	
Alc Terminadas LI	281	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	107.40	68.20%
Km en Ejecución	73.20	
Km Terminados	73.20	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial		Avance
Km Totales	107.40	75.75%
Km en Ejecución	81.36	
Km Terminados	81.36	

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	Avance LD: 91,67%
Km en ejecución LD	98.60	Avance LI: 91,27%
Km en ejecución LI	98.10	
Km terminados LD	98.60	
Km terminados LI	98.10	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	Avance LD: 90.00%
Km en ejecución LD	96.80	Avance LI: 83,15%
Km en ejecución LI	89.50	
Km terminados LD	96.80	
Km terminados LI	89.40	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	Avance LD: 82.74%
Km en primera capa LD	93.00	Avance LI: 73.81%
Km terminados LD	89.00	
Km en primera capa LI	78.70	
Km terminados LI	79.40	

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	87.68%
Km en Ejecución	89.66	
Km Terminados	78.61	

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	40.00%
En Ejecución	13.00	
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	81.19%
Km en Ejecución	21.23	
Km Terminados	18.70	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	94.44%
Km en Ejecución	24.72	
Km Terminados	21.00	

INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 59

MES: JULIO 2023

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

EXPROPIACIONES

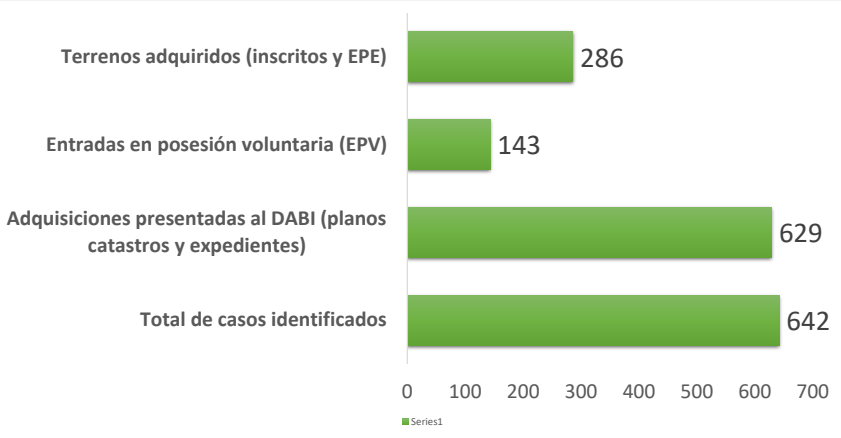

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

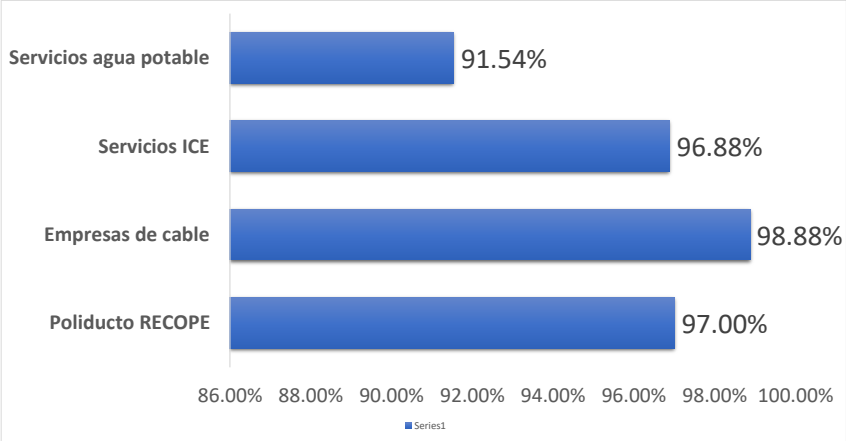

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

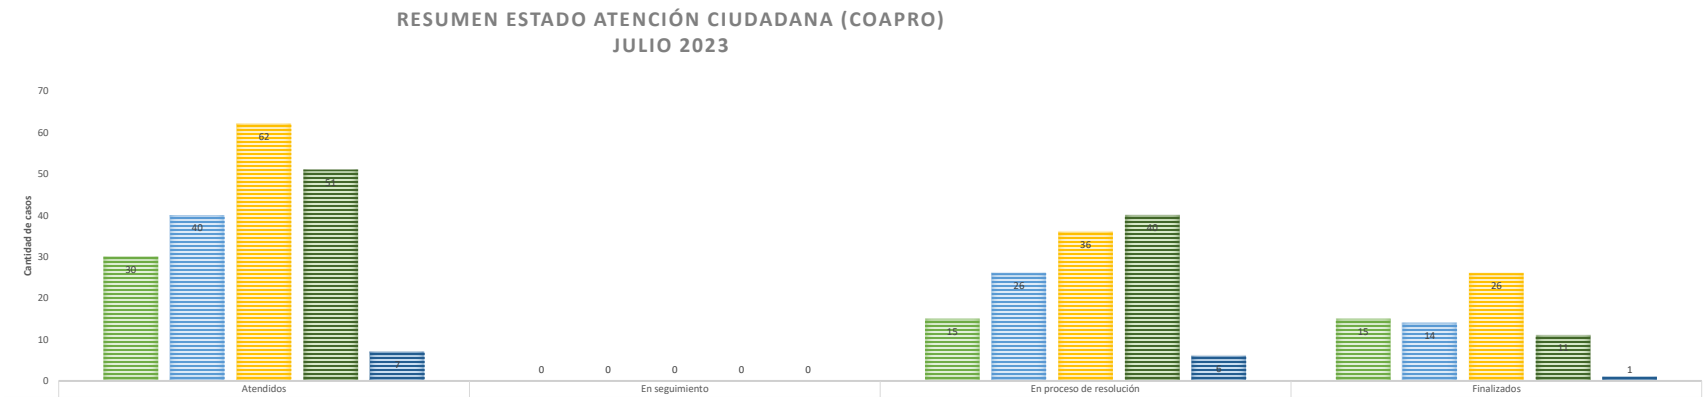

	Atendidos	En seguimiento	En proceso de resolución	Finalizados
Pococí	30	0	15	15
Guácimo	40	0	26	14
Siquirres	62	0	36	26
Matina	51	0	40	11
Limón	7	0	6	1

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
