INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 64

MES: DICIEMBRE 2023

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A.
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS).

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	$29,561,329.77	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	$41,118,512.72	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 16)	**15 de marzo de 2024**
Reclamos	$8,993,685.15	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato + Reclamos)	$545,266,914.70		

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

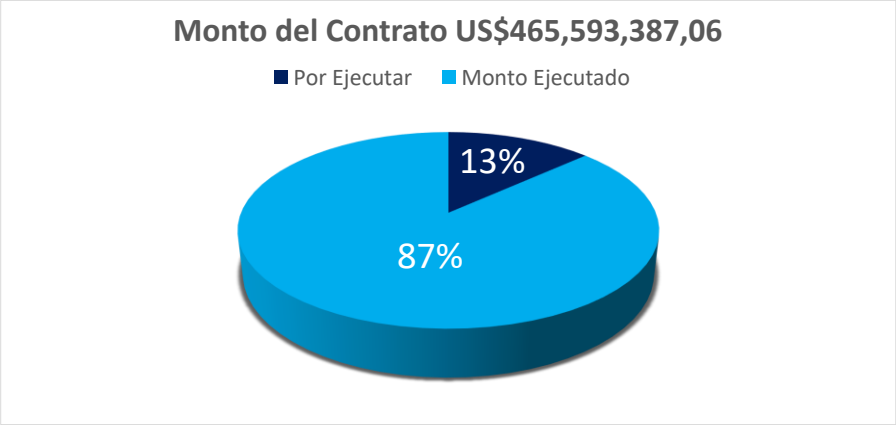

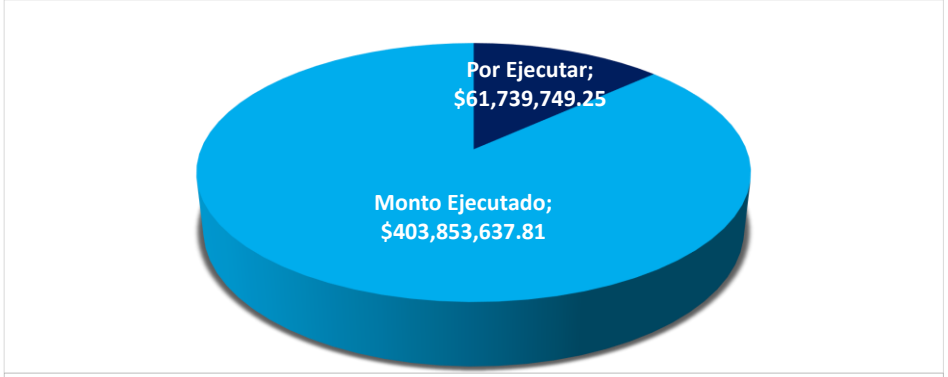

El monto ejecutado de diseño y construcción incluye el monto del desembolso con adelanto del 20% que se le pagó a CHEC al iniciar el proyecto.
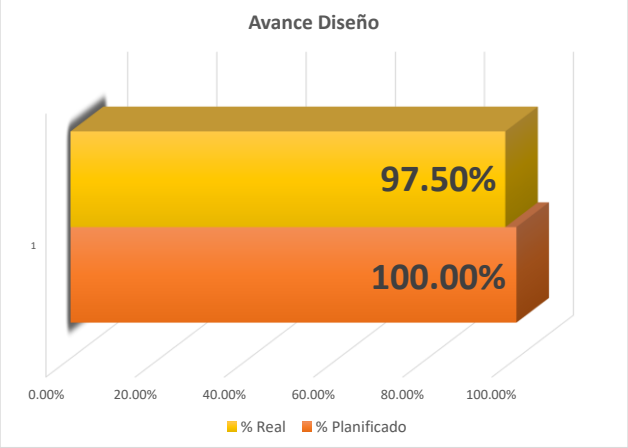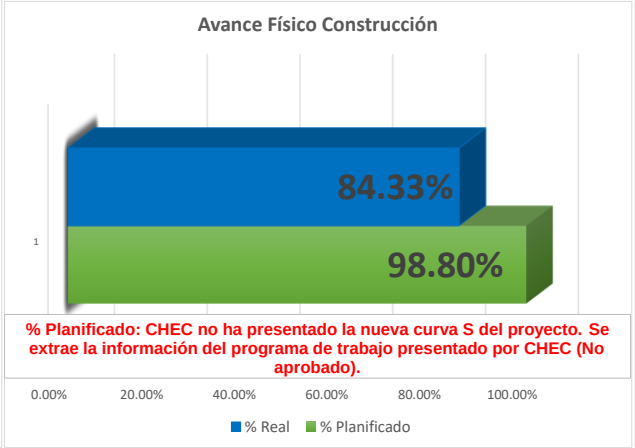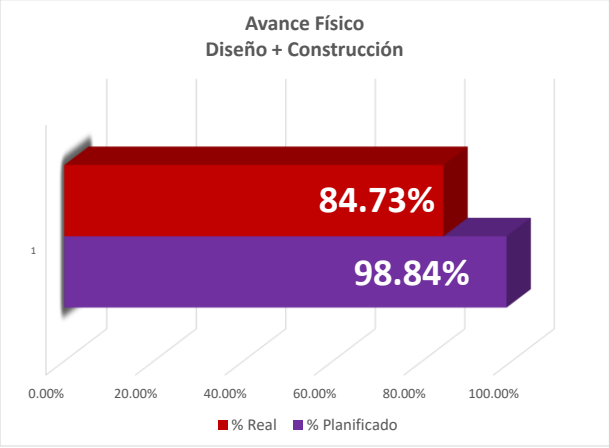
AVANCE FÍSICO
